

鼎新 | Workflow ERP iGP

LRP接單式生產流程 MTO

課前提醒

1.環境介紹

洗手間/茶水間

2.課程進行方式

本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。

(教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！)

3.課後問卷與測驗

當天課後上網填寫問卷並測驗

學習地圖



系統基礎學習


- 製造實作演練班-生產循環



系統進階應用學習

- LRP接單式生產流程(MTO)
- LRP存貨式生產流程(MTS)
- LRP接單裝配生產流程(ATO)
- 預測長交期備料流程
- 進階實戰<<製造情境應用攻略>>

企業營運流程

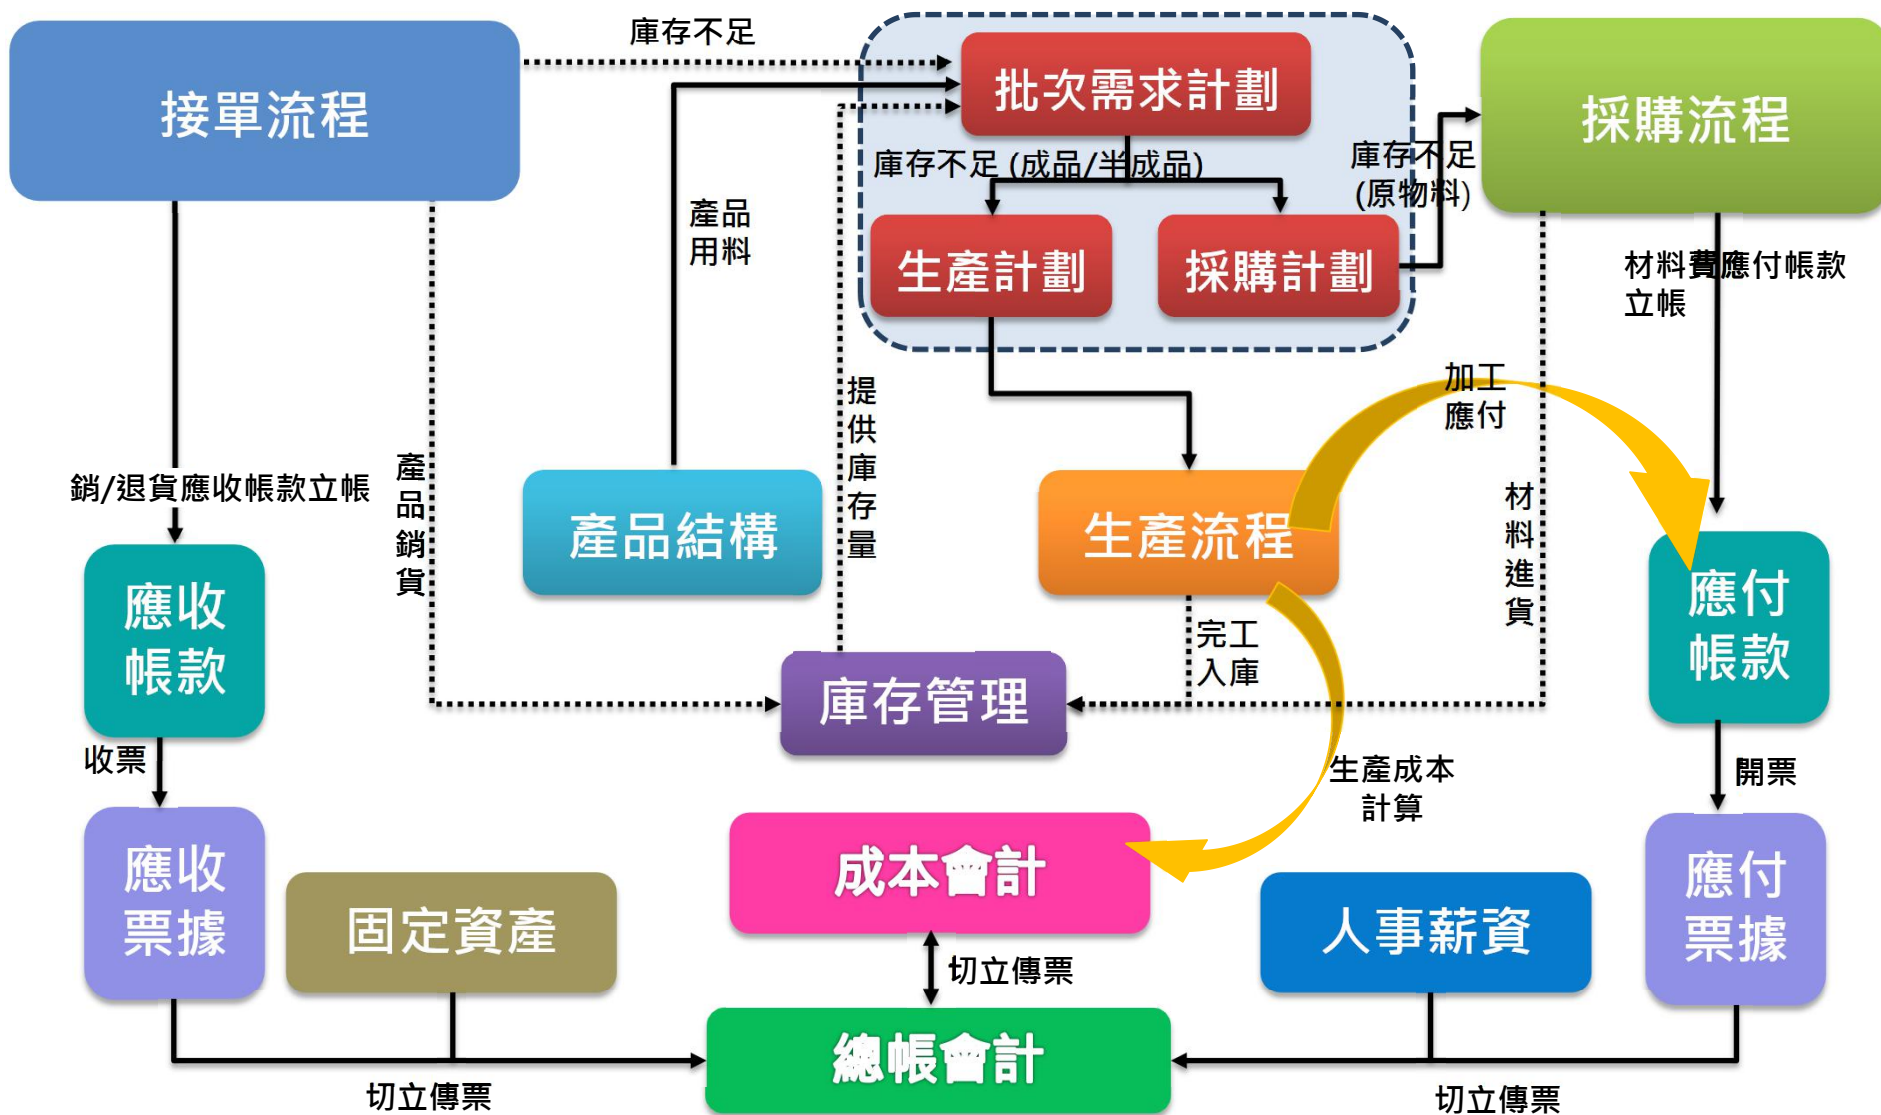

我的ERP

工具

幫助

公司別 成功科技

智能啟動

基礎速查



待辦



通知




警示



追蹤




佇列工作控制台




作業速查



我的訊息




工作管理員



作業清單



進階清單



個人清單




儲存檢視



新增群組



新增流程



群組命名



刪除方塊



鎖定方塊



重新登入



離開

檢視類別 系統+作業別

- ▶ 出口作業管理系統
- ▶ 採購管理系統
- ▶ 進口作業管理系統
- ▶ 製令/託外管理系統
- ▶ 應收管理系統
- ▶ 應付管理系統
- ▶ 票據資金管理系統
- ▶ 會計總帳管理系統
- ▶ 自動分錄系統
- ▶ **批次需求計劃系統**
 - ▶ 基本資料管理
 - ▶ 資料維護管理
 - ▶ 清單與明細表
 - ▶ 報表列印
 - ▶ 批次作業
- ▶ 主生產排程系統
- ▶ 物料需求計劃系統
- ▶ 成本計算管理系統
- ▶ 固定資產管理系統
- ▶ 營業稅申報系統
- ▶ 品質管理系統
- ▶ 保稅管理系統
- ▶ 多角貿易管理系統
- ▶ Fax/Email處理系統
- ▶ 園區保稅管理系統
- ▶ 零用金管理系統
- ▶ 模具管理系統
- ▶ 合併財報管理系統
- ▶ 標準成本計算管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統



我的ERP

作業清單

監控檢核

課程大綱

一、何謂接單式生產(MTO)

二、名詞解釋

三、批次需求計畫邏輯說明

休息10分鐘

四、接單式生產流程

課

程



課程目標


- 1.清楚LRP名詞解釋
- 2.學會且能自行操作接單式生產流程

數位課程


系統別

批次需求計劃系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

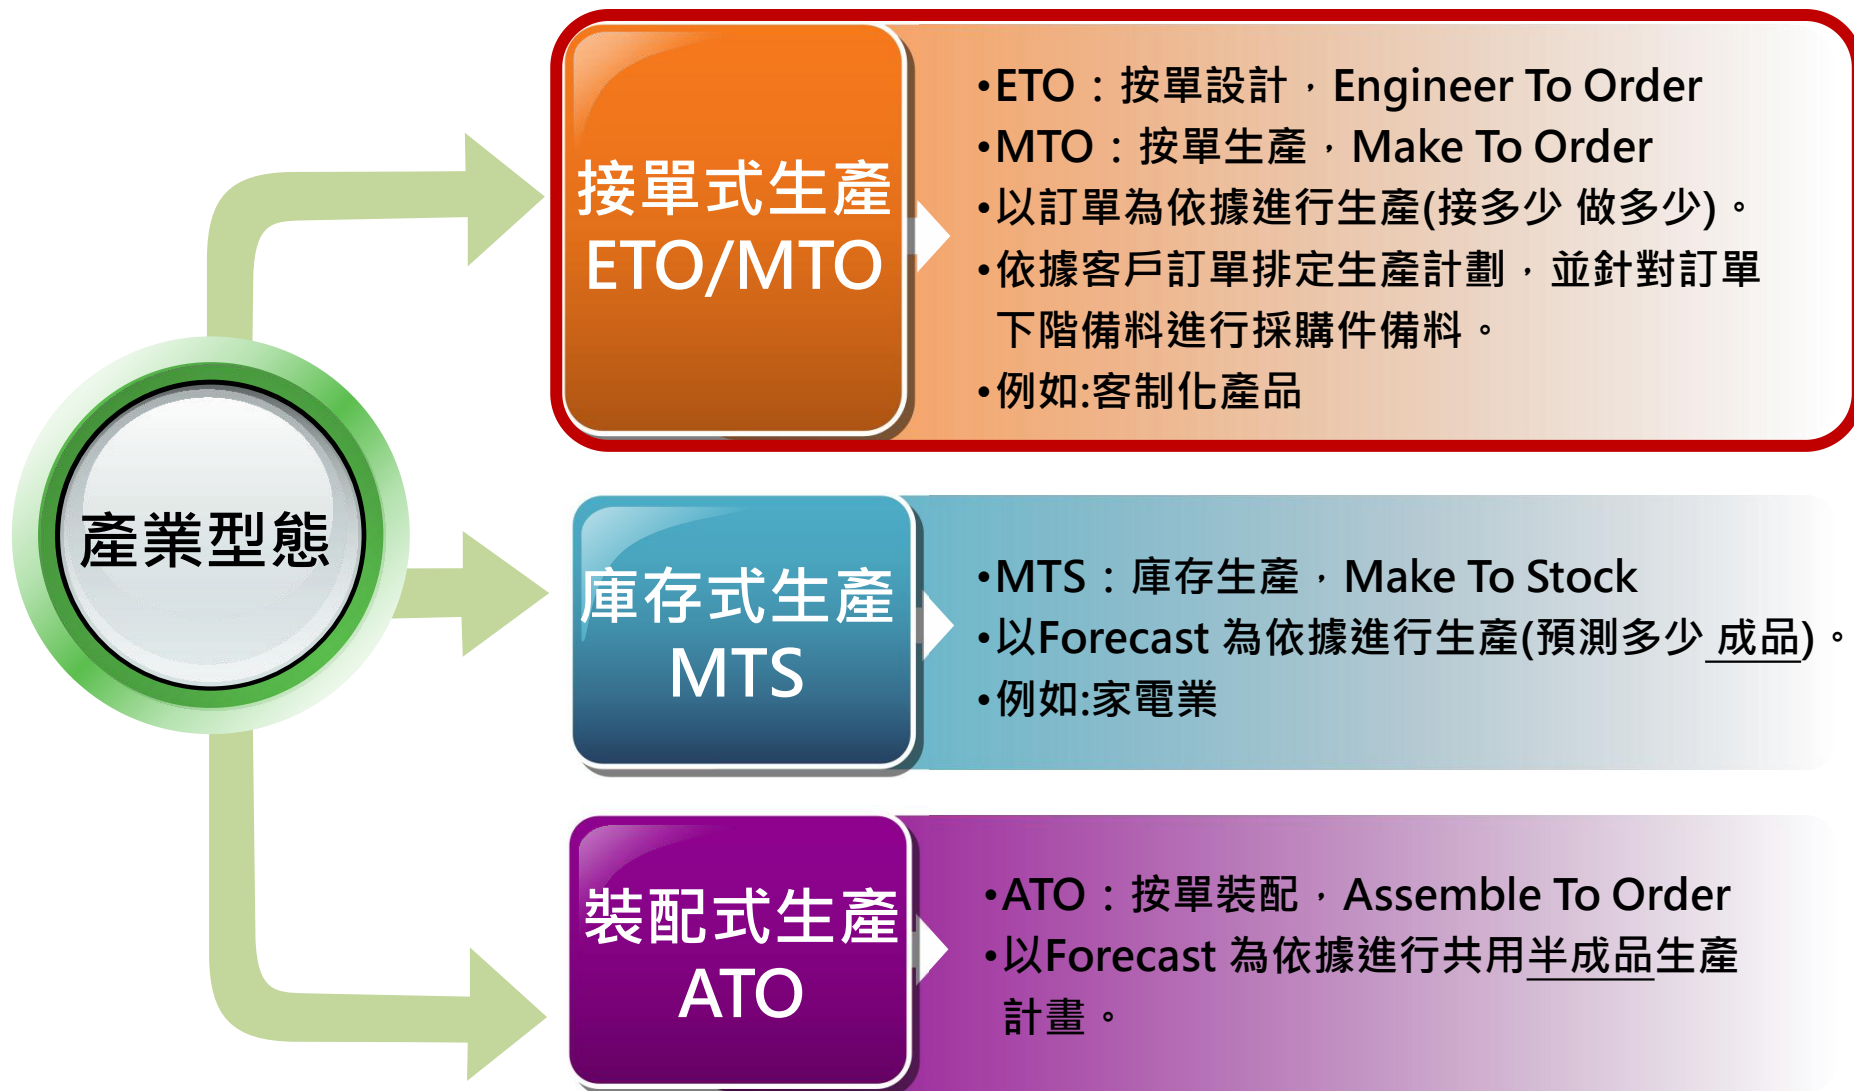


一、何謂接單式生產(MTO)?

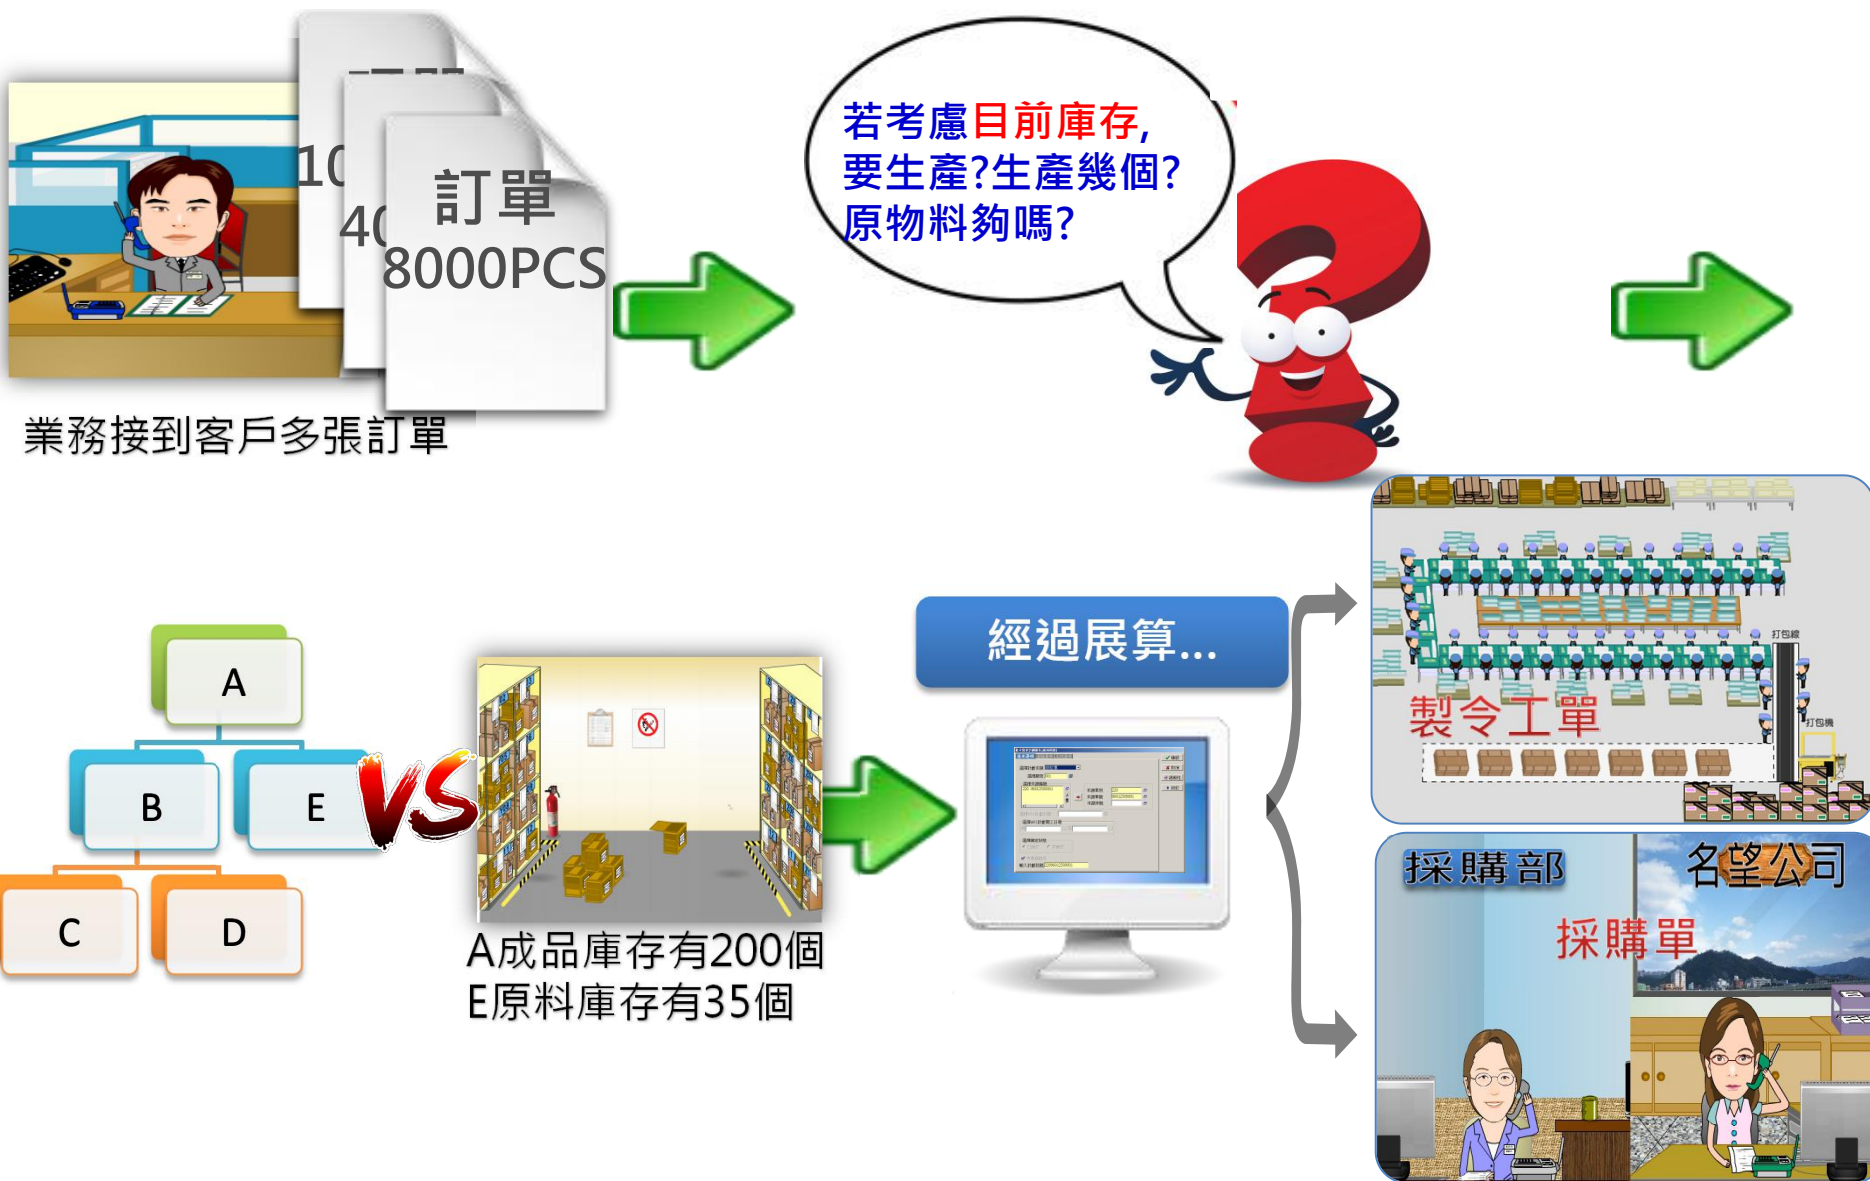


二、名詞解釋

以上述為例，有無考慮庫存量，生產及採購量將有不一樣的結果

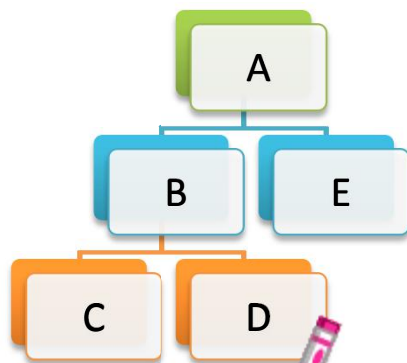

不考慮庫存量

A生產1000個
B生產1000個
C.D.E各採買1000個

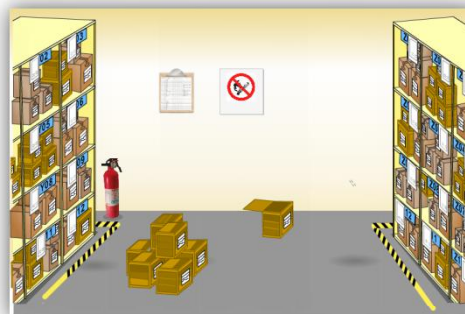

A成品庫存有200個
E原料庫存有35個

考慮庫存量

A生產800個
B生產800個
C.D各採買800個
E採買_____個

對系統而言...

不考慮庫存量得出的結果稱為「毛需求」

考慮庫存量得出的結果稱為「淨需求」

三、批次需求計畫邏輯說明

毛需求

- 以需求數量為依據，完全**不考慮**「需求品號」的現有庫存量及十大量。
- 直接採實際需求量
- 若不考慮所有庫存量，展算時建議選擇毛需求

淨需求

=

需求類

計劃銷售量
預計銷售量
預計領用量
計劃領用量

供給類

計劃生產量
計劃進貨量
預計生產量
預計進貨量
預計請購量
請拋採未確認量
現有庫存量

淨需求 = 需求(出庫) - 供給(入庫 + 庫存)

淨需求 > 0 ➔ 自製件(M)或託外加工件(S)產生生產計劃
採購件(P)產生採購計劃


十大量	說明	作業位置
計劃銷售量	未達成之銷售預測量 (預測數量 - 已受訂量)	訂單管理系統 \ 銷售預測建立作業
預計銷貨量	未結案訂單之未銷貨量 (訂單數量 + 贈備品量 - 已交數量 - 贈備品已交量)	訂單管理系統 \ 客戶訂單建立作業
計劃領料量	相依需求之需求量 (生產計劃維護上階主件的相依需求數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
預計領料量	未完工製令單身之應領未領料量 (需領用量 - 已領用量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
預計請購量	未更新之請購數量 (請購單已確認，未拋轉成採購單的數量)	採購管理系統 \ 請購單建立作業
預計進貨量	未結案採購單之未進貨量 (採購數量 - 已交數量)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
請拋採 未確認量	請購單已拋轉成採購單但未確認之採購數 (請注意，此種未確認的採購數量，必須要有相對應的「請購資料維護作業」的資料，也就是必須經由請購單來拋轉)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
預計生產量	未完工製令單頭之未生產量 (預計產量 - 已生產量 - 報廢量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
計劃生產量	生產計劃內之預計生產量 (生產計劃檔之生產數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
計劃採購量	採購計劃內之預計採購量 (採購計劃維護採購數量)	批次需求計劃系統 \ 採購計畫維護作業

三、批次需求計畫邏輯說明

訂單

品號：A
數量：500PCS
需求日：8/30

BOM用量資料：

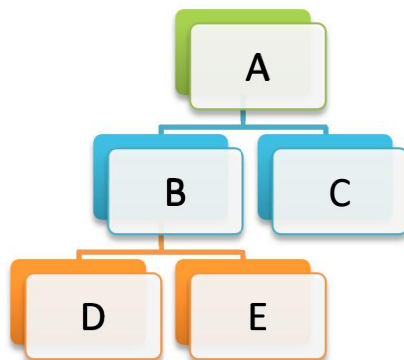

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

工廠行事曆：星期六、日休全天

品號	庫存數量	檢驗天數	固定前置天數	變動前置天數	批量	請填入數量
A	200	1	2	1	100	生產量_____
B	100	1	2	1	100	生產量_____
C	0(8/19預計進貨100PCS)	1	2	1	100	採購量_____
D	300	1	2	1	100	採購量_____
E	200	1	2	1	100	採購量_____

若以淨需求展算，A、B、C、D、E各需要生產或採購幾個？
何時生產/採購？

三、批次需求計畫邏輯說明(A成品)

A成品資料

客戶訂單：數量500PCS,需求日8/30


庫存數量：200PCS

檢驗天數：1天

固定前置天數：2天

變動前置天數：1天

批量：100

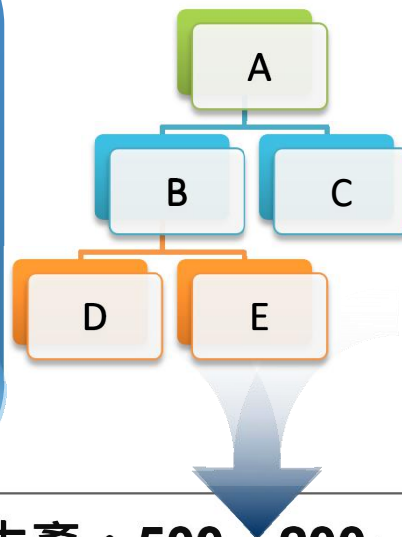

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

量的推算

A 成品計劃生產：500 - 200 = 300 (PCS)

日期的推算

預計完工日：預測需求日(8/30)-入庫天數(1天)-檢驗天數(1天) = 8/28

生產前置天數 = $\left(\frac{\text{預計產量}}{\text{批量}} \times \text{變動前置天數} \right) + \text{固定前置天數}$


$$= \left(\frac{300}{100} \times 1 \right) + 2 = 5$$

預計開工日：預計完工日(8/28) - 前置天數(5天) = 8/21

三、批次需求計畫邏輯說明(B原料)

B-材料

相依需求：300PCS
 庫存數量：100PCS
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

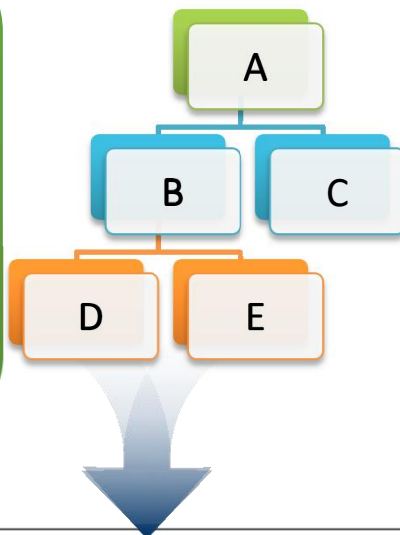

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

量的推算

A 成品計畫生產：300 (PCS)→ 需要 B 半成品 300PCS
 →B 半成品計畫生產：300 - 100 = 200 PCS

日期的推算

B 半成品的預計領料日=上階 A 成品開工日(8/21)

B 半成品的預計完工日= 預計領料日(8/21) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 8/19

生產前置天數 = (預計產量/批量×變動前置天數) + 固定前置天數
 = (200/100× 1) + 2 = 4

預計開工日 = 預計完工日(8/19) - 前置天數(4天) = 8/13

三、批次需求計畫邏輯說明(C原料)

C-材料

相依需求：300PCS

庫存數量：0


檢驗天數：1天

固定前置天數：2天

變動前置天數：1天

批量：100

預計進貨量：100

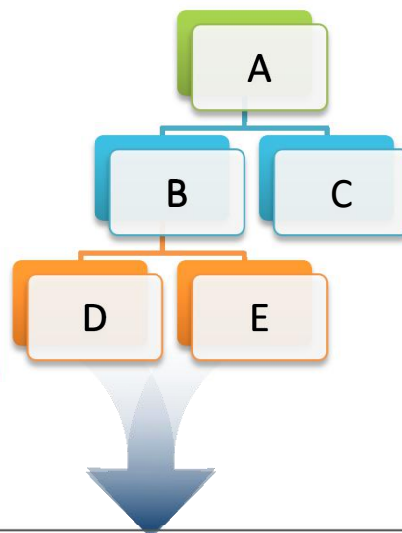

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

量的推算

A 成品計劃生產：300 (PCS)→ 需要 C 原料 300PCS

→C 原料計劃採購：300 - 100(預計進貨量) = 200 PCS

日期的推算

C 原料的預計領料日=上階 A 成品開工日(8/21)

C 原料的預計交貨日= 預計領料日(8/21) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 8/19


採購前置天數 = (預計採購量/批量×變動前置天數) + 固定前置天數
 = (200/100×1) + 2 = 4

預計採購日 = 預計交貨日(8/19) - 前置天數(4天) = 8/13

三、批次需求計畫邏輯說明(D原料)

D-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：300
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

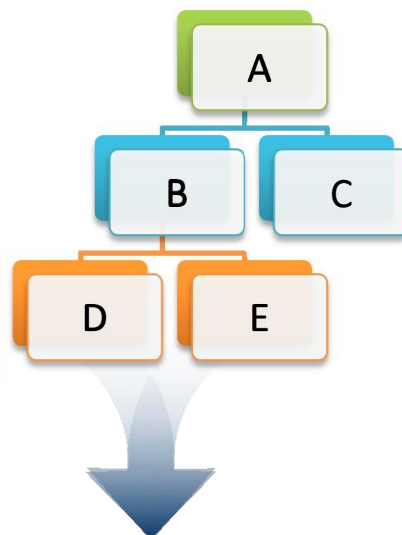

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS)→ 需要 D 原料 200PCS

→D 原料計劃採購：200-300(庫存量)=-100

淨需求 < 0 , 因此不用採買


日期的推算



三、批次需求計畫邏輯說明(E原料)

E-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：200
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

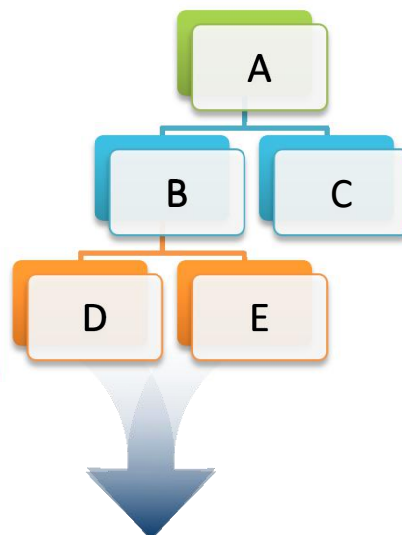

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS)→ 需要 D 原料 200PCS
 →D 原料計劃採購：200(庫存量)-200=0
 淨需求 =0 ， 因此不用採買

日期的推算






批次需求計劃執行前置作業

順序	系統別	對應作業	必要性
1	基本資料管理系統	廠別資料建立	✓
2		庫別資料建立	✓
3		生產線資料建立	✓
4		職務類別建立	△
5		行事曆建立	✓
6	庫存管理系統	品號資料建立作業	✓
7	產品結構系統	BOM用量資料建立	✓
8	批次需求計劃系統	批次計劃設定檔	✓

註：△表示建議維護
✓表示一定要先維護

四、接單式生產流程

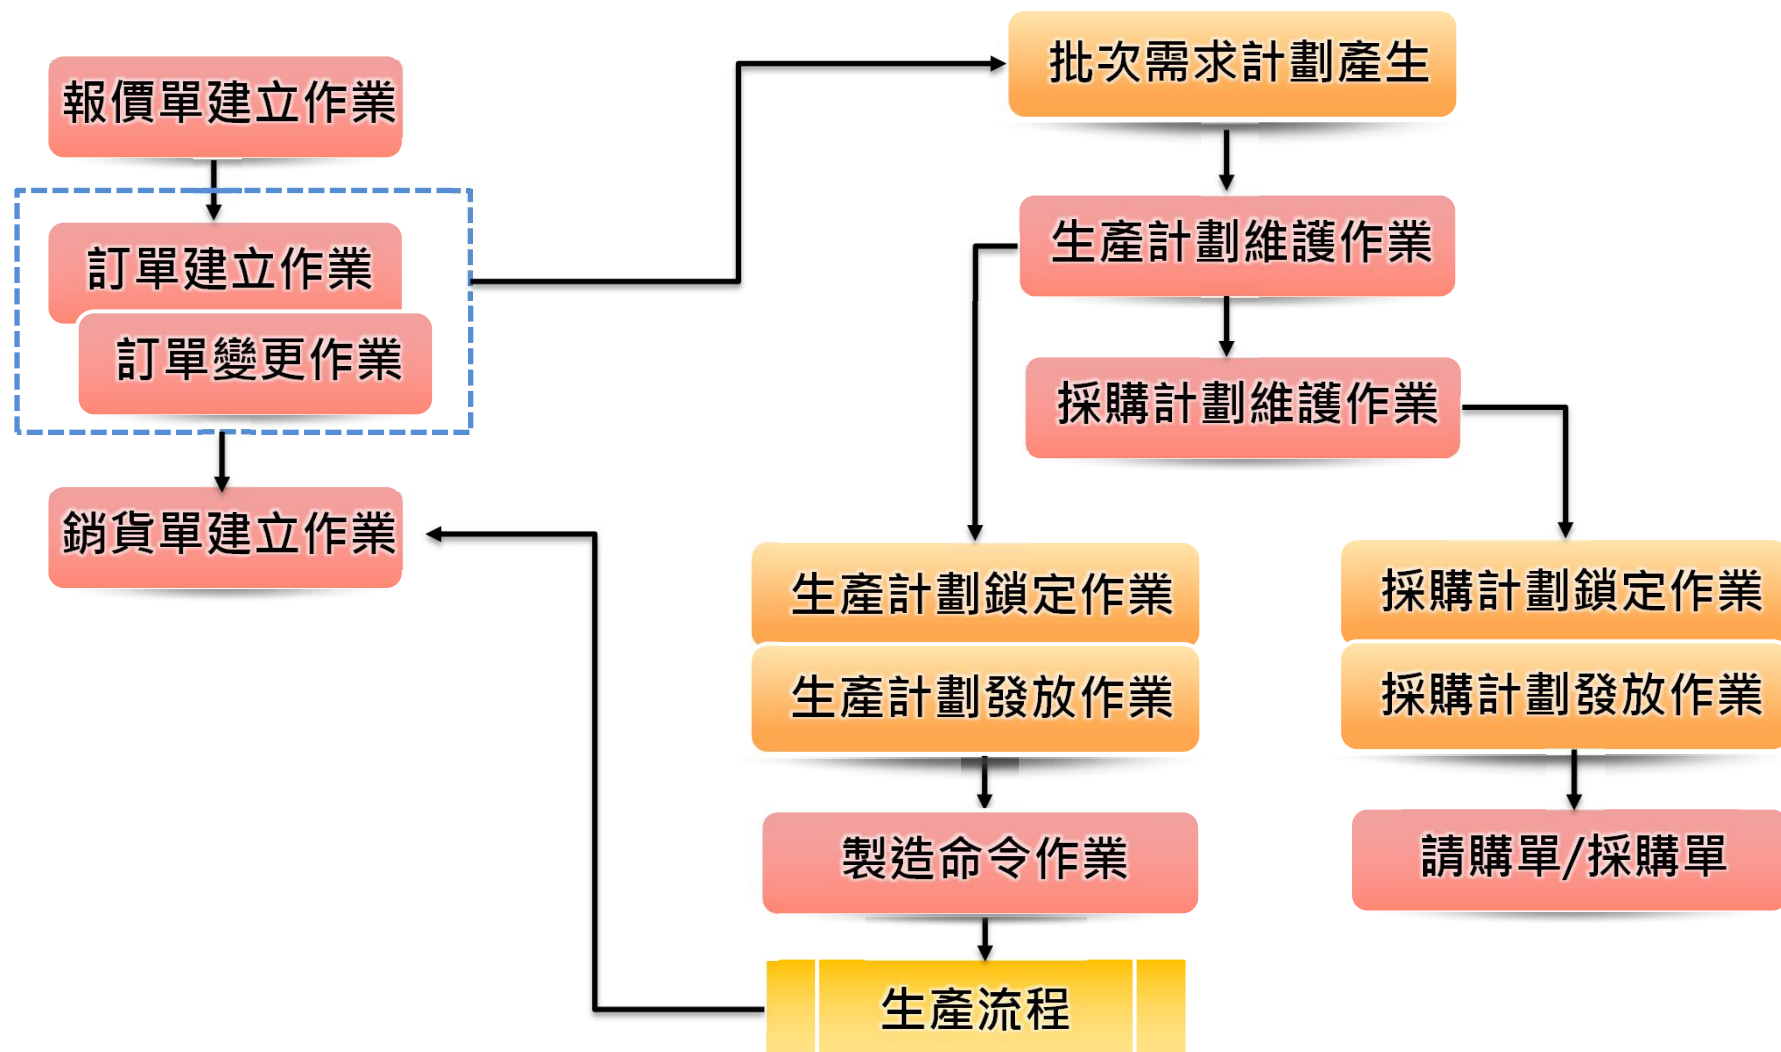

接單式生產案例-成功企業公司背景

主要營業項目是數位相機及相關產品，

除了銷售自行生產：

數位相機-SL系列/SV系列、

數位相機-大眾型、

數位相機-簡易型...等產品，

另外也有提供客戶數位相機 - 高手玩家型、
專業型及自動對焦數位相機...等外購商品。






公司當月5日，接到客戶「1008復興公司」的訂單
購買品號430001 數位相機-SV系列，數量100台，
單價15,000元，預計當月25日交貨。

針對此訂單，生管人員想了解公司庫存是否足夠？
需要生產？要生產多少？需要採購原物料？

何時要下採購單？

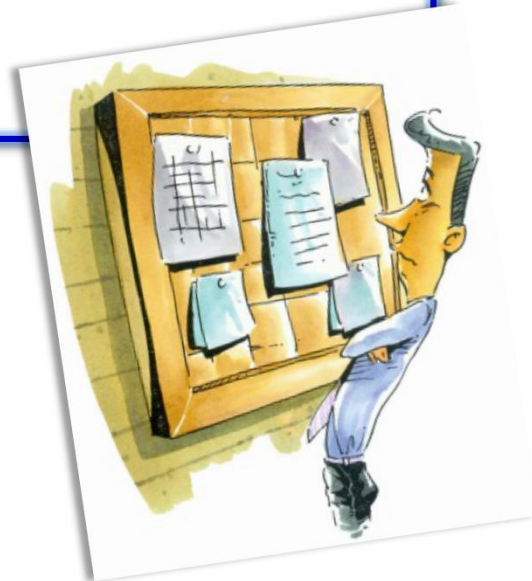

品號基本資料&BOM用量


品號	品名	品號屬性	補貨政策	前置天數	檢驗天數	庫存量
430001	數位相機-SV系列	M	L	2	1	20
320004	PCBA-Assembly Main	M	L	3	0	200
320005	PCBA-Assembly Sensor	S	L	3	0	50
390001	相機包材組	Y	R	0	0	0
110012	主開關連動板 SV系列	P	L	8	2	0
150001	包裝盒	P	R	1	0	9655
150007	包裝盒貼紙SV系列	P	R	1	0	1000
190006	影像軟體光碟-Ver 2.0 (當月15日預計進貨500PCS)	P	L	3	0	0

品號屬性：

M：自製件
S：託外加工件
P：採購件
Y：虛設件


補貨政策：

L：依LRP需求
R：依補貨點

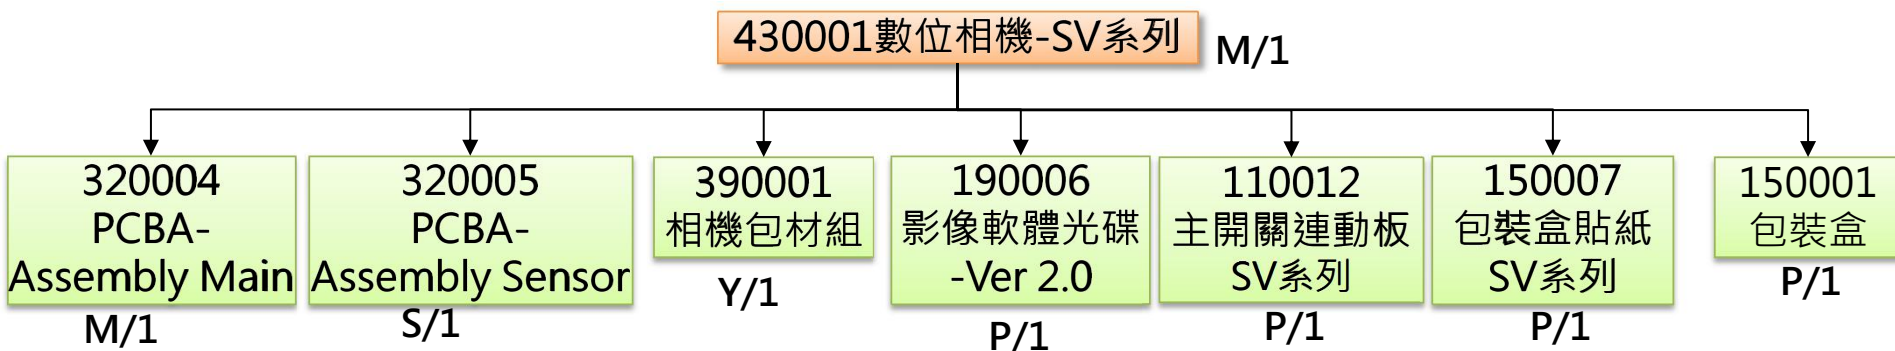

註：半成品(320004)下階材料之補貨政策階為R：依補貨點，本次計劃不納入考量。 23

四、接單式生產案例

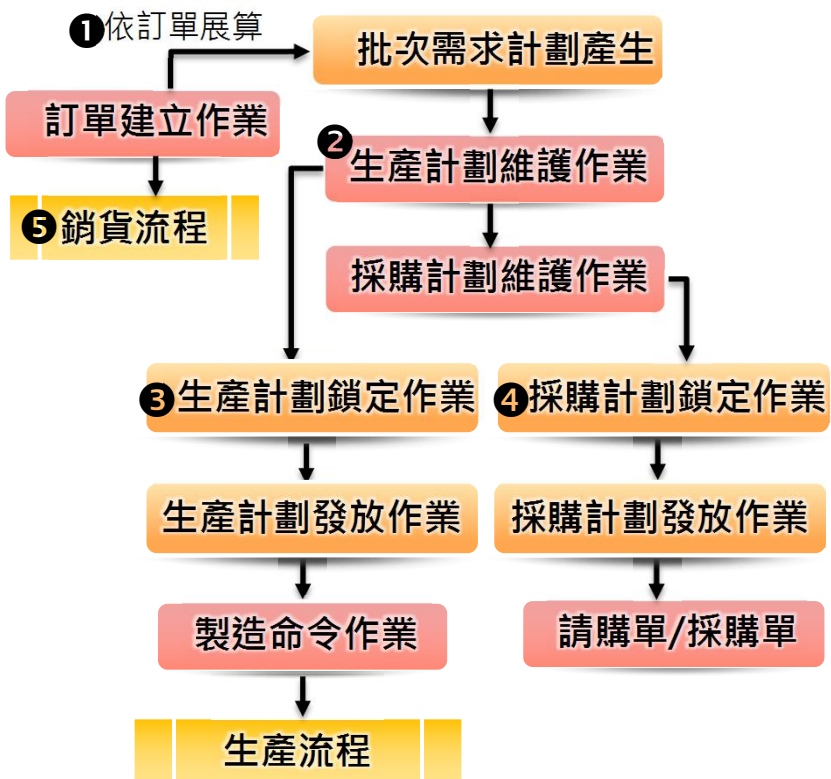

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



來源：
客戶訂單

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2019/08/05 拋轉狀態
 訂單單號 20190805002 客戶代號 1008 復興公司 訂單日期
 流程代號 EBO拋轉狀態 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理者

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 嘜頭資料 多角貿易
 部門代號 30 業務部門 稅別碼 505 銷項三聯式發票-應稅外加
 業務人員 301 孫業務 課稅別 2:應稅外加 傳送次數 0 單身多稅率
 出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.000% 列印 0
 交易幣別 NTD 訂金分批 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期
 匯率 1 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 客戶單號 價格條件

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	類型	贈品量	贈品已交量	備品量	備品已交量	單位	預交日	計價數量	計價
0001	430001	數位相機-SV系列	SV1001 1A	成品倉	100	0	1	贈品量	0	0	0	0	ea	2019/08/25	100	ea

須經主管確認並有完整的預計交貨日期

訂單金額 1,500,000 總數量 100
 訂單稅額 75,000 總毛重 (Kg) 0
 合計 1,575,000 總材積 (CUFT) 0

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



來源：
採購單

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2019/08/01
 採購單號 20190801002 供應廠商 1001
 流程代號 三星公司 版次 0000

拋轉狀態 N:未 採購日期 2019
 確認者 DS 系統管理者
 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 採購人員 401 李採購 運輸方式
 交易幣別 NTD 匯率 1 訂金分批 訂金比率 0.00%
 稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率
☐ EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 ☐ 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	計價數量	計價單位	預交日	採購單價	營業
0001	9.其他	2.正式品號	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		1C	原料倉	500	0	0	pcs	500	pcs	2019/08/15	20	5

須經主管確認並有完整的預計交貨日期

- 1.將當月5日復興公司客戶訂單作確認。
- 2.將當月1日三星公司的採購單作確認。

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

資料清單

資料清單

訂單單別 220 國內訂單

訂單單號 20190805002

流程代號

交易資料一

交易資料二

部門代號 30 業務部

業務人員 301 孫業務

出貨廠別 001 台北廠

交易幣別 NTD

匯率 1

客戶單號

序號	品號	品名	規格
0001	430001	數位相機-SV系列	SV1001

訂單金額 1,500,000

訂單稅額 75,000

合計 1,575,000

訂單選配維護

瀏覽	單身資料筆數: 1	430001 數位相機-S
----	-----------	---------------

採購單建立作業(PURI07)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製採購單 BARTENDER修

採購單別 33A 國內採購單

單據日期 2019/08/01

拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 20190801002

供應商 1001

採購日期 2019/08/01

流程代號

三星公司

確認者 DS 系統管理者

匯率

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一

交易資料二

多角貿易

資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠

列印格式 1:中文

簽核狀態 N:不執行電子簽核

採購人員 001 李採購

運輸方式

交易幣別 NTD

匯率 1

訂金分批

訂金比率 0.00%

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

備註

列印 0

傳送次數 0

單身多稅率

EBC確認碼


EBC採購單號

EBC採購版次

匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	計價數量	計價單位	預交日
0001	9.其他	2.正式品號	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		1C	原料倉	500	0	0	pcs	500	pcs	2019/08/15

四、接單式生產案例

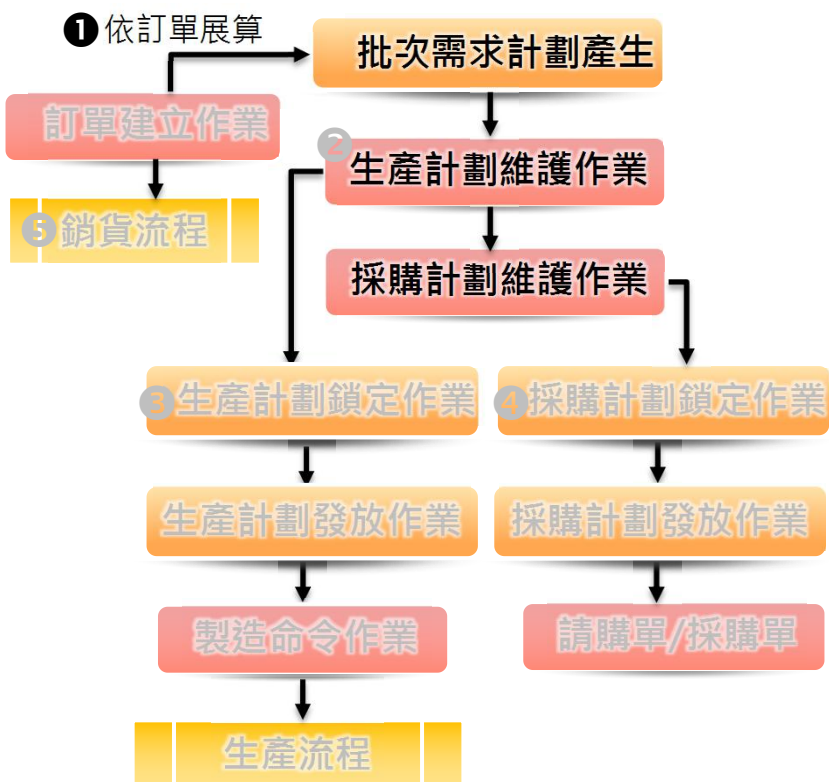

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。 <由講師示範操作>

步驟一：低階碼計算更新

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知

警示

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 系統+作業別

庫存管理系統

產品結構管理系統

基本資料管理

日常異動處理

清單與明細表

報表列印

批次作業

料件用量資料複製作業

元件資料整批修改作業

失效元件整批刪除作業

元件序號重排

低階碼計算更新作業

標準成本計算更新作業

BOM 自動請購作業產生

取替代料件整批修改作業

產品結構單據清除作業

異動單據憑證

料件承認管理

應付管理系統

異議資金管理系統

會計總帳管理系統

自動分錄系統

產品結構管理系統

低階碼計算更新作業(BOMB05)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

更新作業

更新作業

資料系統建立

系統銷貨單

作業位置：產品結構管理系統 \ 批次作業 \ 低階碼計算更新

系統依品號低階碼的順序，展算批次需求計劃之『生產計劃』及『採購計劃』。

步驟二：批次需求計劃產生

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警告 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 群組命名

刪除方塊 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 系統+作業別

系統+作業別

票據資金管理系統

會計總帳管理系統

自動分錄系統

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

B 批次需求計劃產生

B 生產計劃鎖定

B 批次計劃清除

B 生產計劃發放

B 採購計劃鎖定

B 採購計劃發放

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

1 選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

僅顯示未拋轉單據

2 選擇來源編號

220 -20190805002

來源單別 220

來源單號 20190805002

來源序號

選擇MPS計劃批號

輸入計劃批號 22020190805002

依據訂單為計劃來源

確認

取消

週期性

選擇要列入計算的計劃來源：

- 若要將整張訂單需求列入推算，在左方來源編號直接選取；
- 若僅針對訂單中某幾筆品項進行推算，可從右方選擇來源單別、單號、序號，點選  帶到左方的來源編號。

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

步驟二：批次需求計劃產生

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知

警告

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 系統+作業別

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

☒ 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

220 -20190805002

來源單別 220

來源單號 20190805002

來源序號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起 迄

選擇鎖定狀態

☒ 已鎖定

☒ 考慮損耗率

3 輸入計劃批號 22020190805002

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

步驟二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知

警告

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 系統+作業別

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

4 批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

5 ☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☒ 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別 ☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

重點說明

◆ 批次需求計算方式：淨需求、毛需求。

(1) 選擇毛需求，則以原需求數量展BOM算出生產/採購。

(2) 選擇淨需求，以(需求數量 - 庫存可用量)的結果展BOM，計算出生產/採購量，且只補足該批**最大補量**。

註：

最大補量概念：採淨需求計算時，計算出來的需求數量不可 > 採毛需求計算出來的數量，最多只可與毛需求的數量相等。

例如訂單需求100PCS，現有庫存量20PCS，安全存量設定為30PCS，理論上總需求為110PCS，採淨需求計算時，計算出來的需求只有100PCS，不可大於毛需求的數量。

步驟二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知

警告

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 系統+作業別

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☒ 需求日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別

☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

重點說明

- ◆ 供給量日期/需求量日期納入考慮:
計算可用量時，若預計供給或需求的日期，晚於該批的需求日，是否要納入可用量計算？
 - ☑ 表示在「考慮」日期因素下，料件需求日期之後的需求量/供給量「不納入」計算。
 - ※ 表示在「考慮」日期因素下，料件需求日期之後的需求量/供給量「納入」計算。



重點說明



執行「淨需求」時，

✓ 供給量日期納入考慮

✓ 需求量日期納入考慮

選項的意義？



1

■ 供給量日期納入考慮

■ 需求量日期納入考慮

2

✓ 供給量日期納入考慮

■ 需求量日期納入考慮

3

■ 供給量日期納入考慮

✓ 需求量日期納入考慮

4

✓ 供給量日期納入考慮

✓ 需求量日期納入考慮

零庫存

特點：達供需平衡的水準。

缺點：如果截點後的供應來不及提前，就會有斷料風險。

特點：截點後的需求可提前備貨。

缺點：若提前備貨的需求被取消時，將造成閒置庫存增加。
如果只有購買LRP建議用此項設定

特點：計劃截點後的供給，可提前供應此次的需求。

缺點：若供給未如預期在需求截點前補齊時，將有斷料風險。

插單型

特點：只考慮需求截點時的供需，適合接單式生產，或針對插單的訂單做計劃。

缺點：未來若有大批量入出，庫存量可能激增，或備貨不及。
同時有購買MRP/LRP建議此設定

步驟二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知

警告

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 系統+作業別

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☒ 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別

☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

重點說明

◆選擇需產生之計劃：可選擇「生產計劃」、「採購計劃」或「全部」。

(1)建議**第一次執行計劃產生**時，選擇「**全部**」（產生**生產計劃及採購計劃**）；或是選擇「**生產計劃**」，執行完後再以產生出來之生產計劃為來源，選擇「**採購計劃**」來產生採購計劃。

(2)**第一次產生計劃時，不可以直接選「採購計劃」**，因為系統是依生產計劃的內容來產生採購計劃。

(3)「品號資料建立作業」之品號屬性若為：
M(自製件)或**S**(託外加工件)→產生**生產計劃**；
P(採購件)→產生**採購計劃**。

◆已發放料件補充方式：選擇**毛需求**計算方式才會啟用。

例如：訂單需求數量100，採毛需求計算並已發放製令單與採購單，後續因訂單變更追加數量為150，原訂單再次執行批次需求計劃產生時可選擇「不再補充」、「重新補充」或「補充差額」。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護



系統產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2019/08/19		1B	半成品倉	30	ea	2019/08/14		2019/08/14	511	託外製令單
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2019/08/22		1A	成品倉	80	ea	2019/08/20		2019/08/20	510	廠內製令單

①

②

③

④

⑤

- 完工日 = 計劃來源之(需求日-檢驗天數-1)
- 開工日 = 完工日-生產前置天數

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 2202019080500

備註

台北廠

系統產生

品號	品名
320005	PCBA-Assembly
430001	數位相機-SV系列

庫存量	50.000
安全存量	0.000
預計進貨	0.000
預計請購	0.000
請拋採未確認	0.000
預計生產	0.000
預計銷售	0.000
預計領用	0.000
計劃採購	0.000
計劃生產	0.000
計劃銷售	0.000
計劃領用	80.000
毛需求量	80.000
已發放量	0.000

原始需求量

庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱
...	半成品倉	30	ea	2019/08/14	...	2019/08/14	511	託外製令單
...	成品倉	80	ea	2019/08/20	...	2019/08/20	510	廠內製令單

發放過的計劃批號，重新產生時，顯示上次已發放量供參考。

步驟三：檢視批次生產計劃維護



時序圖
時序圖

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

系統
產生

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購限制日期	備註
511	託外製令單	3004	訊達公司		0000:00:00	NTD	100	☐	1: 訂單	220	20190805002	0001		
510	廠內製令單	601	製一課		0000:00:00		0	☐	1: 訂單	220	20190805002	0001		

6

7

8

- 預設「BOM用量資料建立作業」的「製令單別」，可修改。生產計劃將依此單別發放成製令單。
- 生產品號屬性為「M:自製件」，預設品號資料的「生產線別」。
- 生產品號屬性為「S:託外加工件」，預設品號資料的「主供應商」及預設加工計價資料的最新「加工單價」。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護

系統
產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購限制日期	備註
511	託外製令單	3004	訊達公司		0000:00:00	NTD	100	☐	1: 訂單	220	20190805002	0001		
510	廠內製令單	601	製一課		0000:00:00		0	☐	1: 訂單	220	20190805002	0001		

9

10

- 若生管人員檢視此生產計劃無誤，勾選鎖定以利辨識與發放製令。
- 可追溯此生產計劃的來源依據(如：訂單)。

系統
產生

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購限制日期	備註
511	託外製令單	3004	訊達公司		0000:00:00	NTD	100	☐	1: 訂單	220	20190805002	0001		
510	廠內製令單	601	製一課		0000:00:00		0	☐	1: 訂單	220	20190805002	0001		

點選子單身【批次生產計劃維護-依品號】按鈕，
查看該生產品號的相依需求料件。

註：相依需求為生產品號之單階用量清單

批次生產計劃維護-依品號

材料品號	品名	規格	需領用量	單位	預計領料日	庫別	庫別名稱	製程順序	材料型態	取替代件	被取替代品號	備註	優先順序
120001	電阻		120	pcs	2019/08/14	1C	原料倉	****	1:直接材料		120001		
120002	整流器		30	pcs	2019/08/14	1C	原料倉	****	1:直接材料		120002		
120003	二極管		60	pcs	2019/08/14	1C	原料倉	****	1:直接材料		120003		
120004	電容		180	pcs	2019/08/14	1C	原料倉	****	1:直接材料		120004		
120005	變壓器		30	pcs	2019/08/14	1C	原料倉	****	1:直接材料		120005		

批次生產計劃維護-依品號

11

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟四：檢視批次採購計劃維護



系統產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
110012	主開關連動板	SV系列	2019/08/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	80	pcs	2019/08/05	NTD	50	☐

①

②

③

➤ 根據生產計劃的相依領料需求推算。

交貨日=預計領料日-檢驗天數-1

➤ 採購廠商，預設品號資料的「主供應商」。

步驟四：檢視批次採購計劃維護

系統產生

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020190805002 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
110012	主開關連動板 SV系列		2019/08/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	80	pcs	2019/08/05	NTD	50	☐

5

5

6

➤ 採購日 = 交貨日 - 採購前置天數

• 「批次需求計算方式」 = 毛需求，採購數量 = 毛需求量

• 「批次需求計算方式」 = 淨需求，採購數量 = 毛需求量 - 庫存可用量

動手做做看!

批次需求計劃產生

案例操作：

本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020190805002 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2019/08/19		1B	半成品倉	30	ea	2019/08/14		2019/08/14
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2019/08/22		1A	成品倉	80	ea	2019/08/20		2019/08/20

批次採購計劃維護-依品號(LRPI03)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020190805002 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商商稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價
110012	主開關連動板	SV系列	2019/08/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	80	pcs	2019/08/05	NTD	50



建議

➤ 補貨備料規劃:

- 通用性材料、常態性用料或較易取得的材料，可運用「**品號再補貨建議表**」、「**製令需求檢視表**」進行備料。(補貨政策 R)
- 成本高或取得較不容易(交期長)的料件，利用「**批次需求計算方式**」進行備料。(補貨政策 L)

報表應用-生產線負荷明細表

 **使用時機：**對於已經發放的正式製造命令或仍在計劃中之生產計劃，想瞭解其對生產線所造成之負荷情形，可利用此報表預估後續生產時所需耗費人時、機時，可作為估計生產進度用，藉以評估生產計劃之可行性，並做為調整生產計劃或調整產能之依據。

 **作業位置：**批次需求計劃系統 \ 報表列印 \ 生產線負荷明細表

生產線負荷明細表(LRPR07)[成功科技]

基本選項

註記/審核

系統選項

選擇廠別

選擇生產線別

☐ 區間選擇

選擇日期

起 2019/07/01

迄 2019/08/31

選擇生產負荷來源

☒ 製造命令

人時機時來源：

☒ 製令製程 (當無製程時，取產品途程)

☐ 產品途程

☒ 生產計劃

確認

取消

週期性

即時報表

報表檢視功能



選擇格式



儲存格式




刪除格式



修改目前格式



擴展延伸設計



預覽列印




印表機設定



存成EXCEL檔



轉成HTML格式



存成文字檔



上一頁



下一頁



第一頁



最後一頁



e-mail:依客戶/廠商傳送



e-mail



關於



佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

成功科技

生產線負荷明細表

製表日期: 2019/08/05

期間: 2019/07/01 至 2019/08/31

第 1 頁

廠別 廠別名	生產線 生產線名稱	日期	負荷來源	人工小時 機器小時	產品品號	單位	品名 規格	生產數量
001 台北廠	601 製一課	2019/07/06	510 -20190706001		420001	ea	數位相機-SX系列 SX1001	250.00
		2019/07/10	512 -20190710001		410006	ea	數位相機-SL1322系列 SL1322	100.00
		2019/08/06	510 -20190806001		420001	ea	數位相機-SX系列 SX1001	250.00
		2019/08/10	512 -20190810001		410006	ea	數位相機-SL1322系列 SL1322	100.00
		2019/08/20	22020190805002		430001	ea	數位相機-SV系列 SV1001	80.00
	605 製四課	2019/07/11	512 -20190711001		310006	ea	LCD Display	100.00
		2019/07/16	521 -20190716001		310006	ea	LCD Display	100.00
		2019/08/11	512 -20190811001		310006	ea	LCD Display	100.00
		2019/08/16	521 -20190816001		310006	ea	LCD Display	100.00
	小計:							1,180.00

<結 束>

報表應用-品號供需明細表

 **使用時機：**可依品號及截止時點列印現有庫存及在未來一段期間裡預計會異動的「十大量明細資料」的數量，以掌握各料件未來的供需狀況及在未來各時點的預計庫存結餘情形，亦可作為「產能變動」分析借調料可行性的參考依據。同時，可以檢視庫存是否有過多或過少的現象或判斷製造命令、生產計劃、採購單或採購計劃是否有不妥之處。



作業位置：批次需求計劃系統 \ 報表列印 \ 品號供需明細表

品號供需明細表(LRPR05)[成功科技]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇分類方式 會計

選擇廠別

選擇類別

選擇庫別

☐ 區間選擇

選擇品號

☐ 區間選擇

選擇計劃人員

選擇日期

起 2019/07/01

迄 2019/08/31

品號供需明細表(LRPR05)[成功科技]

基本選項 進階選項 註記/審核 系統選項

選擇品號補貨政策

☒ 依補貨點

☒ 不需

☒ 依MRP需求

☒ 依歷史銷售

☒ 依LRP需求

☐ 列印虛設品號

☒ 列印計劃資料

☒ 僅列印存在於計劃檔中的品號

☒ 生產計劃檔

☒ 採購計劃檔

選擇計劃批號

☐ 區間選擇

選擇列印條件 列印全部

☐ 列印期初為零且本期無異動



確認



取消



週期性



即時報表

報表檢視功能



選擇格式



儲存格式




刪除格式




修改目前格式



擴展延伸設計



預覽列印




印表機設定



存成EXCEL檔



轉成HTML格式



存成文字檔




上一頁



下一頁




第一頁



最後一頁



e-mail:依客戶/廠商傳送



e-mail



關於



佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

成功科技股份有限公司

品號供需明細表

製表日期: 2019/08/05


期間: 2019/07/01至2019/08/31

第 1 頁

品號	品名規格	單位 小單位	日期 異動別	庫別 庫別名稱	異動數量 預計結存	結存<安全存量	備註
110012	主開關連動板 SV系列	pcs	庫存可用量:				
			2019/08/15	IC	80		
			計劃進貨	原料倉	80		22020190805002 /1003日昇公司
			2019/08/20	IC	80		
			計劃領用	原料倉			22020190805002
120001	電阻	pcs	庫存可用量:		-43,281		
			2019/07/01	IC	1,008	*	511 20190701001/320002/
			預計領用	原料倉	-44,289		
			2019/08/14	IC	120	*	22020190805002
			計劃領用	原料倉	-44,409		
120002	整流器	pcs	庫存可用量:		84,120		
			2019/07/01	IC	160		511 20190701001/320002/
			預計領用	原料倉	83,960		
			2019/07/16	IC	500		310 2019070400100020001/1003日昇公司
			預計請購	原料倉	84,460		
			2019/07/25	IC	2,500		33A 201907020010001/1004冠軍公司
			預計進貨	原料倉	86,960		
			2019/08/14	IC	30		22020190805002
			計劃領用	原料倉	86,930		

<續下頁>

四、接單式生產案例

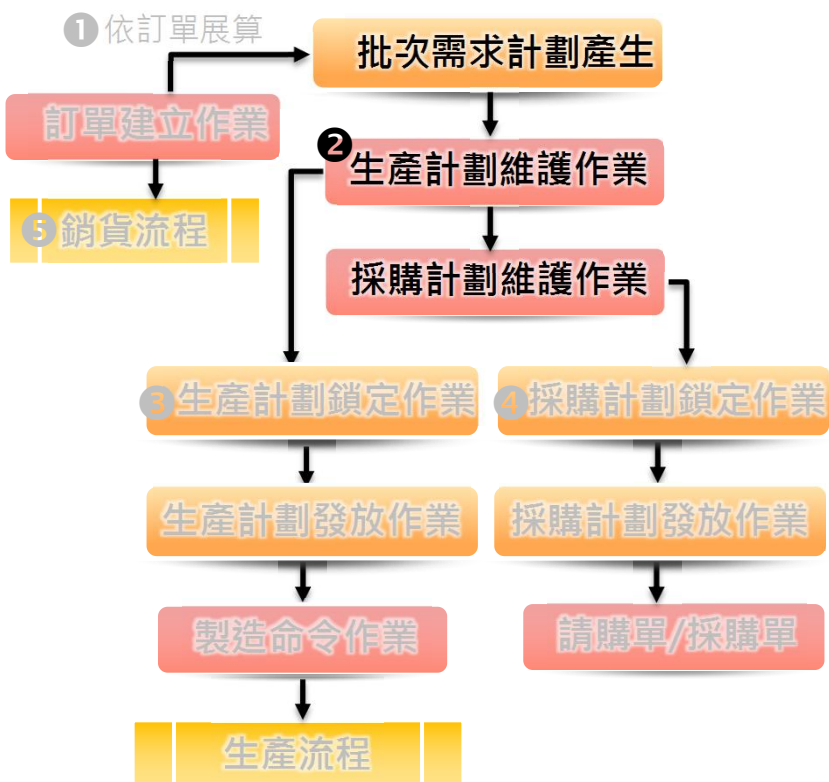

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。

步驟五：修改數量

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	鎖定	製令名稱	加工廠商/線別
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2019/08/19		1B	半成品倉	30	ea	2019/08/14		2019/08/14	511	☐	託外製令單	3004
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2019/08/22	...	1A	成品倉	95	ea	2019/08/20	...	2019/08/20	510	☒	廠內製令單	601

生產計劃新增或變更後，在半成品及材料重新展算前，該生產計劃必須勾選「鎖定」。

步驟五：修改數量

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	鎖定	製令名稱	加工廠商/線別
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2019/08/19		1B	半成品倉	30	ea	2019/08/14		2019/08/14	511	☐	託外製令單	3004
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2019/08/22		1A	成品倉	95	ea	2019/08/20		2019/08/20	510	☒	廠內製令單	601

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

☒ 相關資料有異動,是否重新產生相依需求資料

☐ 拋 BOM 單身備註

☒ 考慮主要領料庫別

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號

22020190805002

廠別

001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	鎖定	製令名稱	加工廠商/線
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2019/08/19		1B	半成品倉	30	ea	2019/08/14		2019/08/14	511	☐	託外製令單	3004
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2019/08/22		1A	成品倉	95	ea	2019/08/20		2019/08/20	510	☒	廠內製令單	601



成品改生產數量，半成品不用改？

步驟六：再次產生計劃

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視 新增流程 群組命名

刪除方塊 重新登入 鎖定方塊 離開

檢視類別 教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - B 批次需求計劃產生
 - B 生產計劃鎖定
 - B 批次計劃清除
 - B 生產計劃發放
 - B 採購計劃鎖定
 - B 採購計劃發放
- 主生產排程系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

1 選擇計劃依據 依計劃來源

選擇廠別 001

僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

來源單別

來源單號

2 輸入計劃批號 22020190805002

選擇鎖定狀態

☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

確認 取消 週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(5ms) CAPS NUM SCRL INS

56

步驟六：再次產生計劃

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警告 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視 新增流程 群組命名

刪除方塊 重新登入 鎖定方塊 離開

檢視類別 教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

3 批次需求計算方式

- ☒ 淨需求
- ☐ 毛需求

4 ☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

5 ☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☒ 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

6 對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

- ☒ 來源庫別
- ☐ 主要庫別

- ☐ Feature件依比率計算
- ☐ Option 件依比率計算
- ☒ 考慮庫存可用量
- ☐ 產生不需補充之料件
- ☐ 拋 BOM 單頭備註
- ☐ 拋 BOM 單身備註
- ☐ 客戶供料計算
- ☐ 不發料計算
- ☒ 考慮主要領料庫別

確認 取消 週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(5ms) CAPS NUM SCRL INS

步驟六：檢視生產計劃

結果



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	依據	來源單別	來源單號	BOM日期	製令單別
▶ 320005 ...	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2019/08/19 ...		1B ...	半成品倉	45 ...	ea	2019/08/14 ...		3:計劃	220	20190805002	2019/08/14 ...	511 ...
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2019/08/22		1A	成品倉	95	ea	2019/08/20		1:訂單	220	20190805002	2019/08/20	510

此生產計劃的來源依據為追加數量後的生產計劃。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟六：檢視採購計劃

結果



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	製造商	製造商簡稱	承認型號	備註
▶ 110012 ...	主開關連動板 SV系列		2019/08/15 ...	1003 ...	日昇公司	1C ...	原料倉	95 ...	pcs ...	2019/08/05 ...	NTD ...	50 ...	☐				

動手做做看!

批次需求計劃產生

案例操作：

檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品；調整後並重新執行「批次需求計劃產生」



批次生產計劃維護-依品號(LRP101)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號: 22020190805002 廠別: 001 台北廠

備註:

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	製令單別	製令名稱	加工廠商線別	鎖定	加工單價
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2019/08/19		1B	半成品倉	30	ea	2019/08/14		511	託外製令單	3004		100
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2019/08/22		1A	成品倉	95	ea	2019/08/20		510	廠內製令單	601	☒	0

批次需求計劃產生(LRP801)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據: 依計劃來源

選擇廠別: 001

☐ 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起: 迄:

選擇鎖定狀態


☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

輸入計劃批號: 22020190805002

確認 取消 週期性

四、接單式生產案例

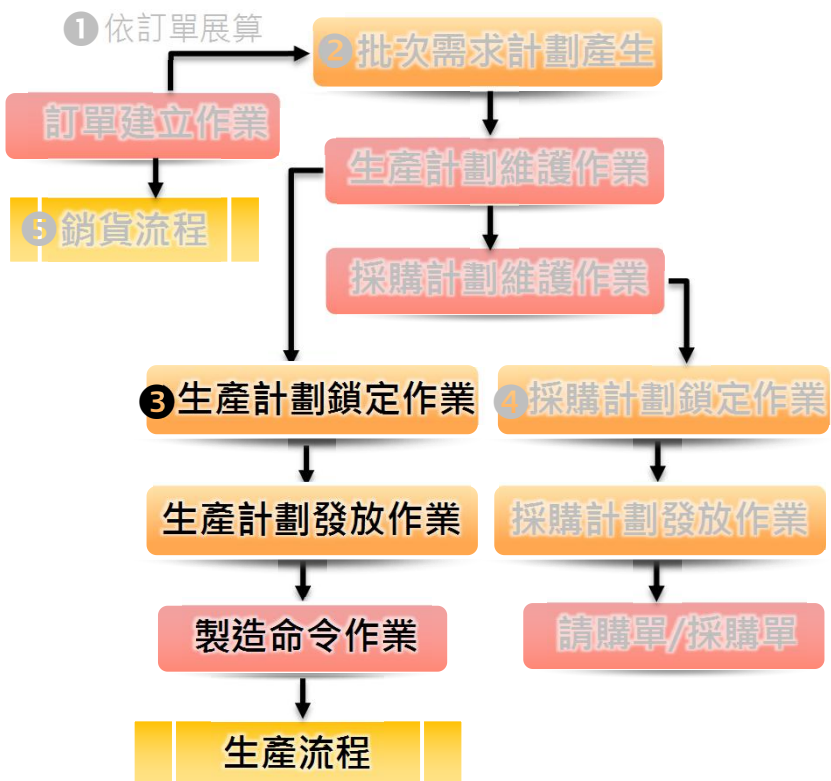

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單


儲存檢視

新增群組 新增流程 群組命名

刪除方塊 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 教學:iGP的Menu

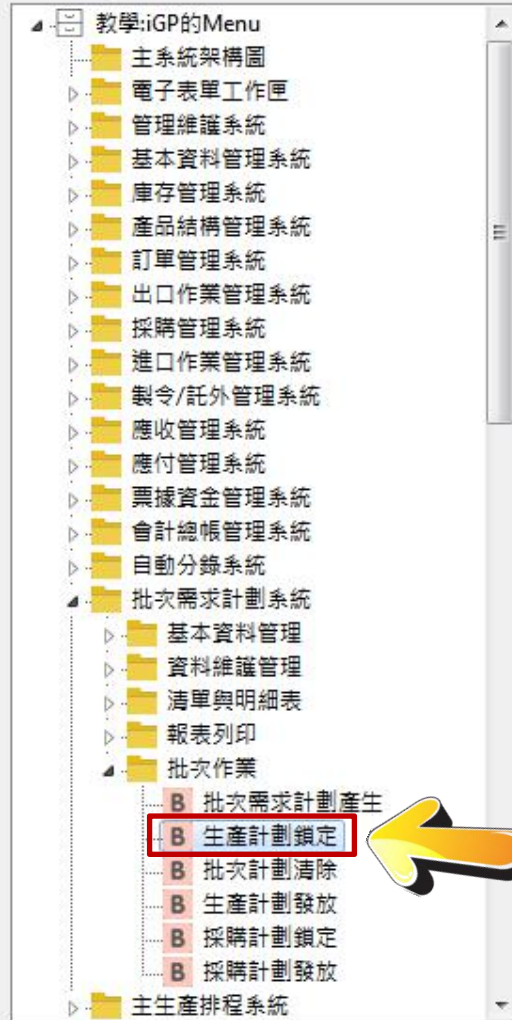

作業目的

- 將檢核未發放的生產計劃，設定為「鎖定」，作為計劃發放的控制依據。
- 重新執行「需求計劃產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。



步驟七：生產計劃鎖定作業

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知

警告

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增流程

刪除方塊

重新登入

離開

群組命名

鎖定方塊

檢視類別 教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

生產計劃鎖定作業(LRPB02)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇鎖定狀態

☒ 鎖定

☐ 取消鎖定

選擇品號

起

迄

選擇廠別

選擇庫別

選擇完工日

起

迄

選擇計劃批號

起 22020190805002

迄 22020190805002

選擇製令單別

選擇計劃人員

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(11ms) CAPS NUM SCRL INS

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購限制日期	備註
	2019/08/14 ...	511 ...	託外製令單	3004	訊達公司		0000:00:00	NTD ...	100	☒	3.計劃	220	20190805002	0001		...
	2019/08/20	510	廠內製令單	601	製一課		0000:00:00		0	☒	1.訂單	220	20190805002	0001		

批次生產計劃維護的「鎖定」可以透過：

- 1.執行「生產計劃鎖定作業」更新
- 2.手動勾選

備註：

生產計劃新增或變更後，在半成品及材料重新展算前，該生產計劃也必須勾選「鎖定」。

我的ERP

工具

幫助

司別

成功科技

啟動

-

速查

待辦

通知

警示

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增群組

新增流程

群組命名

刪除方塊

鎖定方塊

重新登入

離開

類別

教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

主系統架構圖

電子表單工作匣

管理維護系統

基本資料管理系統

庫存管理系統

產品結構管理系統

訂單管理系統

出口作業管理系統

採購管理系統

進口作業管理系統

製令/託外管理系統

應收管理系統

應付管理系統

票據資金管理系統

會計總帳管理系統

自動分錄系統

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

批次需求計劃產生

生產計劃鎖定

批次計劃清除

生產計劃發放

採購計劃鎖定

採購計劃發放

主生產排程系統

作業目的

➤ 將生產計劃發放成為「廠內/託外製造命令」，作為生產的依據。

➤ 未做鎖定的資料後續也可發放。

我的ERP

作業清單

監控檢核

步驟八：生產計劃發放

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

檢視類別 教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

使用自由訂條件式

生產計劃發放作業(LRPB03)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇品號

起

迄

選擇完工日

起

迄

選擇開工日

起

迄

選擇計劃批號

起 22020190805002

迄 22020190805002

選擇廠別

選擇庫別

選擇狀態

☒ 鎖定 ☐ 全部

選擇製令單別

選擇製令性質 全部

選擇計劃人員

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(4ms) CAPS NUM SCRL INS

步驟八：生產計劃發放

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

檢視類別 教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作區
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

使用排程條件

生產計劃發放作業(LRPB03)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇發放方式 皆不合併

發放排序依據 計劃批號

☒ 發放託外製令之加工單價為零者

☒ 開工,完工日小於發放日期更改與發放日期相同

輸入生管/採購人員

輸入發放日期 2019/08/05

確認

取消

週期性

生產計劃推算出的預計開工日、預計完工日可能會早於實際發放日期，建議勾選此選項確保資料的合理性。

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(4ms) CAPS NUM SCRL INS



結果

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱	加工廠商線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購限制日期	備註
------	-------	------	------	--------	----	------	------	----	------	----	----	------	------	------	--------	----

- 生產計劃發放後，「批次生產計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被**清空**。
- 另可於製令管理系統之「製造命令建立作業」**查詢**發放後所產生之製令工單。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆



首筆



儲存



取消



確認



取消確認



作業



Excel



附件



應用



複製製令



用料計算

系統產生

製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0 傳送次數 0



製令單號 20190805001

產品品號 430001

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/05

品名 數位相機-SV系列

性質 1:廠內製令

規格 SV1001

類型 2:正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 95

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/20 <二>

BOM日期 2019/08/20

預計完工 2019/08/22 <四>

確認日 2019/08/05

實際開工

確認者 DS 系統管理者

實際完工

簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	110012	主開關連動板 SV系列		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150001	包裝盒		190	0	190	pcs	****
2.正式品號	150002	內隔板		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150003	氣泡袋		190	0	190	pcs	****
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150006	保證卡		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150007	包裝盒貼紙 SV系列		0	0	0	pcs	****
2.正式品號	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	320004	PCBA-Assembly Main	SV系列	95	0	95	ea	****
2.正式品號	320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	95	0	95	ea	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190805001 產品品號 430001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/05 品名 數位相機-SV系列

性質 1:廠內製令 規格 SV1001

類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000



時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

母製令號 510 20190805001

訂單單號 220 20190805002 0001

客戶代號 1008 復興公司

客戶單號

客戶品號

採購

紀錄製令的來源依據

備註

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	110012	主開關連動板 SV系列		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150001	包裝盒		190	0	190	pcs	****
2.正式品號	150002	內隔板		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150003	氣泡袋		190	0	190	pcs	****
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150006	保證卡		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150007	包裝盒貼紙 SV系列		0	0	0	pcs	****
2.正式品號	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	320004	PCBA-Assembly Main	SV系列	95	0	95	ea	****
2.正式品號	320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	95	0	95	ea	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



修改



系統產生



新增

查詢

刪除

列印

上筆

儲存

取消

確認

取消確認

作廢

Excel

附件

應用

複製製令

用料計算

製令單別 511 託外製

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0 傳送次數 0



製令單號 20190805001

產品品號 320005

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/05

品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令

規格 SV系列

類型 2:正式品號

單位 ea

BOM版次 0001

版次 0000

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

客戶代號

母製令號 511 20190805001

客戶單號

訂單單號

客戶品號

採購限制日期

專案代號

備註

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	120001	電阻		189	0	189	pcs	****
2.正式品號	120002	整流器		45	0	45	pcs	****
2.正式品號	120003	二極管		90	0	90	pcs	****
2.正式品號	120004	電容		270	0	270	pcs	****
2.正式品號	120005	變壓器		45	0	45	pcs	****
2.正式品號	120006	IC,CMOS		90	0	90	pcs	****
2.正式品號	130003	金屬接片		45	0	45	pcs	****
2.正式品號	190001	PCB電板		45	0	45	pcs	****
2.正式品號	200001	錫		45	0	45	g	****

動手做做看!

生產計劃鎖定作業
生產計劃發放作業

案例操作：

再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190805001 產品品號 320005 EBO拋轉狀態 不需拋轉

0001 版次 0000

包裝資料 資料瀏覽

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上單 下單 末單 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190805001 產品品號 430001 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/05 品名 數位相機-SV系列

性質 1:廠內製令 規格 SV1001

類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	95			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2019/08/20	BOM日期 2019/08/20		
預計完工	2019/08/22	確認日 2019/08/05		
實際開工		確認者 DS 系統管理者		
實際完工		簽核狀態 N:不執行電子簽核		

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	110012	主開關連動板 SV系列		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150001	包裝盒		190	0	190	pcs	****
2.正式品號	150002	內隔板		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150003	氣泡袋		190	0	190	pcs	****
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150006	保證卡		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	150007	包裝盒貼紙 SV系列		0	0	0	pcs	****
2.正式品號	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		95	0	95	pcs	****
2.正式品號	320004	PCBA-Assembly Main	SV系列	95	0	95	ea	****
2.正式品號	320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	95	0	95	ea	****

產品序號維護

日期 2019/08/14

日 2019/08/05


者 DS 系統管理者

態 N:不執行電子簽核

需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
189	0	189	pcs	****
45	0	45	pcs	****
90	0	90	pcs	****
270	0	270	pcs	****
45	0	45	pcs	****
90	0	90	pcs	****
45	0	45	pcs	****
45	0	45	pcs	****
45	0	45	g	****

192.168.45.226 - 211

四、接單式生產案例

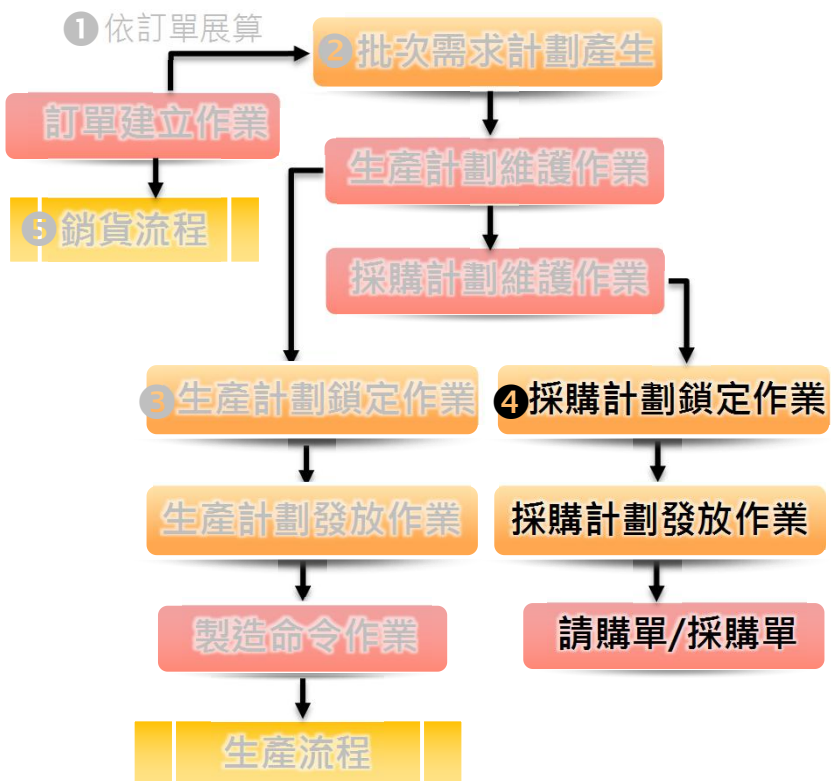

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP

工具

幫助

公司別成功科技

智能啟動-

基礎速查

待辦

通知

警示

追蹤

佇列工作控制台

作業速查

我的訊息

工作管理員

作業清單

進階清單

個人清單

儲存檢視

新增群組

刪除方塊

重新登入

新增流程

鎖定方塊

離開

群組命名

檢視類別教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

我的ERP

作業清單

作業目的

➤將檢核未發放的採購計劃後，設定為「鎖定」，作為計劃發放的控制依據。

➤重新執行「需求計劃產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。



74

成功科技

DS-System Administrator

192.168.45.226

192.168.45.226(5ms)

CAPS NUM SCRL INS

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統

基本資料管理系統

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

採購計劃鎖定作業(LRPB04)[成功科技]

基本選項

系統選項

選擇鎖定狀態

☒ 鎖定☐ 取消鎖定

選擇交貨日

起

迄

選擇品號

起

迄

選擇採購日

起

迄

選擇廠別

選擇庫別

選擇計劃批號

起

迄

選擇計劃人員

確認

取消

週期性

步驟九：採購計劃鎖定

結果

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020190805002 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	製造商	製造商簡稱	承認型號	備註
110012	主開關連動板 SV系列		2019/08/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	95	pcs	2019/08/05	NTD	50	☒				

批次採購計劃維護的「鎖定」可以透過：

- 1.執行「採購計劃鎖定作業」更新。
- 2.手動勾選。

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦

通知 警告 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增群組 新增流程 群組命名

刪除方塊 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 教學:iGP的Menu

作業目的

- 將採購計劃發放成為「請購單」或「採購單」，作為採買料件的依據。
- 未做鎖定的資料後續也可發放。

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

我的ERP 作業清單

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(4ms) CAPS NUM SCRL INS 77



步驟十：採購計劃發放

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名

重新登入 離開

檢視類別 教學:iGP的Menu

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作區
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據资金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

採購計劃發放作業(LRPB05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商

選擇計劃批號

☒ 區間選擇

起 22020190805002

迄 22020190805002

選擇品號

選擇廠別

選擇幣別

選擇庫別

選擇狀態

☒ 鎖定 ☐ 全部

選擇採購日

選擇發放方式

同品號、廠商、交貨日、交貨庫、幣別 合併發放

☒ 考慮最低補量及補貨倍量

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(4ms) CAPS NUM SCRL INS

將廠商規範的最低補量及補貨倍量
納入採購數量評估。

步驟十：採購計劃發放

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名

重新登入 離開

檢視類別 教學:iGP的Menu

採購計劃發放作業(LRPB05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 發放採購單價為零者

☒ 預交日小於發放日期更改與發放日期相同

☒ 依來源單據產生專案代號

輸入單別 33A

輸入流程代號

輸入發放日期 2019/08/05

輸入請購人員

選擇採購人員方式 輸入指定採購人員

輸入指定採購人員 401

選擇品號採購人員

週期性

教學:iGP的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作區
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統

我的ERP 作業清單 監控檢核

成功科技 DS-System Administrator 192.168.45.226 192.168.45.226(4ms) CAPS NUM SCRL INS

採購計劃推算出的預交日可能會早於實際發放日期，建議勾選此選項確保資料的合理性。

結果

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020190805002

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	製造商	製造商簡稱	承認型號	備註
------	----	----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	----	----	----	-----	-------	------	----

- 採購計劃發放後，「批次採購計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被**清空**。
- 另可於採購管理系統之「請購單」或「採購單」**查詢**發放後所產生之單據。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



系統產生

採購單別 33A 國內採購單

單據日期 2019/08/05

拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 20190805002

供應廠商 1003

採購日期 2019/08/05

流程代號

日昇公司

確認者 DS 系統管理者

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一

交易資料二

多角貿易

資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠

列印格式 1:中文

簽核狀態 N:不執行電子簽核

採購人員 401 李採購

運輸方式

交易幣別 NTD 匯率 1

訂金分批

訂金比率 0.00%

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

備註 列印 0

傳送次數 0 單身多稅率

EBC確認碼

EBC採購單號

EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	計價數量	計價單位	採購單價	營業稅率	採購金額
0001	2.LRP	2.正式品號	110012	主開關連動板 SV系列	1C	原料倉	...	1,008	0	1000	pcs	1,008	pcs	50	5.00%	50,400

採購金額 50,400

稅額 2,520

金額合計 52,920

數量合計 1,008

動手做做看!

採購計劃鎖定作業
採購計劃發放作業

案例操作：

再次檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放



採購單建立作業(PUR107)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製採購單 BARTENDER條碼列印

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2019/08/05 拋轉狀態 N:未拋轉
採購單號 20190805002 供應廠商 1003 採購日期 2019/08/05
流程代號 日昇公司 確認者 DS 系統管理者
版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽


廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 審核狀態 N:不執行電子審核
採購人員 401 李採購 運輸方式 訂金分批 訂金比率 0.00%
交易幣別 NTD 匯率 1 營業稅率 5.00%
稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加
備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率
EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	計價數量	計價單位	採購單價	營業稅率	採購金額
0001	2.LRP	2.正式品號	110012	主開關連動板 SV系列	1C	原料倉	1,008	0	1000	pcs	1,008	pcs	50	5.00%	50,400	

採購金額 50,400 稅額 2,520 金額合計 52,920
數量合計 1,008

瀏覽 單身資料筆數: 1 110012 主開關連動板 SV系列 192.168.45.226 - 211

四、接單式生產案例

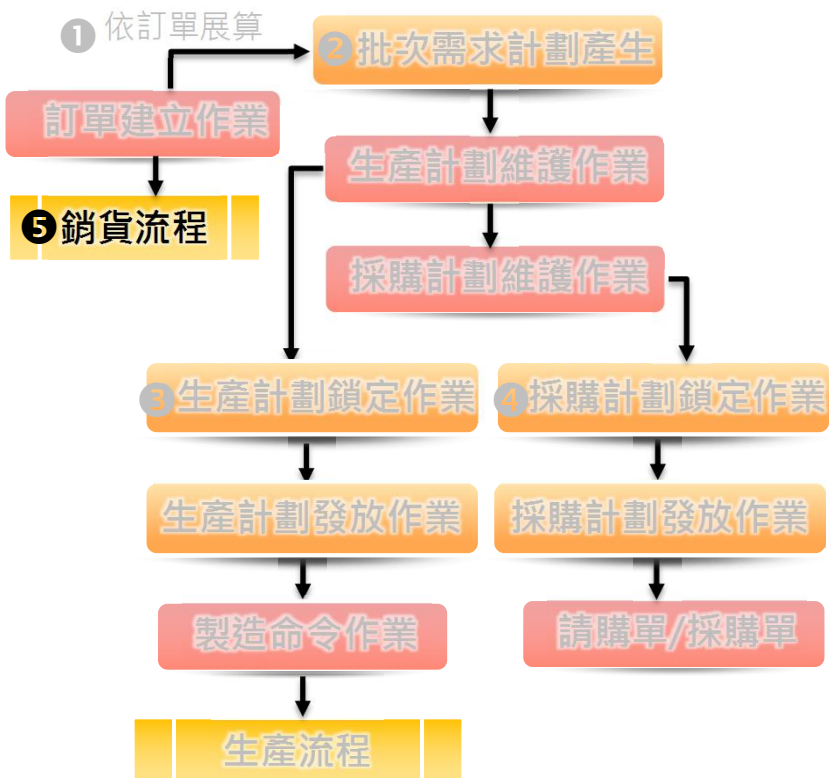

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。 <由講師示範操作>

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



銷貨單別 230 內銷(核訂單) 單據日期 2019/08/25 銷貨日期 2019/08/25 產生分錄-收入
 銷貨單號 20190825002 客戶代號 1008 復興公司 產生分錄-成本
 流程代號 不控管信用額度 拋轉狀態 N:未拋轉
 現銷 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料 送貨資料 發票資料(一) 發票資料(二) 發票資料(三)

部門代號 30 業務部門 幣別 NTD 台幣 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 業務人員 301 孫業務 匯率 1 確認者 DSI
 出貨廠別 001 台北廠 保稅碼 0.依品號預設 系統管理者
 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 備註 傳送次數 0
 交易條件 1 一般交易 件數 0
 列印 0 發票列印 0

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲存位	數量	類型	贈/備品	單位	計價數量	計價單位	單價	訂單單別	訂單單號	訂單序號
0001	...	430001	數位相機-SV系列	SV1001	1A	成品倉		100	1.贈品量	0	ea	100	ea	15,000	220	20190805002	0001

原幣銷貨金額 1,500,000 原幣銷貨稅額 75,000 原幣合計 1,575,000
 本幣銷貨金額 1,500,000 本幣銷貨稅額 75,000 本幣合計 1,575,000
 總數量 100

序號管理維護 儲位批號維護 預收待抵匯差

常見問題Q&A




Q1 若一品號庫存單位與採購單位不同,則採購計劃以那個為主？

A1 以品號基本資料的庫存單位為主。

Q2 執行批次需求計畫產生時，系統會依母製令之預計完工日往前推算子製令的開工日期嗎？

A2 會，系統推算日期時，是從母製令之需求日往前推算其預計開、完工日，(推算時要記得扣掉檢驗天數)，再往前推算子製令的預計開、完工日。

補充：接單設計生產流程(ETO)

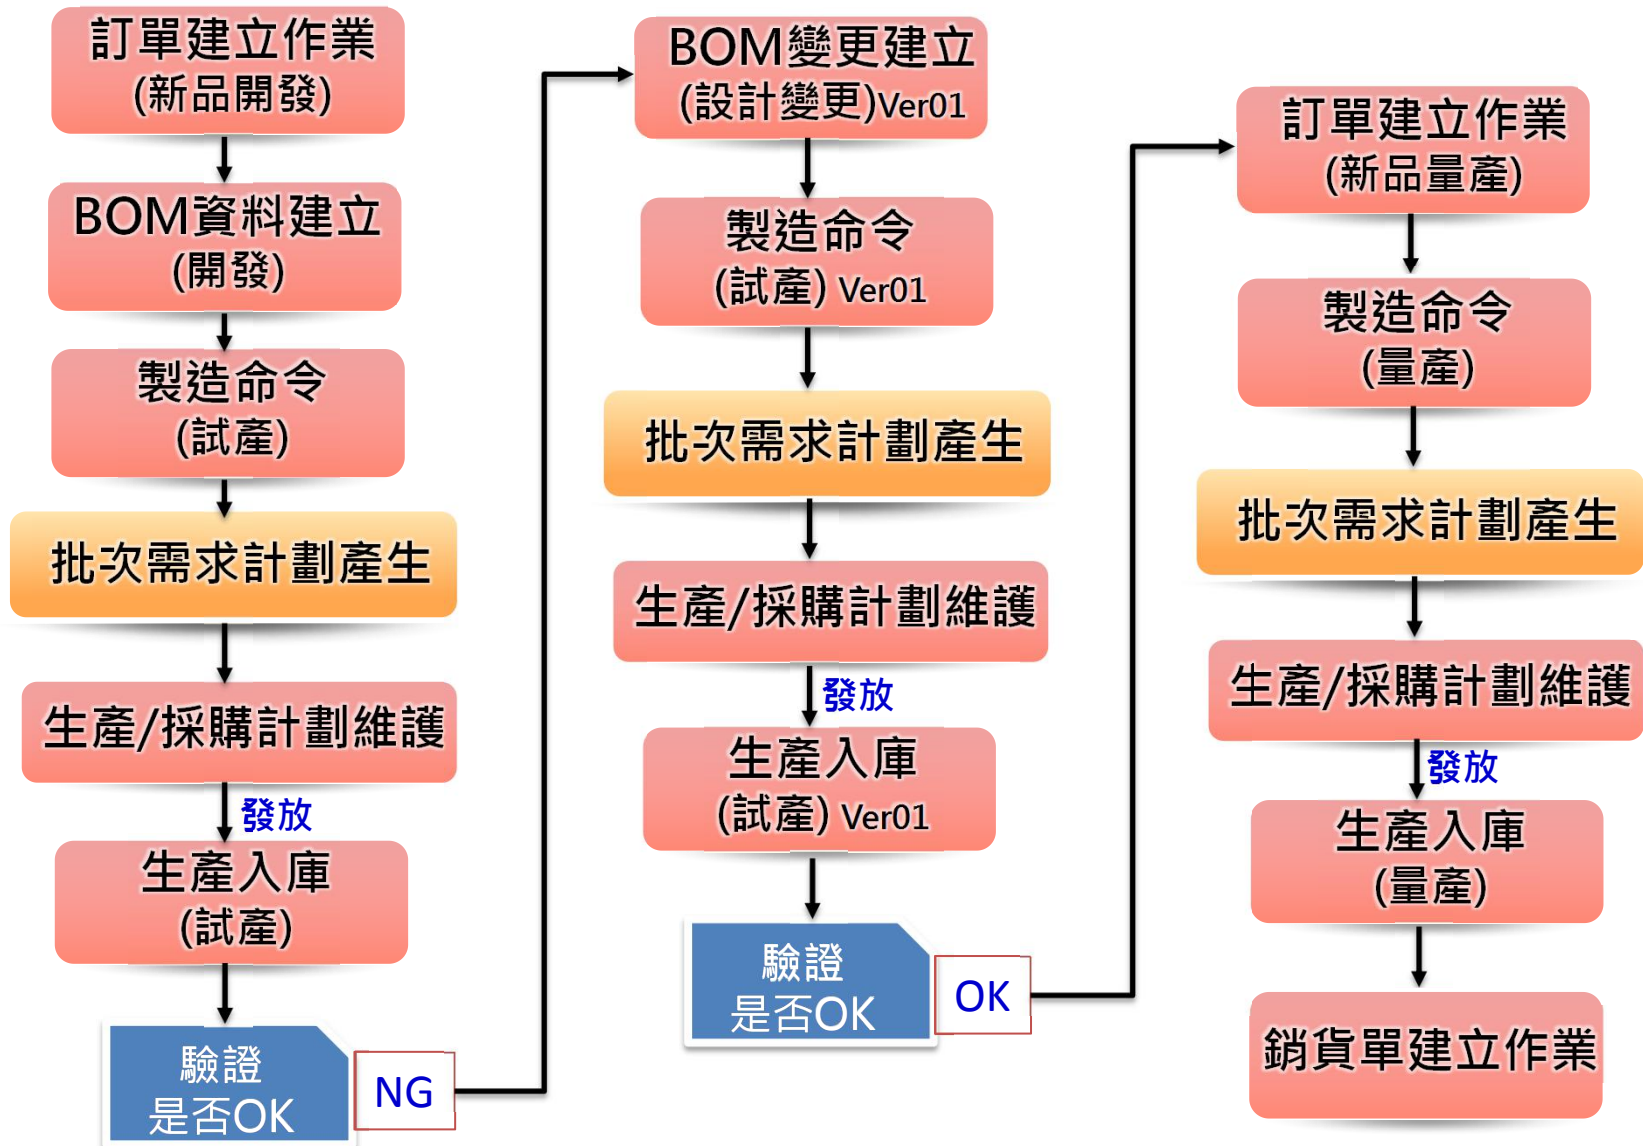


課程回顧

- 一、何謂接單式生產(MTO)
- 二、名詞解釋
- 三、批次需求計畫邏輯說明
- 四、接單式生產流程

課

程

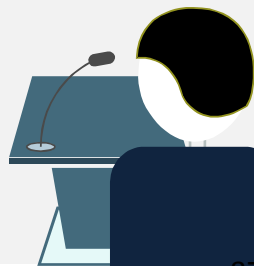

企業包班課程

打造專屬於您的課程

Just For Yours ERP系統包班

只專屬於貴公司的課程，自選授課模式，改變學習思路，讓工作流程更清晰。

企業包班流程



需求訪談

1

接獲客戶需求後
指派專人與貴公司
了解訓練目的
、人員背景、訓練
課程方向。



規劃內容

2

依貴公司需求，
規劃課程大綱、
設計教案內容、
安排上課方式及
時間。



課程定案

3

依討論後的內容
調整及修正，並
提供簡易版教材
供確認、再提供
合約書簽約。



課程執行

4

由講師進行課程
訓練，內容包含
教學、上機實作
、案例討論等不
同方式進行。



課程訪談

5

課程結束後，針
對課程規劃或學
習狀況訪談訓練
成效，作為後續
規劃課程參考。

上課對象 ※此課程限鼎新電腦WF/SM/CM客戶報名參加

1. ERP系統重新上線部份流程教學。
2. 上線期需集中標準流程教學。
3. 公司人員異動，需集體重新教育訓練。
4. 公司人員眾多且分佈於各地區。

課程目的

強化使用者對ERP系統架構、流程
、應用之實務流程及管理功能與
內稽內控精神。

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明

詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主





手持勝券 成功在握

增加職場競爭力從ERP證照課程開始

想考ERP證照擔心抓不到重點?心動不如馬上行動....

課程目標

1. 強化對ERP系統架構與企業流程的認識。
2. 熟悉ERP系統之操作、單據建立、報表產生與閱讀...等能力。
3. 對ERP實務應用的流程、管理與內控精神有更深的體認。
4. 考取ERP正式認證。

適合對象

1. 計劃轉職
2. 待業準備
3. 想報考ERP證照
4. 想提升自我競爭力者

課程規劃



▶ 課程洽詢：Tel: (02) 8911-1688 Ext: 1049 Email: elearning@digiwin.com

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明
詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主

