

鼎新 | Workflow ERP iGP

LRP接單裝配生產流程 ATO

課前提醒

1.環境介紹

洗手間/茶水間

2.課程進行方式

本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。

(教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！)

3.課後問卷與測驗

當天課後上網填寫問卷並測驗

學習地圖



系統基礎學習


- 製造實作演練班-生產循環



系統進階應用學習

- LRP接單式生產流程(MTO)
- LRP存貨式生產流程(MTS)
- **LRP接單裝配生產流程(ATO)**
- 預測長交期備料流程
- 進階實戰<<製造情境應用攻略>>

企業營運流程

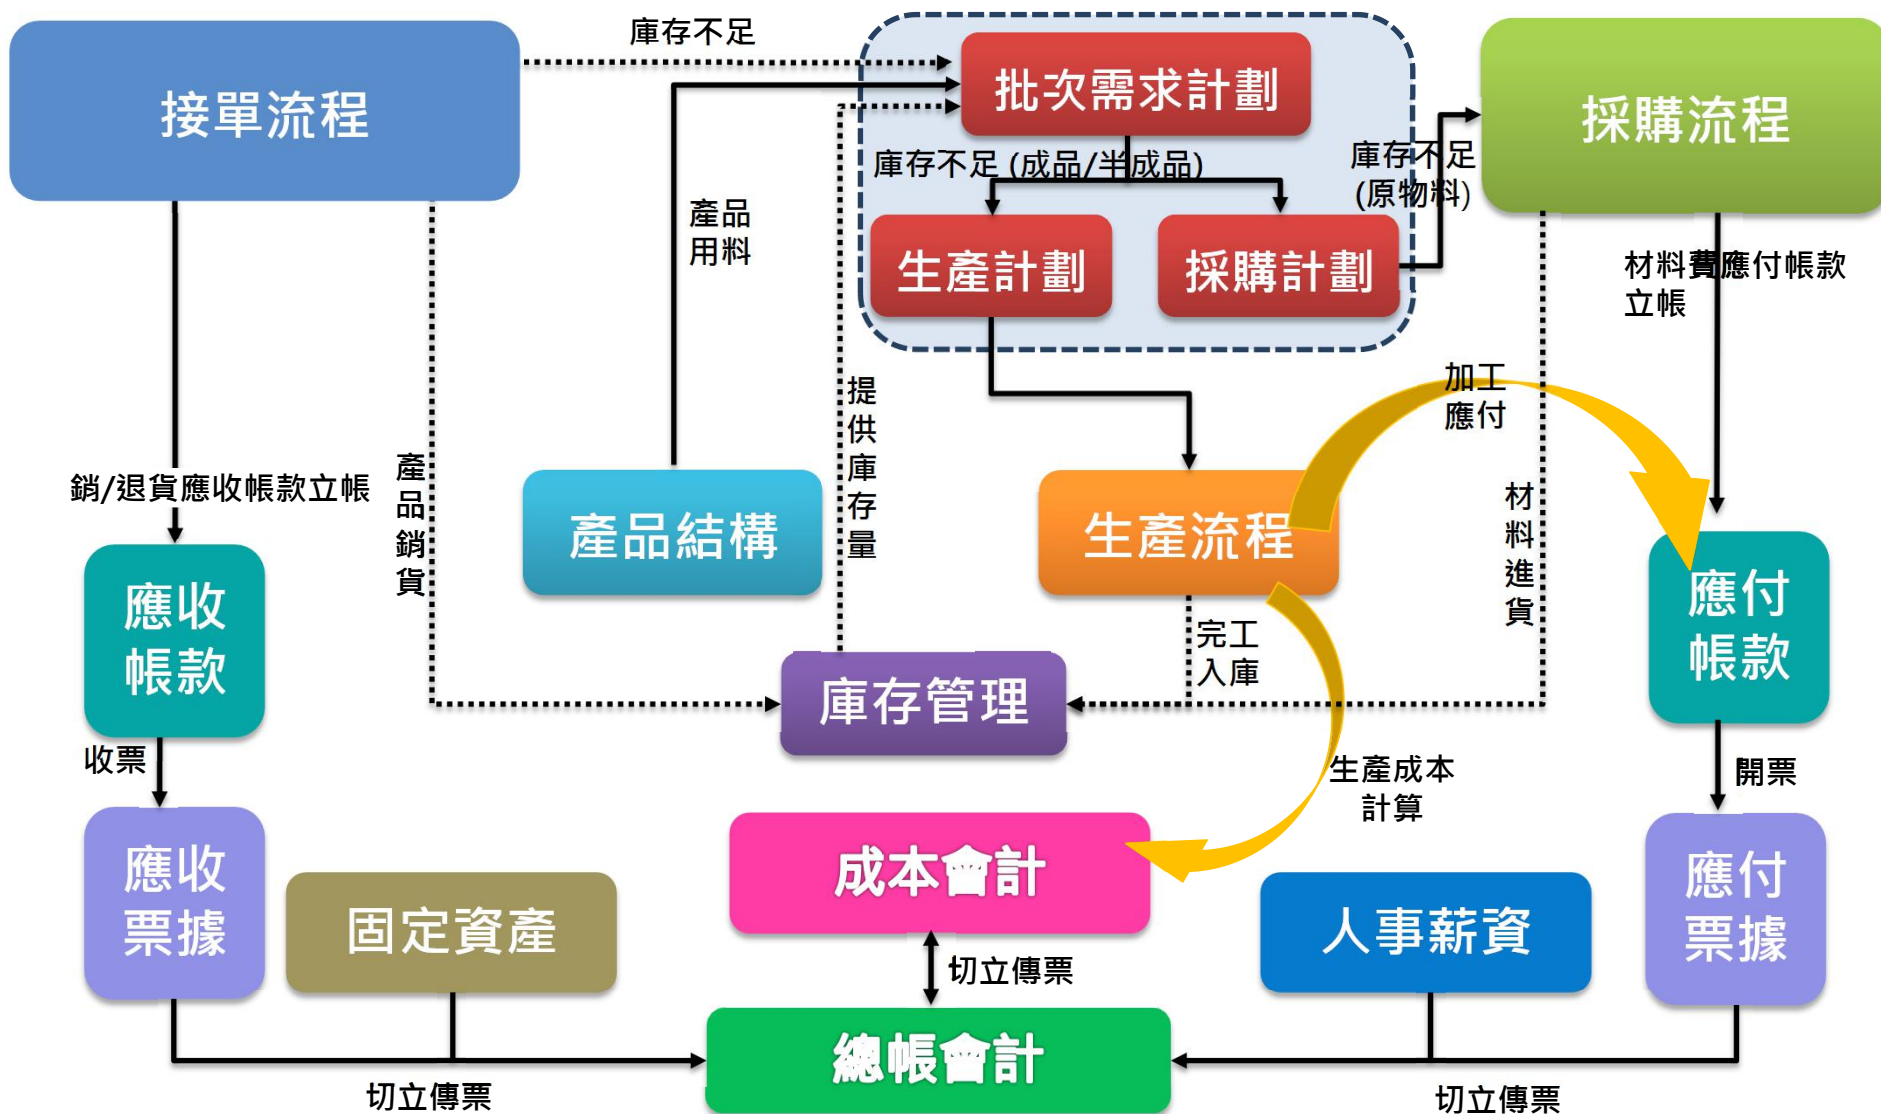

檢視類別 系統+作業別

- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 國區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統
- 海關合同保稅管理系統
- 稅控接口系統
- 廠區生產追蹤系統
- 生產排程規劃系統
- 行動條碼解決方案



課程大綱

一、何謂接單裝配生產(ATO)

二、名解解釋

三、批次需求計畫邏輯說明

休息10分鐘

四、接單裝配生產流程

課

程



課程目標


- 1.清楚LRP名詞解釋
- 2.學會且能自行操作接單裝配生產流程

數位課程


系統別

批次需求計劃系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

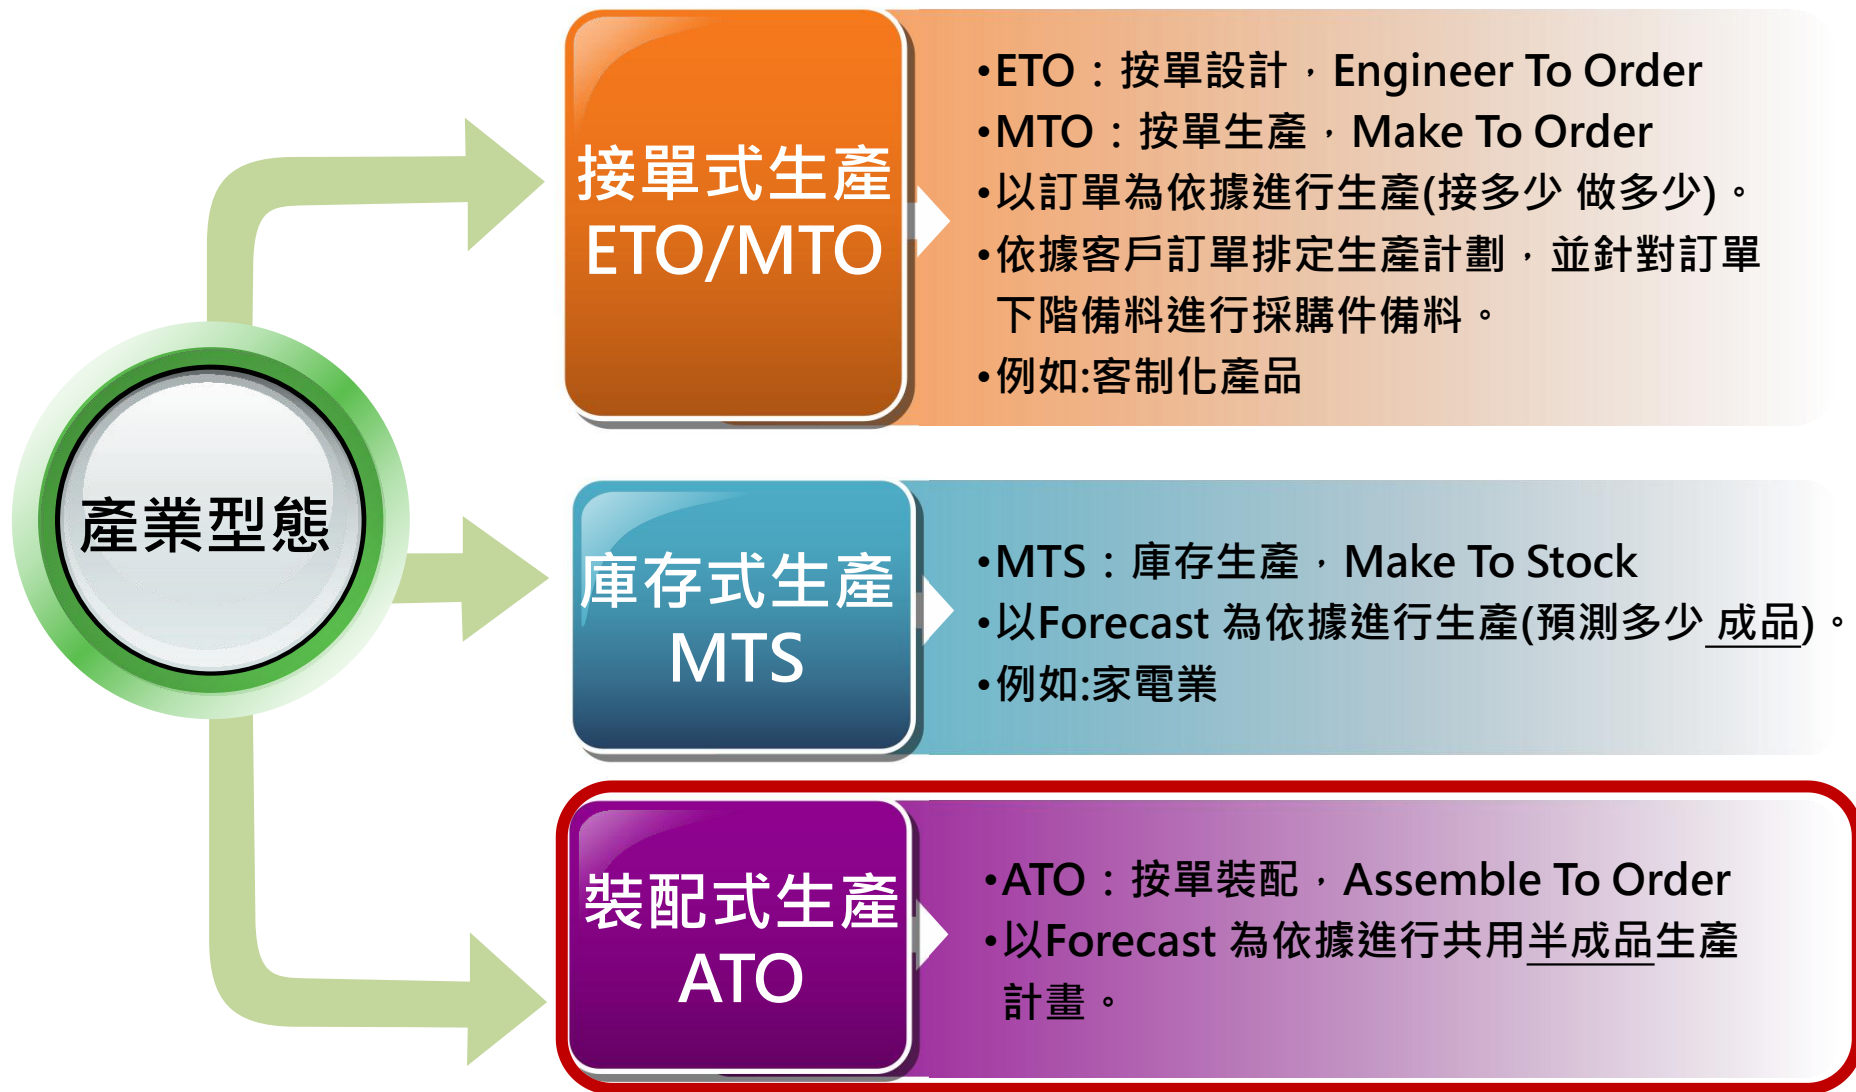


一、何謂接單裝配生產(ATO)?

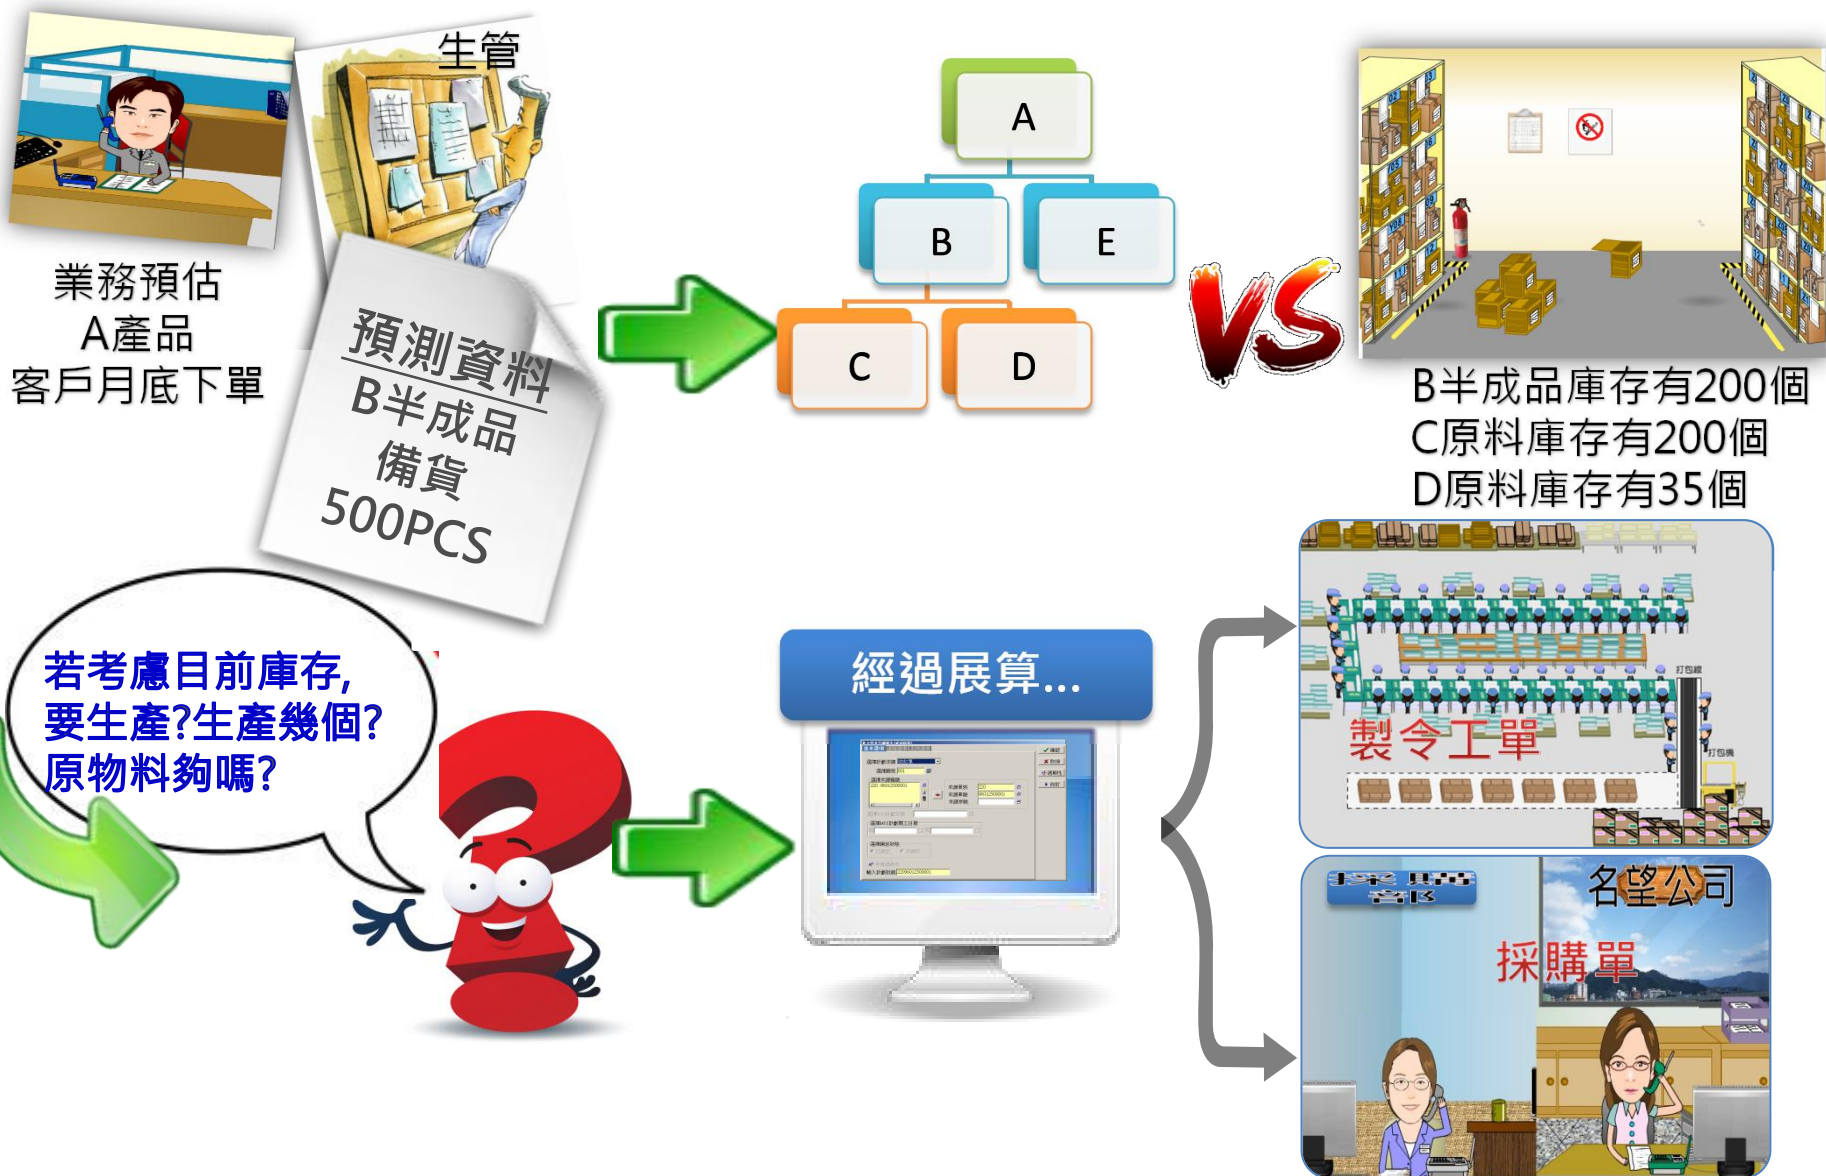


二、名詞解釋

以上述為例，有無考慮庫存量，生產及採購量將有不一樣的結果

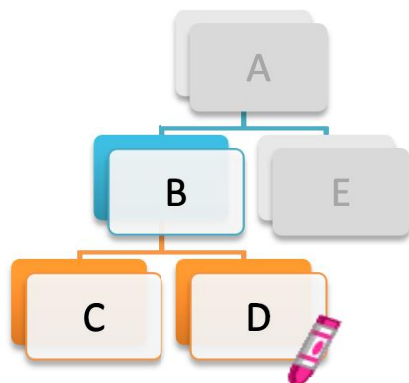

不考慮庫存量

B生產 500個
C.D各採買 500個



B半成品庫存有200個
C原料庫存有200個
D原料庫存有35個

考慮庫存量

B生產 300個
C採買____個
D採買____個

對系統而言...

不考慮庫存量得出的結果稱為「毛需求」

考慮庫存量得出的結果稱為「淨需求」

二、批次需求計畫邏輯說明

毛需求

- 以需求數量為依據，完全**不考慮**「需求品號」的現有庫存量及十大量。
- 直接採實際需求量
- 若不考慮所有庫存量，展算時建議選擇毛需求

淨需求

=

需求類

計劃銷售量
預計銷售量
預計領用量
計劃領用量

供給類

計劃生產量
計劃進貨量
預計生產量
預計進貨量
預計請購量
請拋採未確認量
現有庫存量

淨需求 = 需求(出庫) - 供給(入庫 + 庫存)

淨需求 > 0 ➔ 自製件(M)或託外加工件(S)產生生產計劃
採購件(P)產生採購計劃


十大量	說明	作業位置
計劃銷售量	未達成之銷售預測量 (預測數量 - 已受訂量)	訂單管理系統 \ 銷售預測建立作業
預計銷貨量	未結案訂單之未銷貨量 (訂單數量 + 贈備品量 - 已交數量 - 贈備品已交量)	訂單管理系統 \ 客戶訂單建立作業
計劃領料量	相依需求之需求量 (生產計劃維護上階主件的相依需求數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
預計領料量	未完工製令單身之應領未領料量 (需領用量 - 已領用量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
預計請購量	未更新之請購數量 (請購單已確認，未拋轉成採購單的數量)	採購管理系統 \ 請購單建立作業
預計進貨量	未結案採購單之未進貨量 (採購數量 - 已交數量)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
請拋採 未確認量	請購單已拋轉成採購單但未確認之採購數 (請注意，此種未確認的採購數量，必須要有相對應的「請購資料維護作業」的資料，也就是必須經由請購單來拋轉)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
預計生產量	未完工製令單頭之未生產量 (預計產量 - 已生產量 - 報廢量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
計劃生產量	生產計劃內之預計生產量 (生產計劃檔之生產數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
計劃採購量	採購計劃內之預計採購量 (採購計劃維護採購數量)	批次需求計劃系統 \ 採購計畫維護作業

三、批次需求計畫邏輯說明

預測

品號：A
數量：500PCS
需求日：8/30

BOM用量資料：

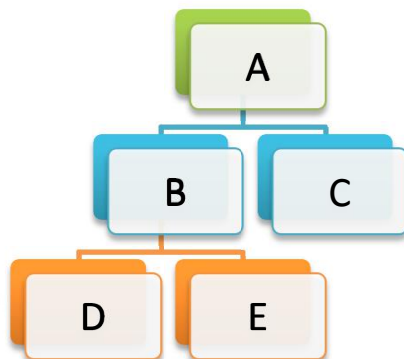

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

工廠行事曆：星期六、日休全天

品號	庫存數量	檢驗天數	固定前置天數	變動前置天數	批量	請填入數量
A	200	1	2	1	100	生產量_____
B	100	1	2	1	100	生產量_____
C	0(8/17預計進貨100PCS)	1	2	1	100	採購量_____
D	300	1	2	1	100	採購量_____
E	200	1	2	1	100	採購量_____

若以淨需求展算，A、B、C、D、E各需要生產或採購幾個？
何時生產/採購？

三、批次需求計畫邏輯說明(A成品)

A成品資料

客戶訂單：數量500PCS,需求日8/30


庫存數量：200PCS

檢驗天數：1天

固定前置天數：2天

變動前置天數：1天

批量：100

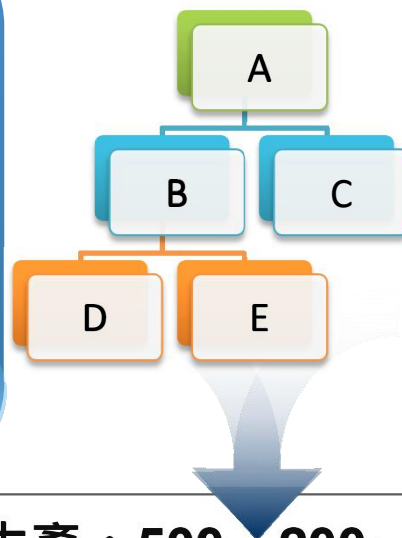

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

量的推算

A 成品計劃生產：500 - 200 = 300 (PCS)

日期的推算

預計完工日：預測需求日(8/30)-入庫天數(1天)-檢驗天數(1天) = 8/28
 生產前置天數 = $\frac{\text{預計產量}}{\text{量批量}} \times \text{變動前置天數} + \text{固定前置天數}$


$$= \left(\frac{300}{100} \times 1 \right) + 2 = 5$$

預計開工日：預計完工日(8/28) - 前置天數(5天) = 8/21

三、批次需求計畫邏輯說明(B原料)

B-材料

相依需求：300PCS
 庫存數量：100PCS
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

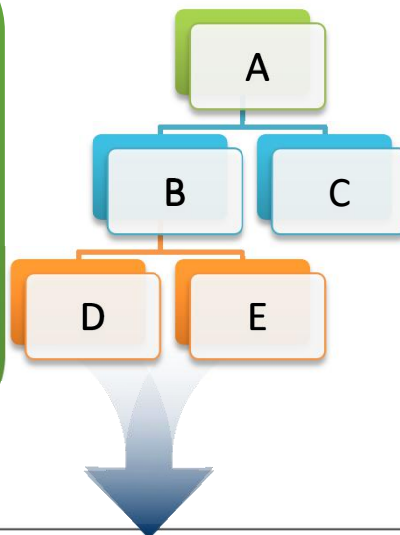

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

量的推算

A 成品計畫生產：300 (PCS)→ 需要 B 半成品 300PCS
 →B 半成品計畫生產：300 - 100 = 200 PCS

日期的推算

B 半成品的預計領料日=上階 A 成品開工日(8/21)

B 半成品的預計完工日= 預計領料日(8/21) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 8/19

生產前置天數 = (預計產量/批量×變動前置天數) + 固定前置天數
 = (200/100× 1) + 2 = 4

預計開工日 = 預計完工日(8/19) - 前置天數(4天) = 8/13

三、批次需求計畫邏輯說明(C原料)

C-材料

相依需求：300PCS

庫存數量：0


檢驗天數：1天

固定前置天數：2天

變動前置天數：1天

批量：100

預計進貨量：100

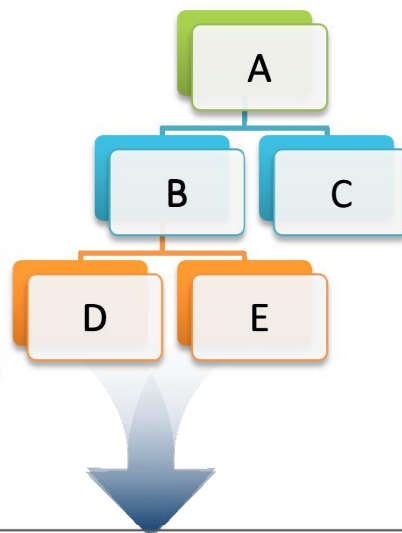

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

量的推算

A 成品計劃生產：300 (PCS)→ 需要 C 原料 300PCS

→C 原料計劃採購：300 - 100(預計進貨量) = 200 PCS

日期的推算

C 原料的預計領料日=上階 A 成品開工日(8/21)

C 原料的預計交貨日= 預計領料日(8/21) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 8/19


採購前置天數 = (預計採購量/批量×變動前置天數) + 固定前置天數
 = (200/100× 1) + 2 = 4

預計採購日 = 預計交貨日(8/19) - 前置天數(4天) = 8/13

三、批次需求計畫邏輯說明(D原料)

D-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：300
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

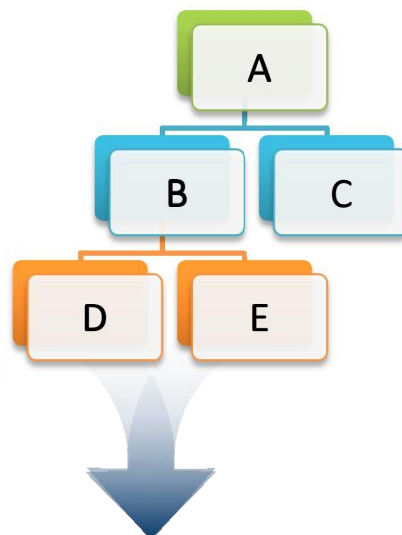

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS)→ 需要 D 原料 200PCS
 →D 原料計劃採購：200-300(庫存量)=-100
 淨需求 < 0 ， 因此不用採買


日期的推算



三、批次需求計畫邏輯說明(E原料)

E-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：200
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

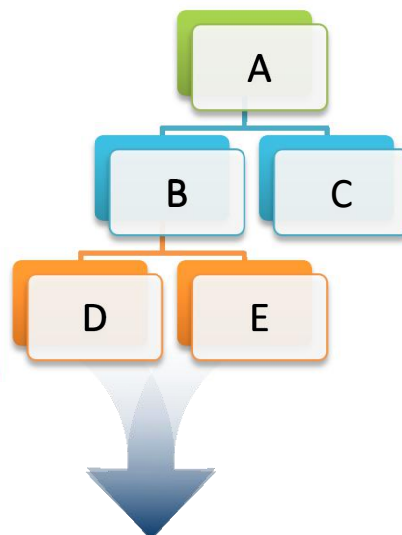

2019年8月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS)→ 需要 E 原料 200PCS
 →E 原料計劃採購：200(庫存量)-200=0
 淨需求 =0 ， 因此不用採買

日期的推算






批次需求計劃執行前置作業


順序	系統別	對應作業	必要性
1	基本資料管理系統	廠別資料建立	✓
2		庫別資料建立	✓
3		生產線資料建立	✓
4		職務類別建立	Δ
5		行事曆建立	✓
6	庫存管理系統	品號資料建立作業	✓
7	產品結構系統	BOM用量資料建立	✓
8	批次需求計劃系統	批次計劃設定檔	✓

註：Δ表示建議維護
✓表示一定要先維護

四、接單裝配生產流程

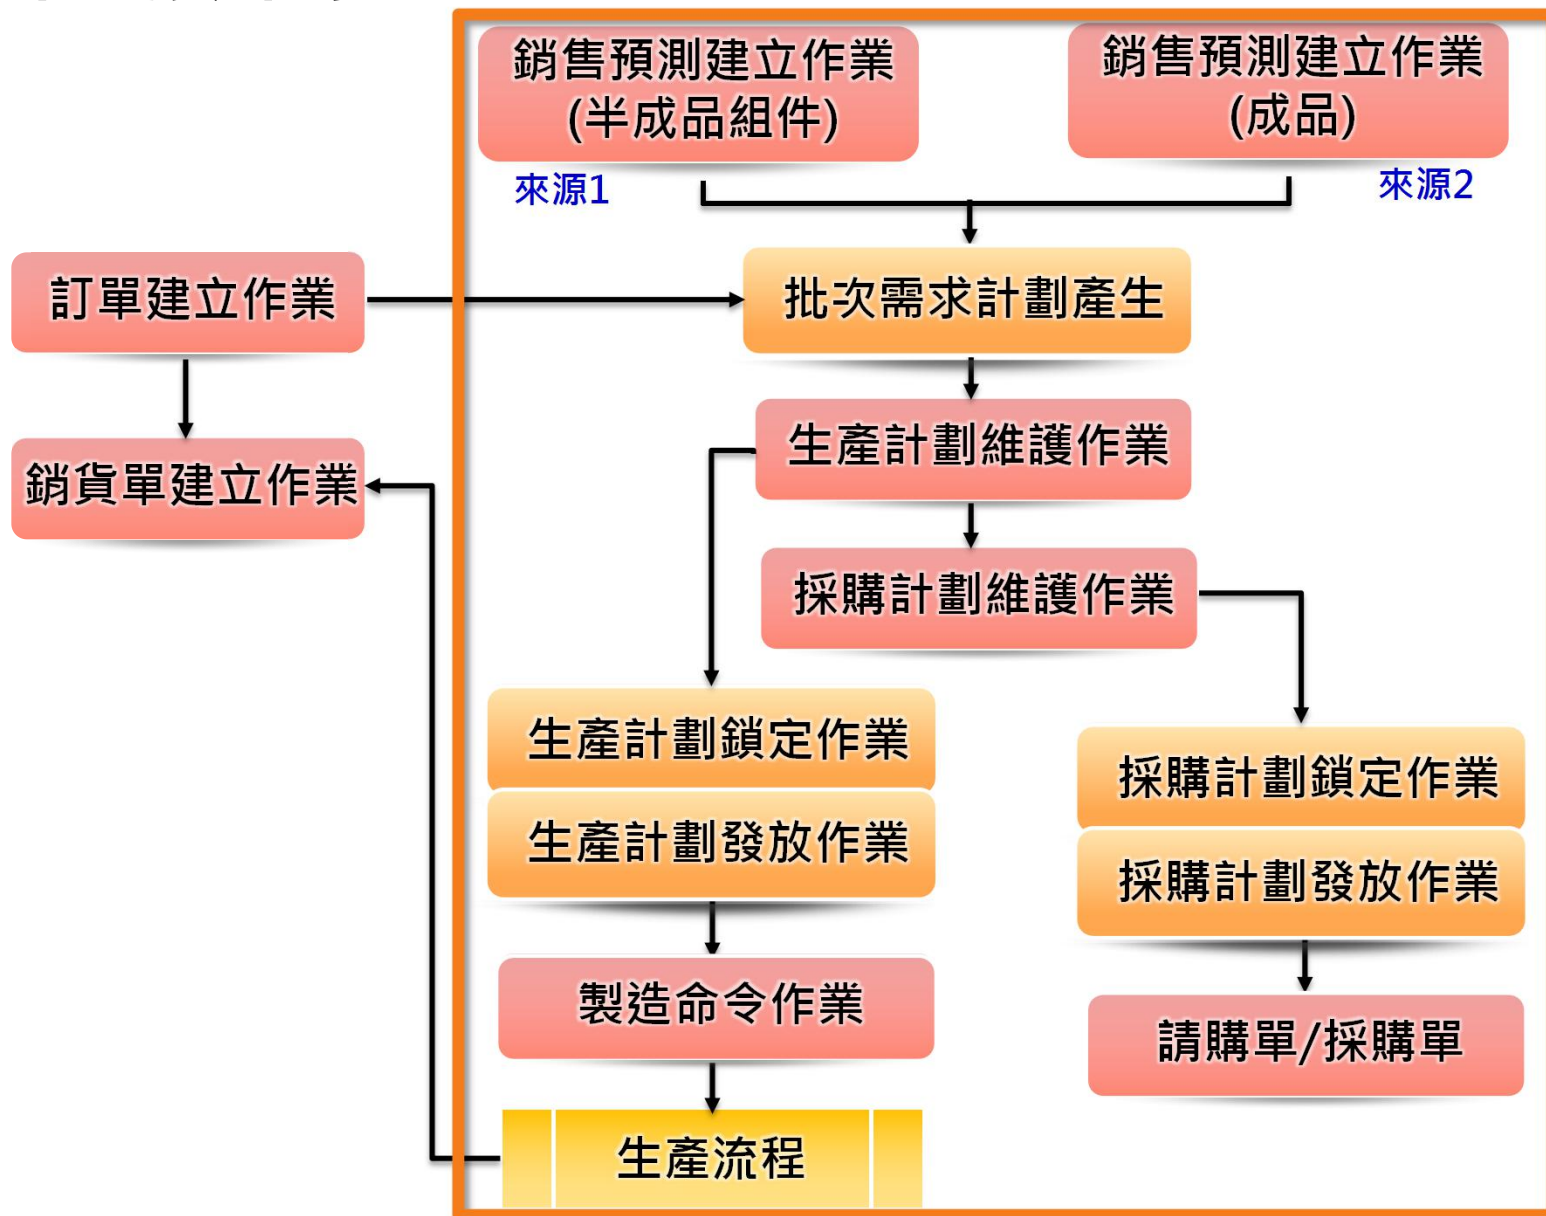

四、接單裝配生產流程

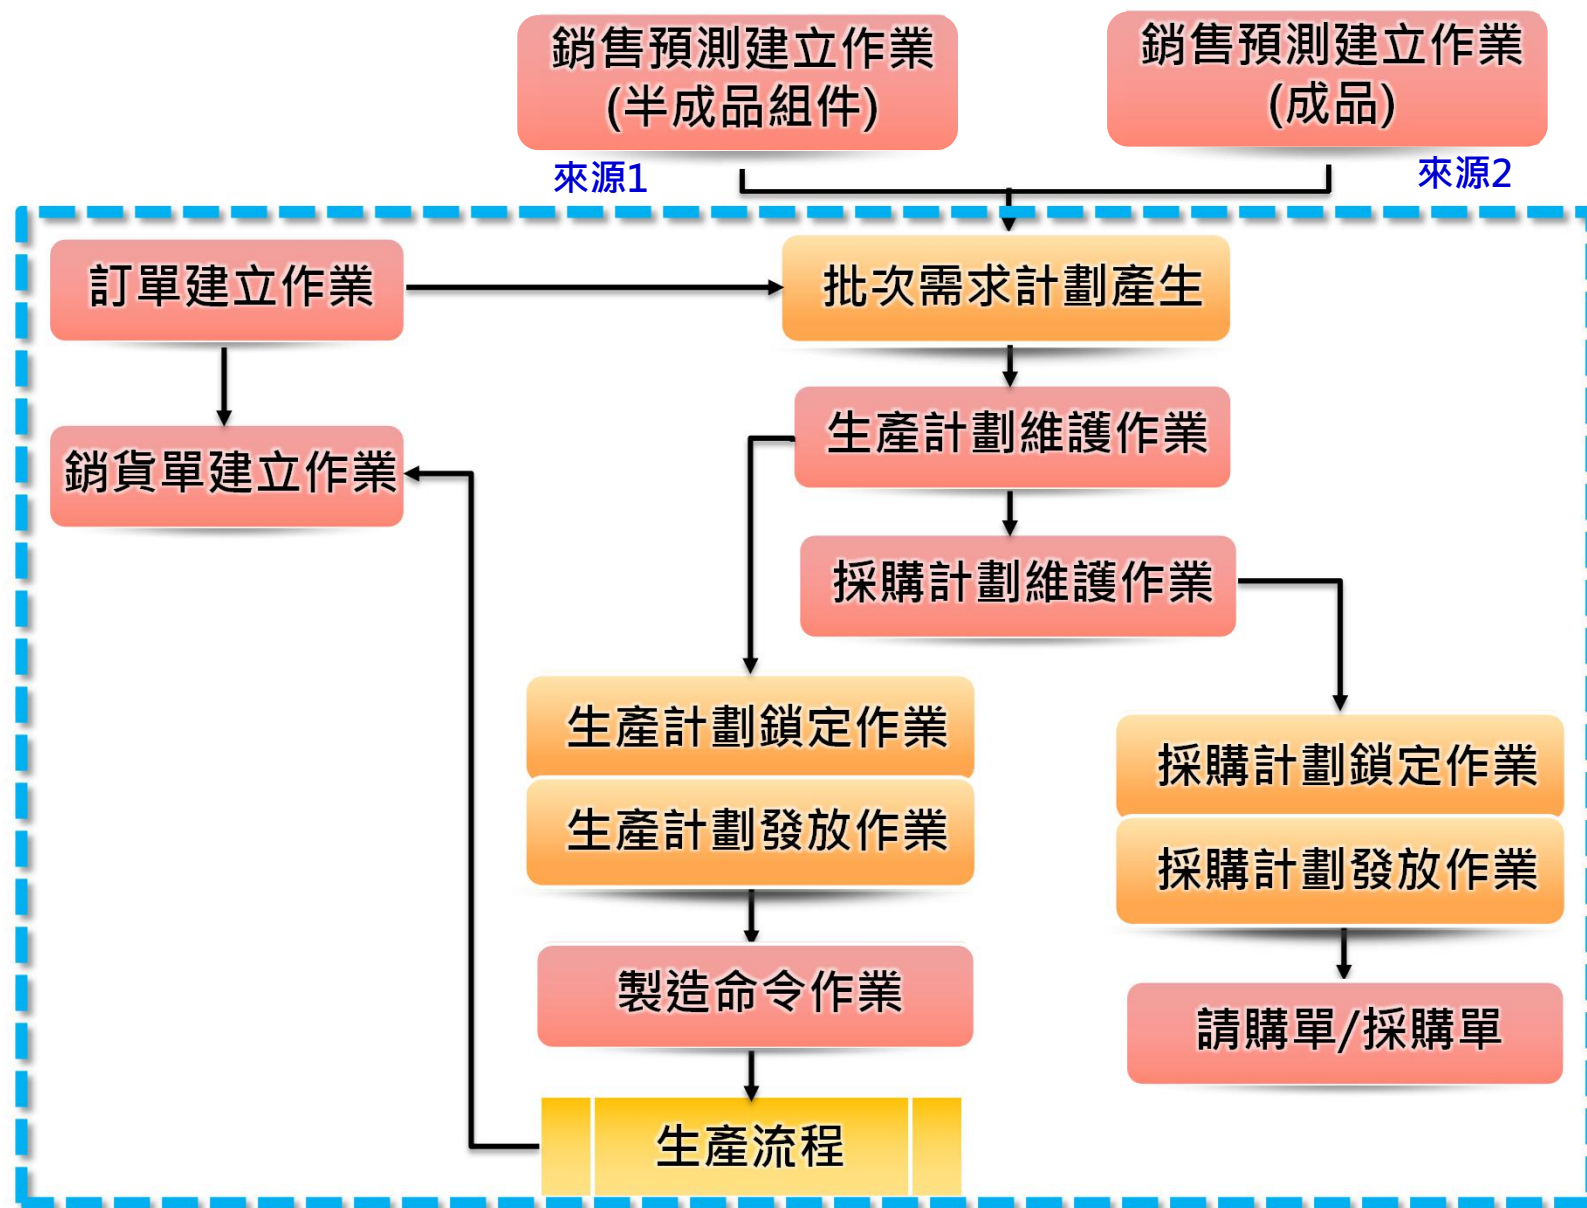

接單裝配生產案例-成功企業公司背景

主要營業項目是數位相機及相關產品，

除了銷售自行生產：

數位相機-SL系列/SV系列/GT系列、


數位相機-大眾型、

數位相機-簡易型...等產品，

另外也有提供客戶數位相機 - 高手玩家型、
專業型及自動對焦數位相機...等外購商品。



四、接單裝配生產案例

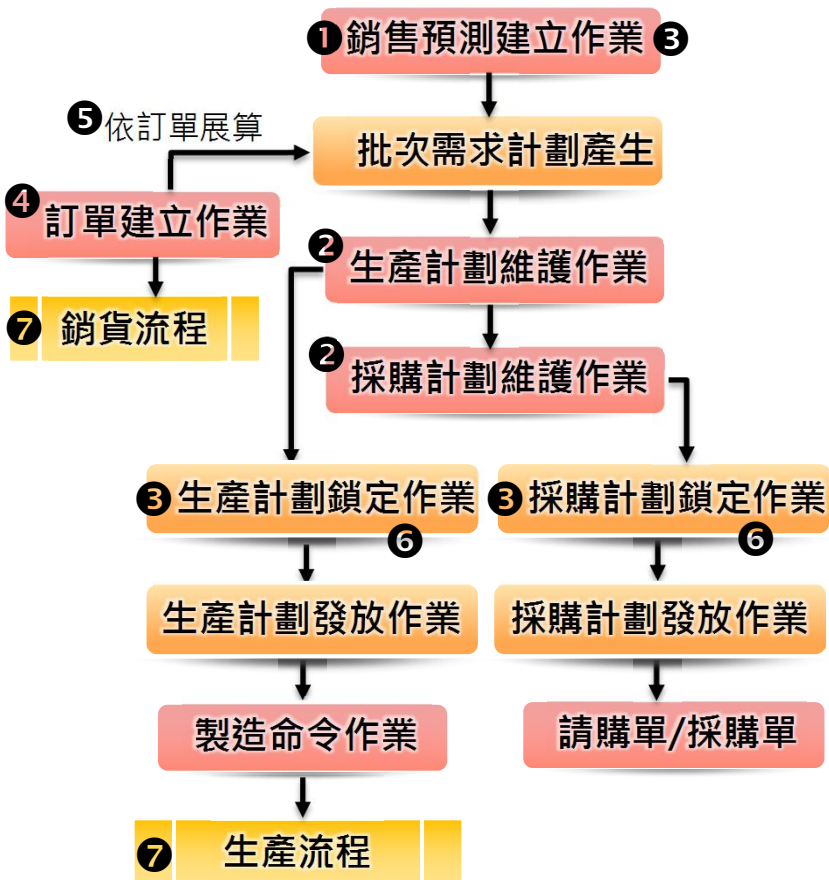

接單裝配生產計劃流程

1.	因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用(生管擬定銷售預測)。
2.	生管檢視計劃內容後，決議將半成品組件各多生產50組當庫存品。
3.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後將半成品進行生產/採購計劃鎖定與發放，並將銷售預測取消納入生產計劃(或指定結案)。
4.	客戶-環球公司於本月25日向業務人員訂購「430002數位相機GT系列」500台,要求月底出貨。
5.	生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
6.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
7.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備貨並出貨給客戶。

品號基本資料&BOM用量


品號	品名	品號屬性	補貨政策	前置天數	檢驗天數	庫存量
430002	數位相機-GT系列	M	L	2	1	30
320015	PCBA-Assembly Main-GT	M	L	3	0	20
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	S	L	3	0	10
390003	相機包材組-GT	Y	R	0	0	0
150015	雷射防偽貼紙 GT系列	P	R	1	0	2000
190025	使用手冊-GT版	P	L	3	0	450
190030	驅動&影像軟體光碟-GT	P	L	3	0	800

品號屬性：


M：自製件
S：託外加工件
P：採購件
Y：虛設件

補貨政策：

L：依LRP需求
R：依補貨點

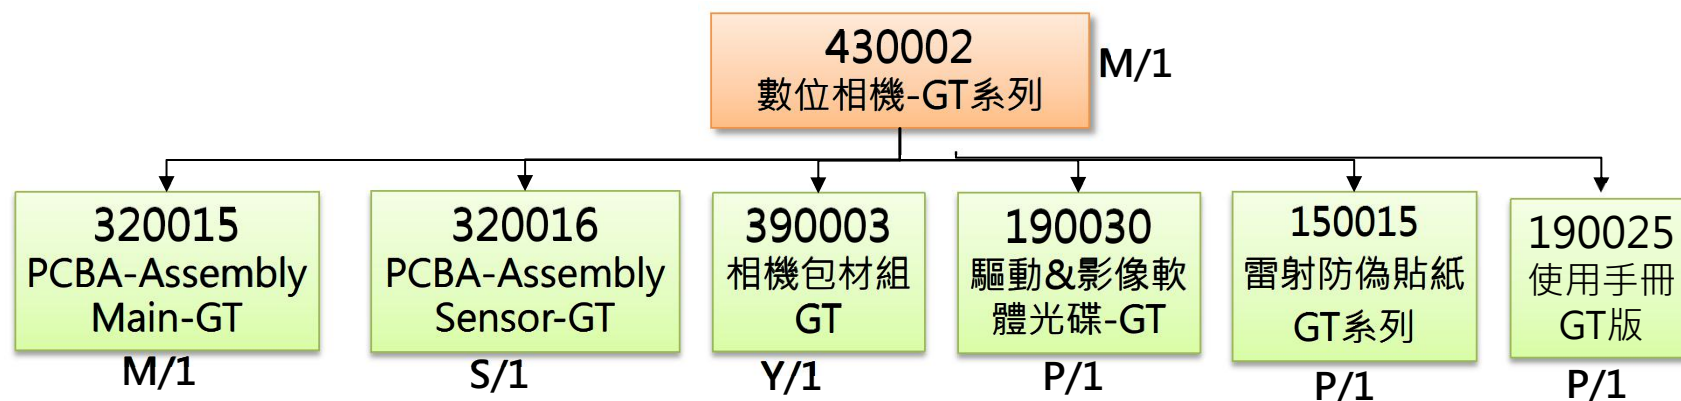

四、接單裝配生產案例

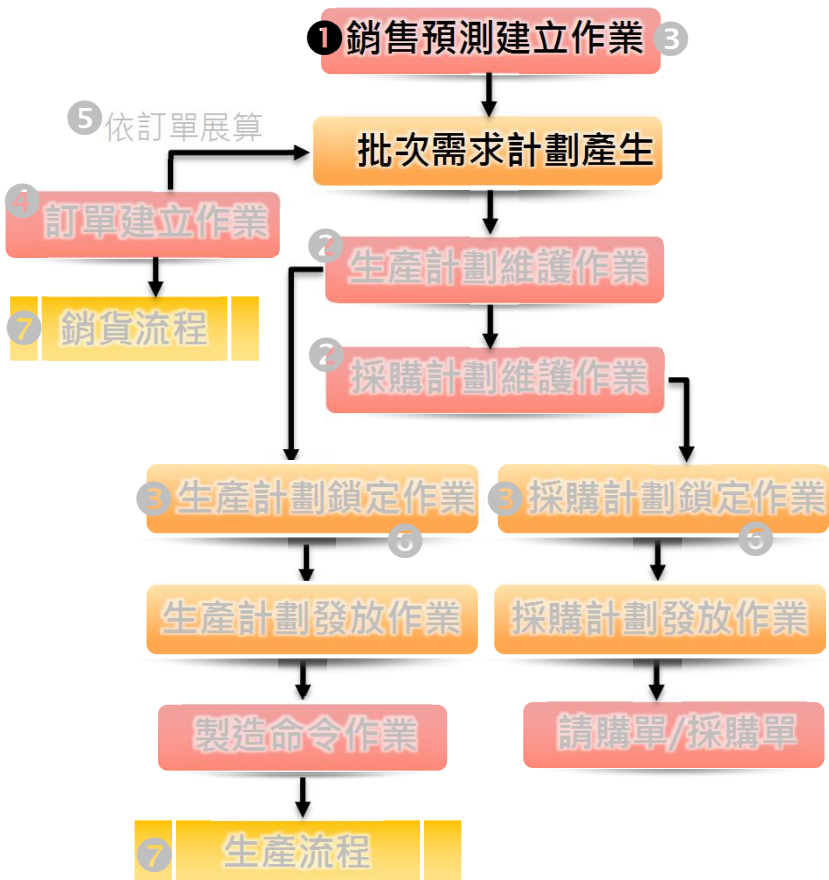

接單裝配生產計劃流程

1.	因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用(生管擬定銷售預測)。
2.	生管檢視計劃內容後，決議將半成品組件各多生產50組當庫存品。
3.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後將半成品進行生產/採購計劃鎖定與發放，並將銷售預測取消納入生產計劃(或指定結案)。
4.	客戶-環球公司於本月25日向業務人員訂購「430002數位相機GT系列」500台,要求月底出貨。
5.	生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
6.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
7.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備貨並出貨給客戶。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



詳細欄位 資料瀏覽

預測代號 20190801

通路

客戶代號

型態

部門

地區

業務員

國家

☒ 納入生產計劃

路線

備註

廠別 001 台北廠

其他

來源：
銷售預測建立作業

序號	品號	品名	規格	日期	預測庫	庫別名稱	預測數量	已受訂量	單位	幣別	單價	預測金額	結案碼	優先順序	鎖定交期	備註
0001	320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_ATO	2019/08/21	1B	半成品倉	500	0	ea	NTD	0	0	N:未結案	00010	☐	...
0002	320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_ATO	2019/08/21	1B	半成品倉	500	0	ea	NTD	0	0	N:未結案	00010	☐	...

擬定半成品組件的銷售預測資料，
並勾選「納入生產計劃」，列入
批次需求計算。

動手做做看!

銷售預測建立作業

案例操作：
請將當月銷售預測資料查詢出來後將
『納入生產計劃』勾選。

銷售預測建立作業(COPI04)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

資料瀏覽

詳細欄位 資料瀏覽

預測代號 20190801 通路

客戶代號 型態

部門 地區

業務員 國家

☒ 納入生產計劃 路線

備註 其他

廠別 001 台北廠

序號	品號	品名	規格	日期	預測庫	庫別名稱	預測數量	已受訂量	單位	幣別	單價	預測金額	結案碼	優先順序	鎖定交期	備註
0001	320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_ATO	2019/08/21	1B	半成品倉	500	0	ea	NTD	0	0	N未結案	00010	☐	...
0002	320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_ATO	2019/08/21	1B	半成品倉	500	0	ea	NTD	0	0	N未結案	00010	☐	...

瀏覽 單身資料筆數: 2 320015 PCBA-Assembly Main-GT 127.0.0.1 - 211

步驟一：低階碼計算更新

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 基礎速查

待辦 通知 警告 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視 群組命名 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 系統+作業別

系統+作業別

- 主系統架構圖
- 電子表單工作區
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
 - 基本資料管理
 - 日常異動處理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 料件用量資料複製作業
 - 元件資料整批修改作業
 - 失效元件整批刪除作業
 - 元件序號重排
 - 低階碼計算更新作業**
 - 標準成本計算更新作業
 - BOM 自動請購作業產生

產品結構管理系統

低階碼計算更新作業 (BOMB05) [成功科技]

基本選項 系統選項

選擇主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

確認

取消

週期性

低階碼計算更新作業

標準成本計算更新作業

品號基本資料
庫存管理系統
異動單據建立

訂單管理系統
客戶訂單/銷貨單

作業位置：產品結構管理系統 \ 批次作業 \ 低階碼計算更新
系統依品號低階碼的順序，展算批次需求計劃之『生產計劃』
及『採購計劃』。

步驟二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警告 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

群組命名

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

批次需求計劃產生

生產計劃鎖定

批次計劃清除

生產計劃發放

採購計劃鎖定

採購計劃發放

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

產品序號管理系統

e-B Online 連結系統

E-BOM試產管理系統

我的ERP

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生 (LRPB01) [成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

1 選擇計劃依據 銷售預測

選擇廠別 001

僅顯示未拋轉單據

2 選擇來源編號

****20190801

來源單別 ****

來源單號 20190801

來源序號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起 迄

選擇鎖定狀態

已鎖定

考慮損耗率

3 輸入計劃批號 20190801

依據銷售預測為計劃來源

預設來源預測代號為 生產/採購計劃批號

確認

取消

週期性

步驟二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視 群組命名 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理 資料維護管理 清單與明細表 報表列印 批次作業

批次需求計劃產生 生產計劃鎖定 批次計劃清除 生產計劃發放 採購計劃鎖定 採購計劃發放

主生產排程系統 物料需求計劃系統 成本計算管理系統 固定資產管理系統 營業稅申報系統 品質管理系統 保稅管理系統 多角貿易管理系統 Fax/Email處理系統 園區保稅管理系統 零用金管理系統 模具管理系統 合併財報管理系統 標準成本計算管理系統 產品序號管理系統 e-B Online 連結系統 E-BOM試產管理系統

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生 (LRPB01) [成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

4 批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature件依比率計算

☐ Option件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

5 ☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☐ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☐ 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別 ☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

確認 取消 週期性

我的ERP

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

重點說明

◆ 批次需求計算方式：淨需求、毛需求。

(1) 選擇毛需求，則以原需求數量展BOM算出生產/採購。

(2) 選擇淨需求，以(需求數量 - 庫存可用量)的結果展BOM，計算出生產/採購量，且只補足該批**最大補量**。

註：

最大補量概念：採淨需求計算時，計算出來的需求數量不可 > 採毛需求計算出來的數量，最多只可與毛需求的數量相等。

例如訂單需求100PCS，現有庫存量20PCS，安全存量設定為30PCS，理論上總需求為110PCS，採淨需求計算時，計算出來的需求只有100PCS，不可大於毛需求的數量。

步驟二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

群組命名

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

批次需求計劃產生

生產計劃鎖定

批次計劃清除

生產計劃發放

採購計劃鎖定

採購計劃發放

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

產品序號管理系統

e-B Online 連結系統

E-BOM試產管理系統

我的ERP

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式

淨需求

毛需求

Feature件依比率計算

Option件依比率計算

考慮庫存可用量

考慮安全存量

採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

6 供給量日期納入考慮

供給量截止日

需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

來源庫別

主要庫別

產生不需補充之料件

拋 BOM 單頭備註

拋 BOM 單身備註

客戶供料計算

不發料計算

考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

重點說明


◆ 供給量日期/需求量日期納入考慮:

計算可用量時，若預計供給或需求的日期，晚於該批的需求日，是否要納入可用量計算？

☑ 表示在「考慮」日期因素下，料件需求日期之後的需求量/供給量「不納入」計算。

※ 表示在「考慮」日期因素下，料件需求日期之後的需求量/供給量「納入」計算。

批次需求截點

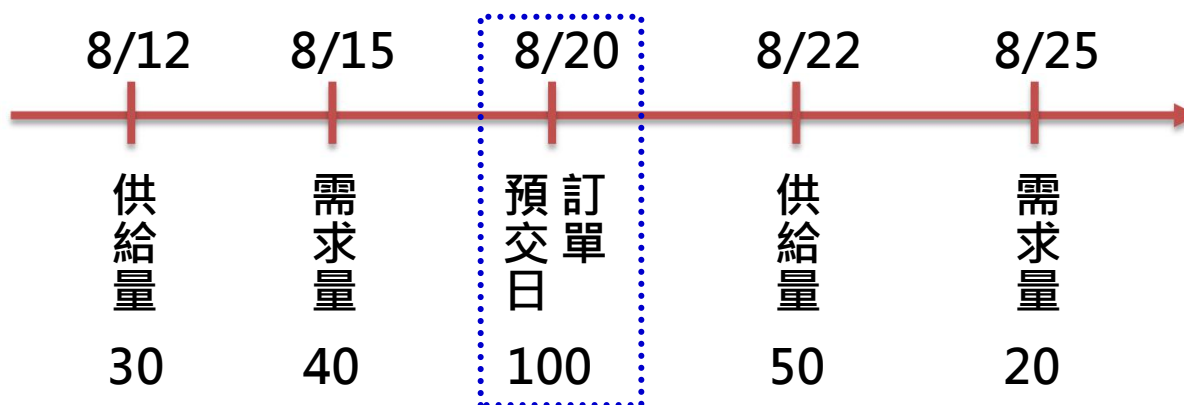


重點說明



執行「淨需求」時，

- ✓ 供給量日期納入考慮
 - ✓ 需求量日期納入考慮
- 選項的意義？

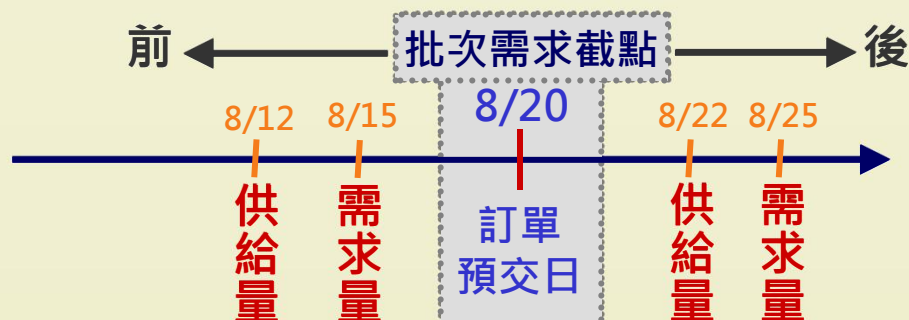

1

- ☐ 供給量日期納入考慮
- ☐ 需求量日期納入考慮

零庫存

特點：達供需平衡的水準。

缺點：如果截點後的供應來不及提前，就會有斷料風險。

2

- ✓ ☒ 供給量日期納入考慮
- ☐ 需求量日期納入考慮

特點：截點後的需求可提前備貨。

缺點：若提前備貨的需求被取消時，將造成閒置庫存增加。
如果只有購買LRP建議用此項設定

3

- ☐ 供給量日期納入考慮
- ✓ ☒ 需求量日期納入考慮

特點：計劃截點後的供給，可提前供應此次的需求。

缺點：若供給未如預期在需求截點前補齊時，將有斷料風險。

4

- ✓ ☒ 供給量日期納入考慮
- ✓ ☒ 需求量日期納入考慮

插單型

特點：只考慮需求截點時的供需，適合接單式生產，或針對插單的訂單做計劃。

缺點：未來若有大批量入出，庫存量可能激增，或備貨不及。
同時有購買MRP/LRP建議此設定

步驟二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視 群組命名 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理 資料維護管理 清單與明細表 報表列印 批次作業

批次需求計劃產生 生產計劃鎖定 批次計劃清除 生產計劃發放 採購計劃鎖定 採購計劃發放

主生產排程系統 物料需求計劃系統 成本計算管理系統 固定資產管理系統 營業稅申報系統 品質管理系統 保稅管理系統 多角貿易管理系統 Fax/Email處理系統 園區保稅管理系統 零用金管理系統 模具管理系統 合併財報管理系統 標準成本計算管理系統 產品序號管理系統 e-B Online 連結系統 E-BOM試產管理系統

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生 (LRPB01) [成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式

淨需求 毛需求

Feature件依比率計算 Option件依比率計算 考慮庫存可用量

考慮安全存量 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量 供給量日期納入考慮 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃 全部

對於已發放料件之補充方式 重新補充

寫入主階件維護檔的庫別 來源庫別 主要庫別

產生不需補充之料件 拋 BOM 單頭備註 拋 BOM 單身備註 客戶供料計算 不發料計算 考慮主要領料庫別

確認 取消 週期性

我的ERP

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

重點說明

◆選擇需產生之計劃：可選擇「生產計劃」、「採購計劃」或「全部」。

- (1)建議**第一次執行計劃產生**時，選擇「**全部**」（產生**生產計劃及採購計劃**）；或是選擇「**生產計劃**」，執行完後再以產生出來之生產計劃為來源，選擇「**採購計劃**」來產生採購計劃。
- (2)**第一次產生計劃時，不可以直接選「採購計劃」**，因為系統是依生產計劃的內容來產生採購計劃。
- (3)「品號資料建立作業」之品號屬性若為：
M(自製件)或**S**(託外加工件)→產生**生產計劃**；
P(採購件)→產生**採購計劃**。

◆已發放料件補充方式：選擇**毛需求**計算方式才會啟用。

例如：訂單需求數量100，採毛需求計算並已發放製令單與採購單，後續因訂單變更追加數量為150，原訂單再次執行批次需求計劃產生時可選擇「不再補充」、「重新補充」或「補充差額」。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護



系統產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	480	ea	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠內製令單
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	490	ea	2019/08/15	...	2019/08/15	511	託外製令單

①

②

③

④

⑤

➤ 完工日 = 計劃來源之(需求日-檢驗天數-1)

➤ 開工日 = 完工日-生產前置天數

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護

系統
產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列 /	2019/08/20		1B	半成品倉	480	ea	2019/08/15		2019/08/15	510	廠內製令單
320016	... PCBA-Assembly S					半成品倉	490	ea	2019/08/15		2019/08/15	511	託外製令單

庫存量	10.000
安全存量	0.000
預計進貨	0.000
預計請購	0.000
請拋採未確認	0.000
預計生產	0.000
預計銷售	0.000
預計領用	0.000
計劃採購	0.000
計劃生產	0.000
計劃銷售	500.000
計劃領用	0.000
毛需求量	500.000
已發放量	0.000

原始需求量

發放過的計劃批號，重新產生時，顯示上次已發放量供參考。

確定

取消

批次生產計劃維護-依品號

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護

系統
產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購限制日期	備註
510	廠內製令單				0000:00:00		0	☐	4:銷售預測	****	20190801	0001		
511	託外製令單	3004	訊達公司		0000:00:00	NTD	200	☐	4:銷售預	****	20190801	0002		

6

7

8

- 預設「BOM用量資料建立作業」的「製令單別」，可修改。
生產計劃依此單別發放成製令單。
- 生產品號屬性為「M:自製件」，預設品號資料的「生產線別」。
- 生產品號屬性為「S:託外加工件」，預設品號資料的「主供應商」
及預設加工計價資料的最新「加工單價」。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護

系統
產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購限制日期	備註
510	廠內製令單				0000:00:00		0	☐	4:銷售預測	****	20190801	0001		
511	託外製令單	3004	訊達公司		0000:00:00 NTD		200	☐	4:銷售預	****	20190801	0002		

9

10

- 若生管人員檢視此生產計劃無誤，勾選鎖定以利辨識與發放製令。
- 可追溯此生產計劃的來源依據(如：銷售預測、訂單...)。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟三：檢視批次生產計劃維護

系統
產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	480	ea	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠內製令單
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	490	ea	2019/08/15	...	2019/08/15	511	託外製令單

批次生產計劃維護-依品號

材料品號	品名	規格	需領用量	單位	預計領料日	庫別	庫別名稱	製程順序	材料型態	取替代件	被取替代品號	備註	優先順序
173001	主開關連	GT_ATO	480	pcs	2019/08/15	1C	原料倉	****	1.直接材料		173001		
173002	模式按鈕	GT_ATO	480	pcs	2019/08/15	1C	原料倉	****	1.直接材料		173002		
173003	塑膠前蓋	GT_ATO	480	pcs	2019/08/15	1C	原料倉	****	1.直接材料		173003		
173004	塑膠後蓋	GT_ATO	480	pcs	2019/08/15	1C	原料倉	****	1.直接材料		173004		
173011	金屬Logo	GT_ATO	480	pcs	2019/08/15	1C	原料倉	****	1.直接材料		173011		
173012	鍍銀螺絲	GT_ATO	3,840	pcs	2019/08/15	1C	原料倉	****	1.直接材料		173012		
173014	LCD窗-GT	GT_ATO	480	pcs	2019/08/15	1C	原料倉	****	1.直接材料		173014		

批次生產計劃維護-依品號

11

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟四：檢視批次採購計劃維護



系統產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	來源單別	來源單號	來源序號	製造商
173009	變壓器-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	140	pcs	2019/08/14	NTD	100	☐	****	20190801	0002	...
173011	金屬Logo-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	180	pcs	2019/08/14	NTD	60	☐	****	20190801	0001	...
173014	LCD窗-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	230	pcs	2019/08/14	NTD	500	☐	****	20190801	0001	...

①

②

③

➤ 根據生產計劃的相依領料需求推算。

交貨日 = 預計領料日 - 檢驗天數 - 1

➤ 採購廠商，預設品號資料的「主供應商」。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟四：檢視批次採購計劃維護

系統產生

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	來源單別	來源單號	來源序號	製造商
173009	變壓器-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	140	pcs	2019/08/14	NTD	100	☐	****	20190801	0002	...
173011	金屬Logo-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	180	pcs	2019/08/14	NTD	60	☐	****	20190801	0001	...
173014	LCD窗-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	230	pcs	2019/08/14	NTD	500	☐	****	20190801	0001	...

4

5

6

➤ 採購日 = 交貨日 - 採購前置天數

• 「批次需求計算方式」 = 毛需求，採購數量 = 毛需求量

• 「批次需求計算方式」 = 淨需求，採購數量 = 毛需求量 - 庫存可用量

動手做做看!

批次需求計劃產生

因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用。

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 20190801 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製令名稱
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_f	2019/08/20		1B	半成品倉	480	ea	2019/08/15		2019/08/15	510	廠內製令單
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_f	2019/08/20		1B	半成品倉	490	ea	2019/08/15		2019/08/15	511	託外製令單

批次採購計劃維護-依品號(LRPI03)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 20190801 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	來源單別	來源單號	來源序號	製造商
173009	變壓器-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	140	pcs	2019/08/14	NTD	100		****	20190801	0002	
173011	金屬Logo-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	180	pcs	2019/08/14	NTD	60		****	20190801	0001	
173014	LCD窗-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	230	pcs	2019/08/14	NTD	500		****	20190801	0001	

批次生產計劃維護-依品號

修改 單身資料筆數: 2 320016 PCBA-Assembly Sensor-GT



建議

➤ 補貨備料規劃:

- 通用性材料、常態性用料或較易取得的材料，可運用「**品號再補貨建議表**」、「**製令需求檢視表**」進行備料。(補貨政策 R)
- 成本高或取得較不容易(交期長)的料件，利用「**批次需求計算方式**」進行備料。(補貨政策 L)

報表應用-生產線負荷明細表

 **使用時機：**對於已經發放的正式製造命令或仍在計劃中之生產計劃，想瞭解其對生產線所造成之負荷情形，可利用此報表預估後續生產時所需耗費人時、機時，可作為估計生產進度用，藉以評估生產計劃之可行性，並做為調整生產計劃或調整產能之依據。

 **作業位置：**批次需求計劃系統 \ 報表列印 \ 生產線負荷明細表

生產線負荷明細表(LRPR07)[成功科技]

基本選項

註記/審核

系統選項

選擇廠別

選擇生產線別

區間選擇

選擇日期

起 2019/08/01

迄 2019/08/31

選擇生產負荷來源

☒ 製造命令

人時機時來源:

☒ 製令製程(當無製程時,取產品途程)

☐ 產品途程

☒ 生產計劃

確認

取消

週期性

即時報表



關於

第 1 頁

報表應用-品號供需明細表

 **使用時機：**可依品號及截止時點列印現有庫存及在未來一段期間裡預計會異動的「十大量明細資料」的數量，以掌握各料件未來的供需狀況及在未來各時點的預計庫存結餘情形，亦可作為「產能變動」分析借調料可行性的參考依據。同時，可以檢視庫存是否有過多或過少的現象或判斷製造命令、生產計劃、採購單或採購計劃是否有不妥之處。

 **作業位置：**批次需求計劃系統 \ 報表列印 \ 品號供需明細表

品號供需明細表(LRPR05)[成功科技]
品號供需明細表(LRPR05)[成功科技]

基本選項 | 進階選項 | 註記/簽核 | 系統選項

選擇分類方式 選擇廠別

選擇類別

選擇品號

選擇日期
起 迄

基本選項 | 進階選項 | 註記/簽核 | 系統選項

選擇品號補貨政策

☒ 依補貨點 ☒ 依MRP需求 ☒ 依LRP需求

☒ 不需 ☒ 依歷史銷售

☐ 列印虛設品號

☒ 列印計劃資料

☒ 僅列印存在於計劃檔中的品號

☒ 生產計劃檔

☒ 採購計劃檔

選擇計劃批號

選擇列印條件

☐ 列印期初為零且本期無異動

☒ 列印製令不發料及廠商供料

確認

取消

週期性

即時報表

報表檢視功能

選擇格式

儲存格式

刪除格式

修改目前格式

擴展延伸設計

預覽列印

印表機設定

存成EXCEL檔

轉成HTML格式

存成文字檔

上一頁

下一頁

第一頁

最後一頁

e-mail依客戶/廠商傳送

e-mail

關於

佇列工作管理員 ▾ 視窗 ▾

成功科技股份有限公司

品號供需明細表

製表日期: 2019/08/01

期間: 2019/08/01至2019/08/31

第 1 頁

品號	品名規格	單位 小單位	日期 異動別	庫別 庫別名稱	異動數量 預計結存	結存<安全存量	備註
110012	主開關連動板 SV系列	pcs	庫存可用量:				
			2019/08/15 計劃進貨	1C 原料倉	80.000 80.000		22020190805002 /1003日昇公司
			2019/08/20 計劃領用	1C 原料倉	80.000		22020190805002
120001	電阻	pcs	庫存可用量:		-44,289.000		
			2019/08/14 計劃領用	1C 原料倉	120.000 -44,409.000	*	22020190805002
120002	整流器	pcs	庫存可用量:		89,460.000		
			2019/08/14 計劃領用	1C 原料倉	30.000 89,430.000		22020190805002
			2019/08/16 預計進貨	1C 原料倉	500.000 89,930.000		33A 201907050010002/1003日昇公司
			預計請購	1C 原料倉	500.000 90,430.000		310 2019080400200020001/1003日昇公司
			2019/08/25 預計進貨	1C 原料倉	300.000 90,730.000		33A 201908110010001/1004冠軍公司
120003	二極管	pcs	庫存可用量:		-14,060.000		
			2019/08/14 計劃領用	1C 原料倉	60.000 -14,120.000	*	22020190805002
120004	電容	pcs	庫存可用量:		-42,180.000		
			2019/08/14 計劃領用	1C 原料倉	180.000 -42,360.000	*	22020190805002



- | | |
|----|--|
| 1. | 因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用(生管擬定銷售預測)。 |
| 2. | 生管檢視計劃內容後，決議將半成品組件各多生產50組當庫存品。 |
| 3. | 再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後將半成品進行生產/採購計劃鎖定與發放，並將銷售預測取消納入生產計劃(或指定結案)。 |
| 4. | 客戶-環球公司於本月25日向業務人員訂購「430002數位相機GT系列」500台,要求月底出貨。 |
| 5. | 生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。 |
| 6. | 再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。 |
| 7. | 當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備貨並出貨給客戶。 |

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟五：修改數量



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	530	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠內
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	540	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	511	託外

②

③

生產計劃新增或變更後，在半成品及材料重新展算前，該生產計劃必須勾選「鎖定」。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟五：修改數量



資料瀏覽 資料查詢

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	530	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠內
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	540	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	511	託外

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

☒ 相關資料有異動,是否重新產生相依需求資料

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 考慮主要領料庫別

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 確定 ☐ 取消

在數量有增減調整後，跳下行時，系統就會彈出相依需求計算確認框。

若有未確認品項，在儲存時，系統會彈出相依需求計算確認框。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟五：修改數量



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
▶ 320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	530	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠內
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_A	2019/08/20		1B	半成品倉	540	ea	☒	2019/08/15		2019/08/15	511	託外



增加生產數量後，採購件的數量是否要手動調整追加？

步驟六：再次產生計劃

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 重新登入 離開

群組命名 鎖定方塊

檢視類別 教室iGP

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生 (LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據 依計劃來源 ①

選擇廠別 001

☐ 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

重新執行「批次需求計劃產生」

在「生產計劃維護作業」中必須有資料，並將計劃資料鎖定。

選擇計劃日期範圍

起 返

選擇鎖定狀態

☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

② 輸入計劃批號 20190801

確認 取消 週期性

我的ERP

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(12ms) CAPS NUM SCRL INS

步驟六：再次產生計劃

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 重新登入 離開

群組命名 鎖定方塊

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理 資料維護管理 清單與明細表 報表列印 批次作業

批次需求計劃產生 生產計劃鎖定 批次計劃清除 生產計劃發放 採購計劃鎖定 採購計劃發放

主生產排程系統 物料需求計劃系統 成本計算管理系統 固定資產管理系統 營業稅申報系統 品質管理系統 保稅管理系統 多角貿易管理系統 Fax/Email處理系統 園區保稅管理系統 零用金管理系統 模具管理系統 合併財報管理系統 標準成本計算管理系統 產品序號管理系統 e-B Online 連結系統 E-BOM試產管理系統 SPC整合系統

我的ERP 作業

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生 (LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

3 批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature件依比率計算

☐ Option件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

4 ☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

5 ☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☒ 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

6 對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別

☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(12ms) CAPS NUM SCRL INS

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟六：檢視生產計劃

結果



查詢

修改



列印



上筆



下筆



首筆



末筆



串查



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
▶ 320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_A	2019/08/20	...	1B	半成品倉	530	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠內
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_A	2019/08/20		1B	半成品倉	540	ea	☒	2019/08/15		2019/08/15	511	託外



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	來源單別	來源單號	來源序號	製造商
173009	變壓器-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	190	pcs	2019/08/14	NTD	100	☐	****	20190801	0002	
173011	金屬Logo-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	230	pcs	2019/08/14	NTD	60	☐	****	20190801	0001	
173014	LCD窗-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	280	pcs	2019/08/14	NTD	500	☐	****	20190801	0001	

動手做做看! 批次需求計劃產生

案例操作：

生管檢視計劃內容後，決議將320015、320016 各多生產50組當庫存品；調整後並重新執行「批次需求計劃產生」。

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 20190801 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_	2019/08/20	...	1B	半成品倉	530	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_	2019/08/20	...	1B	半成品倉	540	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	511	託

使用者自訂條件式

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據 依計劃來源

選擇廠別 001

☐ 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

來源單別

來源單號

來源序號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起 迄

選擇鎖定狀態


☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

輸入計劃批號 20190801




四、接單裝配生產案例

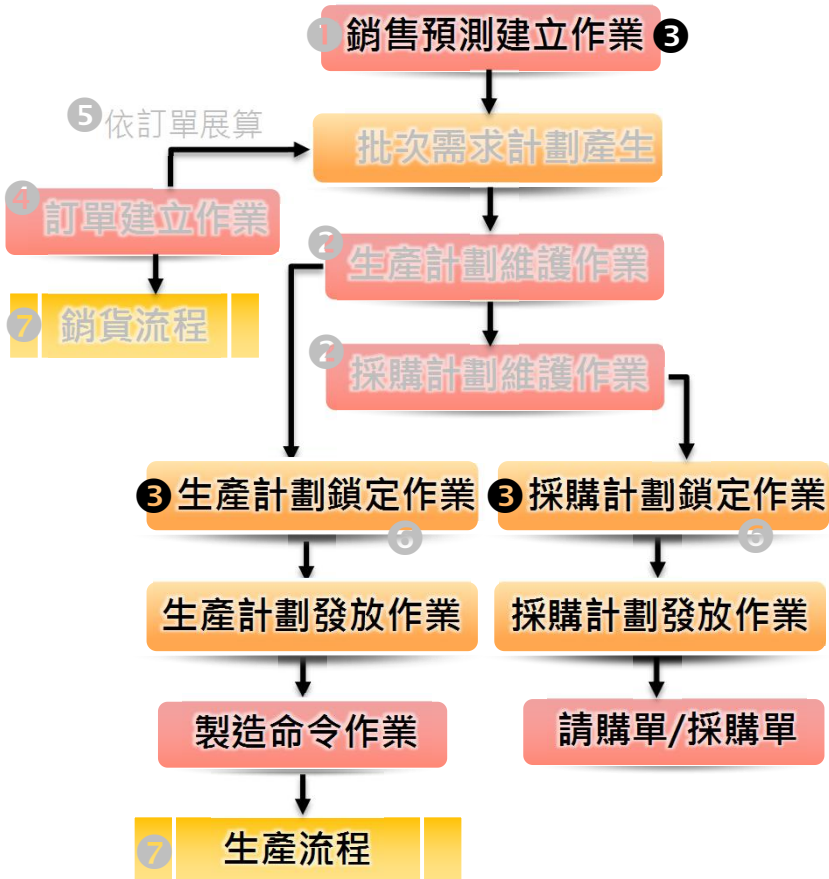

接單裝配生產計劃流程

1.	因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用(生管擬定銷售預測)。
2.	生管檢視計劃內容後，決議將半成品組件各多生產50組當庫存品。
3.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後將半成品進行生產/採購計劃鎖定與發放，並將銷售預測取消納入生產計劃(或指定結案)。
4.	客戶-環球公司於本月25日向業務人員訂購「430002數位相機GT系列」500台,要求月底出貨。
5.	生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
6.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
7.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備貨並出貨給客戶。

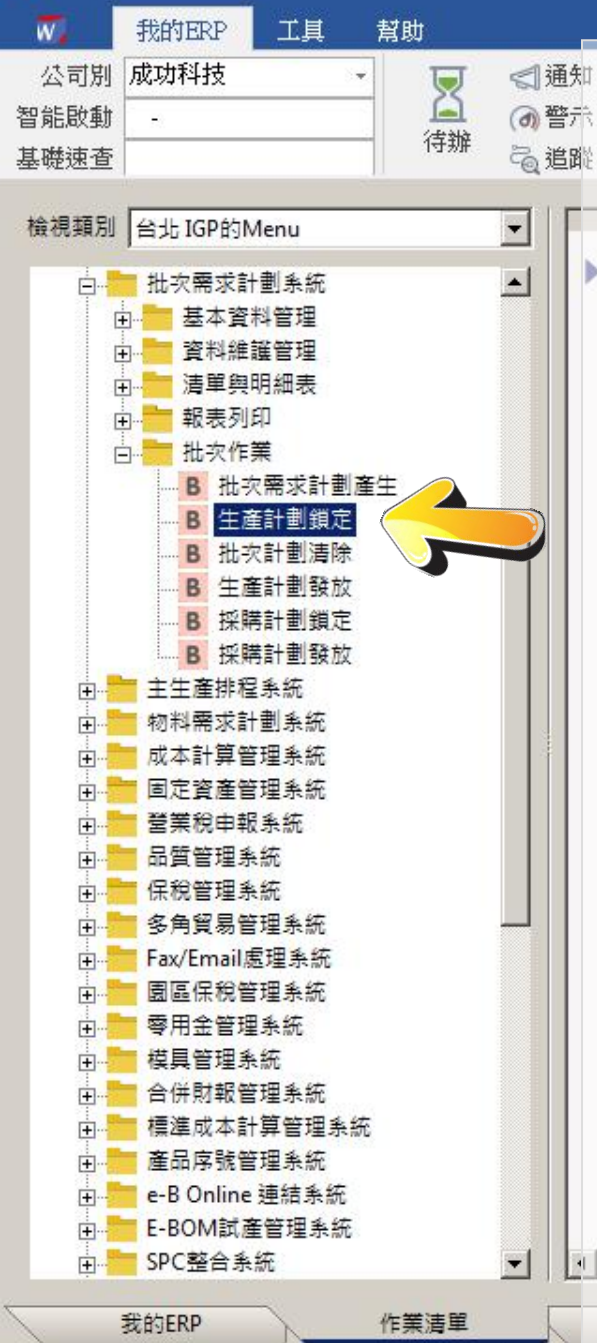

作業目的 生產計劃鎖定

- 將檢核未發放的生產計劃，設定為「鎖定」，作為計劃發放的控制依據。
- 重新執行「需求計劃產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。



我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技
智能啟動 -
基礎速查

待辦

通知
警示
追蹤

佇列工作控制台

作業速查
我的訊息
工作管理員作業清單
進階清單
個人清單

儲存檢視

新增流程
群組命名刪除方塊
鎖定方塊重新登入
離開

步驟七：生產計劃鎖定作業

練習簿

檢視類別 教室iGP設定的Menu

- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統

▶▶ 批次需求計劃系統

生產計劃鎖定作業(LRPB02)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇鎖定狀態

☒ 鎖定☐ 取消鎖定

選擇品號

起

迄

選擇廠別

選擇庫別

選擇完工日

起

迄

選擇計劃批號

起 20190801

迄 20190801

選擇製令單別

選擇計劃人員

確認

取消

週期性

我的ERP

作業清單

監控檢核

成功科技

DS-System Administrator

127.0.0.1

192.168.20.221(16ms)

CAPS NUM SCRL JTS



結果

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註


品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_	2019/08/20	...	1B	半成品倉	530	ea	☒	2019/08/15	...	2019/08/15	510	廠內
320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_	2019/08/20		1B	半成品倉	540	ea	☒	2019/08/15		2019/08/15	511	託外

➤ 批次生產計劃維護的「鎖定」可以透過：

- (1)執行「生產計劃鎖定作業」更新
- (2)手動勾選

➤ 備註：

生產計劃新增或變更後，在半成品及材料重新展算前，該生產計劃也必須勾選「鎖定」。

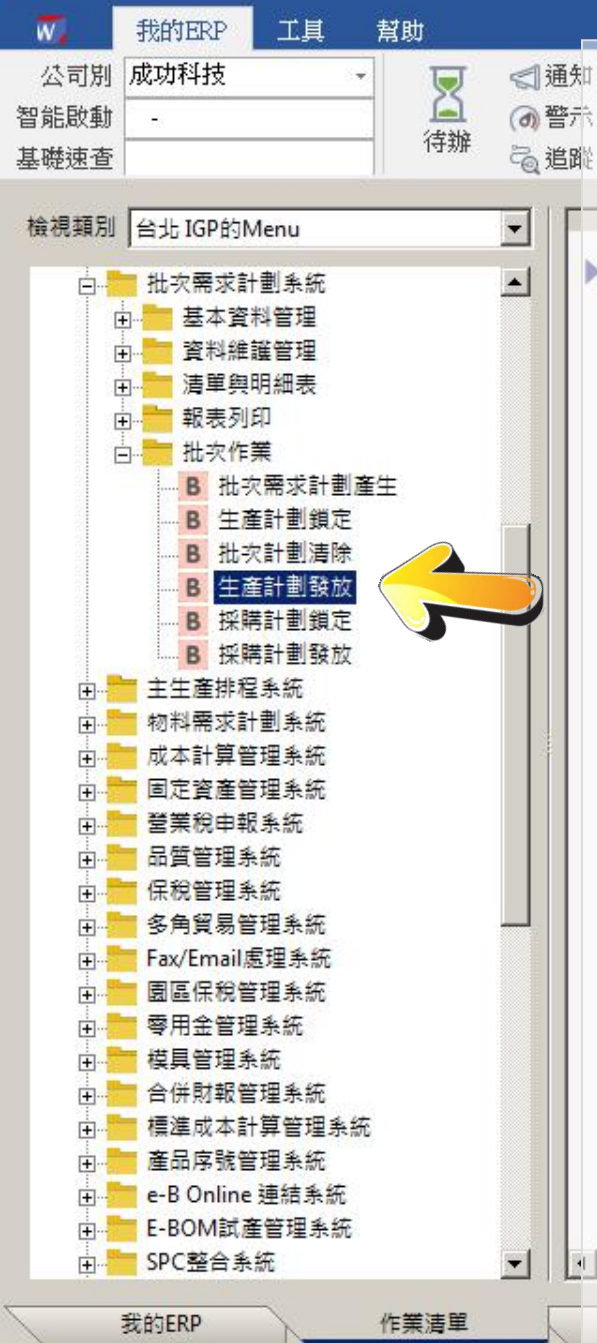

作業目的 生產計劃發放

- 將生產計劃發放成為「**廠內/託外製造命令**」，作為生產的依據。
- **未**做鎖定的資料後續也可發放。



步驟八：生產計劃發放

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名

重新登入 離開

彈窗廣告

檢視類別 教室iGP設定的Menu

- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統

▶▶ 批次需求計劃系統

生產計劃發放作業(LRPB03)[成功科技]

使用批單訂系統

基本選項 進階選項 系統選項

選擇品號

起

迄

選擇完工日

起

迄

選擇開工日

起

迄

選擇計劃批號

起

迄

選擇廠別

選擇庫別

選擇狀態

☒ 鎖定☐ 全部

選擇製令單別

選擇製令性質 全部

選擇計劃人員

確認

取消

週期性

步驟八：生產計劃發放

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名

重新登入 離開

彈窗廣告

檢視類別 教室iGP設定的Menu

- [-] 批次需求計劃系統
 - [+] 基本資料管理
 - [+] 資料維護管理
 - [+] 清單與明細表
 - [+] 報表列印
 - [+] 批次作業
 - B 批次需求計劃產生
 - B 生產計劃鎖定
 - B 批次計劃清除
 - B 生產計劃發放
 - B 採購計劃鎖定
 - B 採購計劃發放
- [+] 主生產排程系統
- [+] 物料需求計劃系統
- [+] 成本計算管理系統
- [+] 固定資產管理系統
- [+] 營業稅申報系統
- [+] 品質管理系統
- [+] 保稅管理系統
- [+] 多角貿易管理系統
- [+] Fax/Email處理系統
- [+] 園區保稅管理系統
- [+] 零用金管理系統
- [+] 模具管理系統
- [+] 合併財報管理系統
- [+] 標準成本計算管理系統
- [+] 產品序號管理系統
- [+] e-B Online 連結系統
- [+] E-BOM試產管理系統
- [+] SPC整合系統

▶▶ 批次需求計劃系統

生產計劃發放作業(LRPB03)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇發放方式 皆不合併

發放排序依據 計劃批號

☒ 發放託外製令之加工單價為零者☒ 開工,完工日小於發放日期更改與發放日期相同

輸入生管/採購人員


輸入發放日期 2019/08/01

確認

取消

週期性

生產計劃推算出的預計開工日、預計完工日
可能會早於實際發放日期，建議勾選此選項
確保資料的合理性。

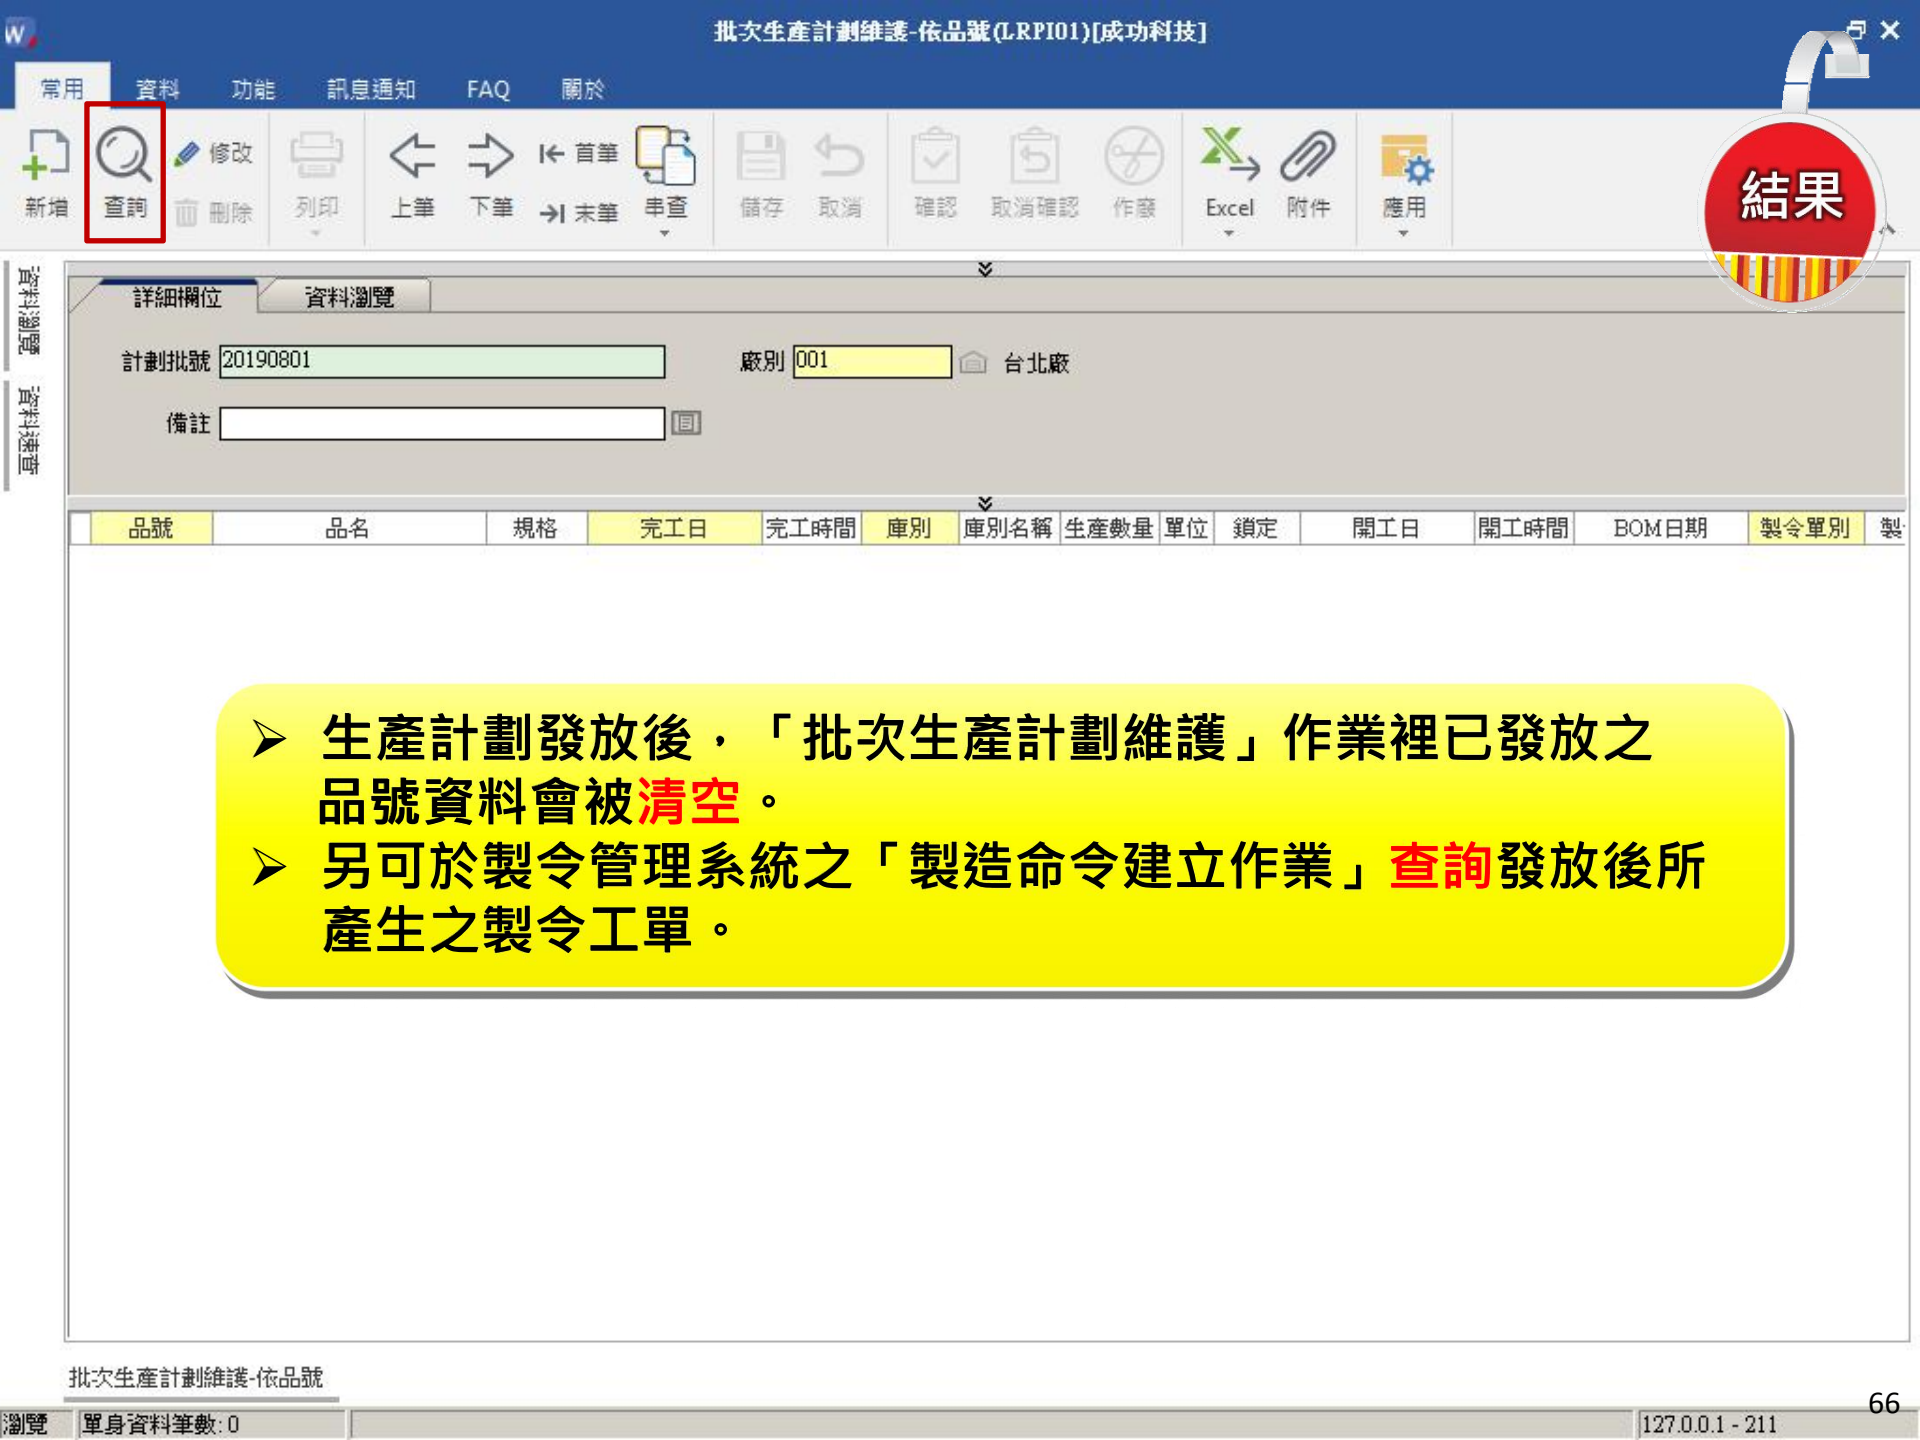

- 生產計劃發放後，「批次生產計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被**清空**。
- 另可於製令管理系統之「製造命令建立作業」**查詢**發放後所產生之製令工單。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增

查詢



修改



列印



上筆



下筆

系統產生



儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用



複製製令



用料計算

製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801002

產品品號 320015

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/01

品名 PCBA-Assembly Main-GT

性質 1:廠內製令

規格 GT系列_ATO

類型 2:正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

時程與產量

廠內託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 530

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/15 <四>

預計完工 2019/08/20 <二>

實際開工

實際完工

BOM日期 2019/08/15

確認日 2019/08/01

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	173001	主開關連動板-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173002	模式按鈕-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173003	塑膠前蓋-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173004	塑膠後蓋-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173011	金屬Logo-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173012	鍍銀螺絲-GT	GT_ATO	4,240	0	4,240	pcs	****
2.正式品號	173014	LCD窗-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173015	LED顯示窗-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173016	光學鏡片-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173017	鏡頭玻璃-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



系統產生

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 總料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801002 產品品號 320015 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/01 品名 PCBA-Assembly Main-GT

性質 1:廠內製令 規格 GT系列_ATO

類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000



產品序號維護

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

計劃批號 20190801 客戶代號

母製令號 510 20190801002 客戶單號

客戶品號

紀錄製令的來源依據

專案代號

備註

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	173001	主開關連動板-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173002	模式按鈕-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173003	塑膠前蓋-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173004	塑膠後蓋-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173011	金屬Logo-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173012	鍍銀螺絲-GT	GT_ATO	4,240	0	4,240	pcs	****
2.正式品號	173014	LCD窗-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173015	LED顯示窗-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173016	光學鏡片-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****
2.正式品號	173017	鏡頭玻璃-GT	GT_ATO	530	0	530	pcs	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



新增



查詢



修改



列印



上筆



下筆

系統
產生

儲存



取消



確認



取消確認



作廢



Excel



附件



應用



複製製令



用料計算

製令單別 511 ☐ 託外製令單

製令單號 20190801002

開單日期 2019/08/01

性質 2:託外製令

類型 2:正式品號

狀態碼 1:未生產

☐ 急料

列印 0

傳送次數 0

產品品號 320016

EBO拋轉狀態 不需拋轉

品名 PCBA-Assembly Sensor-GT

規格 GT系列_ATO

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000



產品序號維護

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 540

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/15 <四>

預計完工 2019/08/20 <二>

實際開工

實際完工

BOM日期 2019/08/15

確認日 2019/08/01

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	173005	電阻-GT	GT_ATO	2,160	0	2,160	pcs	****
2.正式品號	173006	整流器-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173007	二極管-GT	GT_ATO	1,080	0	1,080	pcs	****
2.正式品號	173008	電容-GT	GT_ATO	3,240	0	3,240	pcs	****
2.正式品號	173009	變壓器-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173010	IC,CMOS-GT	GT_ATO	1,080	0	1,080	pcs	****
2.正式品號	173013	金屬接片-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173018	PCB電板-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	200001	錫		540	0	540	g	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



系統產生

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190801002 產品品號 320016 EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/01 品名 PCBA-Assembly Sensor-GT

性質 2:託外製令 規格 GT系列_ATO

類型 2:正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

產品序號維護



時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

計劃批號 20190801 客戶代號

母製令號 511 20190801002 客戶單號

客戶品號

紀錄製令的來源依據

專案代號

備註

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	173005	電阻-GT	GT_ATO	2,160	0	2,160	pcs	****
2.正式品號	173006	整流器-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173007	二極管-GT	GT_ATO	1,080	0	1,080	pcs	****
2.正式品號	173008	電容-GT	GT_ATO	3,240	0	3,240	pcs	****
2.正式品號	173009	變壓器-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173010	IC,CMOS-GT	GT_ATO	1,080	0	1,080	pcs	****
2.正式品號	173013	金屬接片-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173018	PCB電板-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	200001	錫		540	0	540	g	****

動手做做看!

生產計劃鎖定作業
生產計劃發放作業

案例操作：

再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產
製令單號 20190801002 產品品號 320015
開單日期 2019/08/01 品名 PCBA-Assem 規格 GT系列_ATO
性質 1:廠內製令 單位 ea
類型 2:正式品號

時程與產量 廠內/託外 進階資料

預計產量 530
已領套數 0
已生產量 0
報廢數量 0
預計開工 2019/08/15 <四>
預計完工 2019/08/20 <二>
實際開工
實際完工

類型	材料品號	品名	規格
2.正式品號	173001	主開關連動板-GT	GT_ATO
2.正式品號	173002	模式按鈕-GT	GT_ATO
2.正式品號	173003	塑膠前蓋-GT	GT_ATO
2.正式品號	173004	塑膠後蓋-GT	GT_ATO
2.正式品號	173011	金屬Logo-GT	GT_ATO
2.正式品號	173012	鍍銀螺絲-GT	GT_ATO
2.正式品號	173014	LCD窗-GT	GT_ATO
2.正式品號	173015	LED顯示窗-GT	GT_ATO
2.正式品號	173016	光學鏡片-GT	GT_ATO
2.正式品號	173017	鏡頭玻璃-GT	GT_ATO

瀏覽 單身資料筆數: 10 173001 主開關連動板-GT

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作業 Excel 附件 應用 複製製令 用料計算

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 1:未生產 德料 列印 0 傳送次數 0
製令單號 20190801002 產品品號 320016 EBO拋轉狀態 不需拋轉
開單日期 2019/08/01 品名 PCBA-Assembly Sensor-GT
性質 2:託外製令 規格 GT系列_ATO
類型 2:正式品號 單位 ea BOM板次 0000 版次 0000

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽


預計產量 540
已領套數 0
已生產量 0
報廢數量 0
預計開工 2019/08/15 <四>
預計完工 2019/08/20 <二>
實際開工
實際完工

BOM日期 2019/08/15
確認日 2019/08/01
確認者 DS 系統管理者
審核狀態 N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	173005	電阻-GT	GT_ATO	2,160	0	2,160	pcs	****
2.正式品號	173006	整流器-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173007	二極管-GT	GT_ATO	1,080	0	1,080	pcs	****
2.正式品號	173008	電容-GT	GT_ATO	3,240	0	3,240	pcs	****
2.正式品號	173009	變壓器-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173010	IC,CMOS-GT	GT_ATO	1,080	0	1,080	pcs	****
2.正式品號	173013	金屬接片-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	173018	PCB電板-GT	GT_ATO	540	0	540	pcs	****
2.正式品號	200001	錫	GT_ATO	540	0	540	g	****

瀏覽 單身資料筆數: 9 173005 電阻-GT

127.0.0.1 - 211

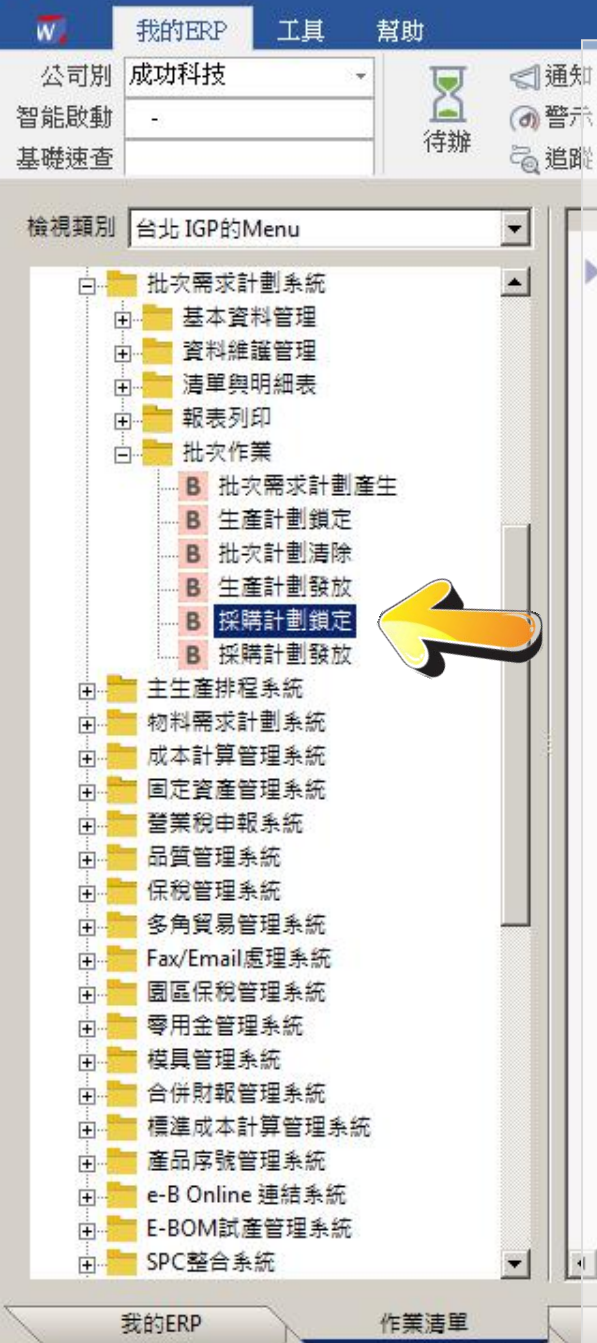

作業目的

採購計劃鎖定

- 將檢核未發放的採購計劃後，設定為「鎖定」，作為計劃發放的控制依據。
- 重新執行「需求計劃產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。



步驟九：採購計劃鎖定

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名

重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統

海用產品訂貨系統

批次需求計劃系統

採購計劃鎖定作業(LRPB04)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇鎖定狀態

☒ 鎖定

☐ 取消鎖定

選擇交貨日

起 迄

選擇品號

起 迄

選擇廠別

選擇計劃批號

起 迄

選擇計劃人員

選擇庫別

選擇採購日

起 迄

確認

取消

週期性

我的ERP 作業清單

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(9ms) CAPS NUM SCRL INS

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



結果

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801


廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	來源單別	來源單號	來源序號	製造商
173009	變壓器-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	190	pcs	2019/08/14	NTD	100	☒	****	20190801	0002	...
173011	金屬Logo-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	230	pcs	2019/08/14	NTD	60	☒	****	20190801	0001	
173014	LCD窗-GT	GT_ATO	2019/08/14	1003	日昇公司	1C	原料倉	280	pcs	2019/08/14	NTD	500	☒	****	20190801	0001	

- 批次採購計劃維護的「鎖定」可以透過：
- (1)執行「採購計劃鎖定作業」更新
 - (2)手動勾選

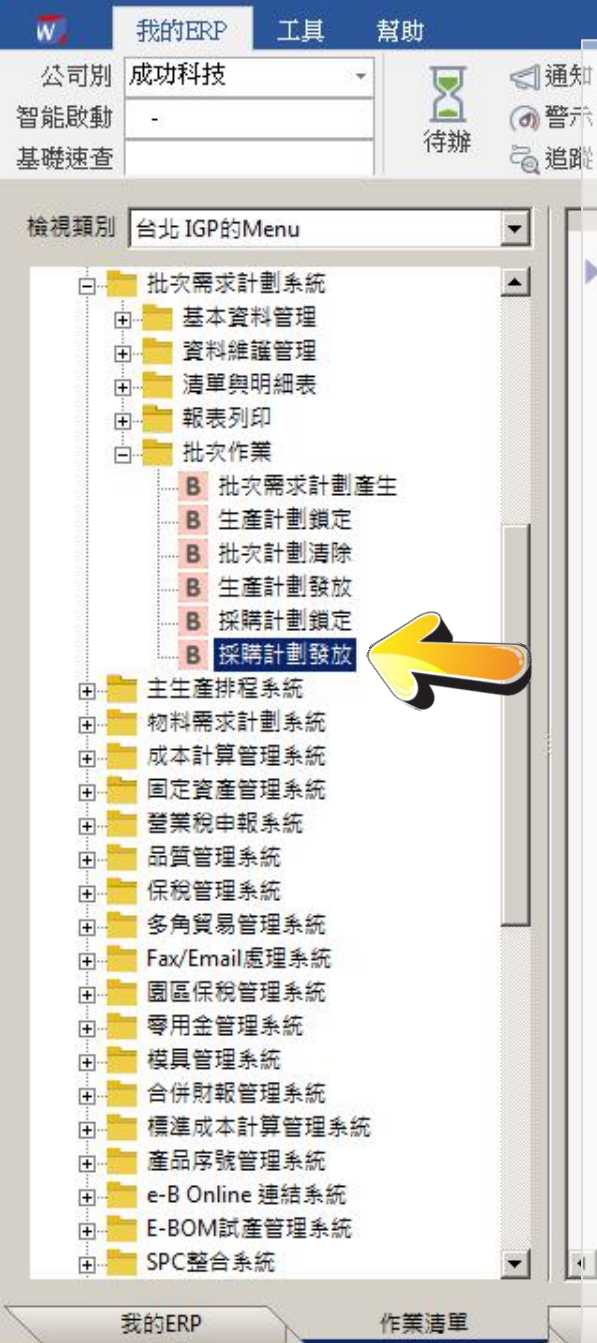

作業目的 採購計劃發放

- 將採購計劃發放成為「請購單」或「採購單」，作為採買料件的依據。
- 未做鎖定的資料後續也可發放。



步驟十：採購計劃發放

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警告 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名

重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

批次需求計劃

生產計劃鎖定

批次計劃清除

生產計劃發放

採購計劃鎖定

採購計劃發放

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

產品序號管理系統

e-B Online 連結系統

E-BOM試產管理系統

SPC整合系統

我的ERP

批次需求計劃系統

採購計劃發放作業(LRPB05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商

起

迄

選擇計劃批號

☒ 區間選擇

起 20190801

迄 20190801

選擇廠別

選擇幣別

選擇品號

起

迄

選擇庫別

選擇狀態

☒ 鎖定 ☐ 全部

選擇採購日

起

迄

☒ 考慮最低補量及補貨倍量

☒ 採購單價重新計算

☒ 依發放日期

☐ 依採購計劃之採購日

確認

取消

週期性

將廠商規範的最低補量及補貨倍量
納入採購數量評估。

步驟十：採購計劃發放

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 重新登入 離開

群組命名 鎖定方塊

彈窗廣告

檢視類別 教室iGP設定的Menu

- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統

▶▶ 批次需求計劃系統

採購計劃發放作業(LRPB05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 發放採購單價為零者☒ 預交日小於發放日期更改與發放日期相同

採購計劃推算出的預交日可能會早於實際發放日期，建議勾選此選項確保資料的合理性。

輸入發放日期 2019/08/01

輸入請購人員

選擇採購人員方式 輸入指定採購人員

輸入指定採購人員 401

選擇品號採購人員

確認

取消

週期性

我的ERP



結果

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 20190801

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	來源單別	來源單號	來源序號	製造商
------	----	----	-----	------	------	------	------	------	------	-----	----	----	----	------	------	------	-----

- 採購計劃發放後，「批次採購計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被**清空**。
- 另可於採購管理系統之「請購單」或「採購單」**查詢**發放後所產生之單據。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



系統產生

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2019/08/01 拋轉狀態 N:未拋轉
 採購單號 20190801004 供應廠商 1003 採購日期 2019/08/01
 流程代號 日昇公司 確認者 DS 系統管理者
 版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 採購人員 401 李採購 運輸方式
 交易幣別 NTD 匯率 1 訂金分批 訂金比率 0.00%
 稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 備註 列印 0 傳送次數 0
☐ EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次

紀錄採購的來源依據

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	採購單價	採購金額	預交日	來源單號	參考單別	參考單號	參考序號	已交數量	最低補量
0001	2.LRP	173009	變壓器-GT	GT_ATO 1C	原料倉		190	100	19,000	2019/08/14	20190801	****	20190801	0002	0	0
0002	2.LRP	173011	金屬Logo-GT	GT_ATO 1C	原料倉		230	60	13,800	2019/08/14	20190801	****	20190801	0001	0	0
0003	2.LRP	173014	LCD窗-GT	GT_ATO 1C	原料倉		280	500	140,000	2019/08/14	20190801	****	20190801	0001	0	0

採購金額 172,800 稅額 8,640 金額合計 181,440
 數量合計 700

動手做做看!

採購計劃鎖定作業
採購計劃發放作業

案例操作：

再次檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放



採購單建立作業(PUR107)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 未筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製採購單 BARTENDER條碼列印

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2019/08/01 拋轉狀態 N:未拋轉
採購單號 20190801004 供應廠商 1003 採購日期 2019/08/01
流程代號 日昇公司 確認者 DS 系統管理者
版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 審核狀態 N:不執行電子審核
採購人員 401 李採購 運輸方式
交易幣別 NTD 匯率 1 訂金分批 訂金比率 0.00%
稅別碼 F05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率
EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	採購單價	採購金額	預交日	來源單號	參考單別	參考單號	參考序號	已交數量	最低補量
0001	2.LRP	173009	變壓器-GT	GT_ATO 1C	原料倉	190	100	19,000	2019/08/14	20190801	****	20190801	0002	0	0	
0002	2.LRP	173011	金屬Logo-GT	GT_ATO 1C	原料倉	230	60	13,800	2019/08/14	20190801	****	20190801	0001	0	0	
0003	2.LRP	173014	LCD窗-GT	GT_ATO 1C	原料倉	280	500	140,000	2019/08/14	20190801	****	20190801	0001	0	0	

採購金額 172,800 稅額 8,640 金額合計 181,440
數量合計 700

瀏覽 單身資料筆數: 3 173009 變壓器-GT 127.0.0.1 - 211

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟十一：銷售預測 取消納入生產計劃或指定結案



單身單筆指定結案

單身單筆取消指定結案

作廢

Excel

附件

應用

詳細欄位 資料瀏覽

預測代號 20190801

通路

客戶代號

型態

部門

地區

業務員

國家

☐ 納入生產計劃

路線


備註

廠別 001 台北廠

其他

序號	品號	品名	規格	日期	預測庫	庫別名稱	預測數量	已受訂量	單位	幣別	單價	預測金額	結案碼	優先順序	鎖定交期	備註
0001	320015	PCBA-Assembly Main-GT系列	2019/08/21	1B	半成品倉	500	0	ea	NTD	0	0	0	y:指定結案	00010	☐	...
0002	320016	PCBA-Assembly Sensor GT系列	2019/08/21	1B	半成品倉	500	0	ea	NTD	0	0	0	N:未結案	00010	☐	...

四、接單裝配生產案例

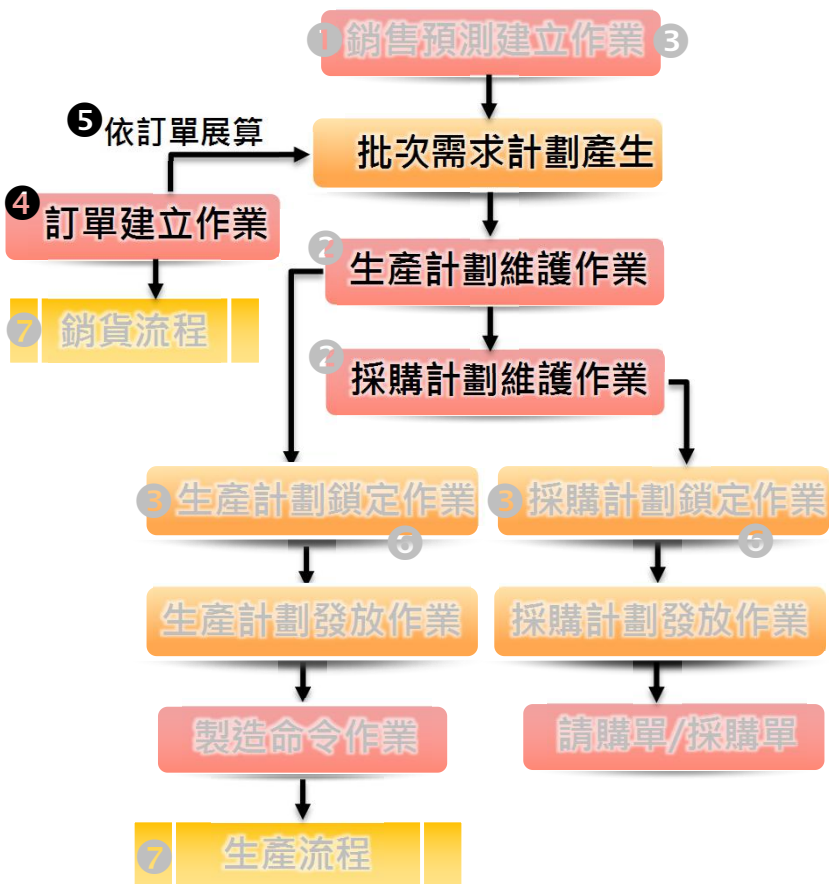

接單裝配生產計劃流程

1.	因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用(生管擬定銷售預測)。
2.	生管檢視計劃內容後，決議將半成品組件各多生產50組當庫存品。
3.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後將半成品進行生產/採購計劃鎖定與發放，並將銷售預測取消納入生產計劃(或指定結案)。
4.	客戶-環球公司於本月25日向業務人員訂購「430002數位相機GT系列」500台,要求月底出貨。
5.	生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
6.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
7.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備貨並出貨給客戶。

常用

資料

功能

訊息通知

FAQ

關於

新增

查詢

刪除

列印

上筆

下筆

末筆

串查

儲存

取消

確認

取消確認

作廢

Excel

附件

應用

複製訂單

複製前置單據

訂單單別220國內訂單單據日期2019/08/25拋轉狀態N:未拋轉

訂單單號20190825001客戶代號1001環球公司訂單日期2019/08/25

流程代號EBO拋轉狀態不控管信用額度確認者DS

交易資料一

交易資料二

送貨資料

國外訂單一

國外訂單二

國外備註

部門代號30業務部門稅別碼S05銷項三聯式發票-應稅外加

業務人員303陳外務課稅別2:應稅外加傳送次數0單身多稅率

出貨廠別001台北廠營業稅率5.000%列印0

交易幣別NTD訂金分批付款條件2D1結帳後一星期收款 60天票期

匯率1簽核狀態N:不執行電子簽核

客戶單號價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	單價	金額	預交日	類型	贈品量	贈品已交量	備品量	備
0001	430002	數位相機-GT系列	GT101_ATO	A	成品倉	500	0	23,000	11,500,000	2019/08/31	贈品量	0	0	0		

訂單金額11,500,000總數量500

訂單稅額575,000總毛重(Kg)0

合計12,075,000總材積(CUFT)0

來源：
客戶訂單

步驟十二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視 群組命名 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理 資料維護管理 清單與明細表 報表列印 批次作業

批次需求計劃產生 生產計劃鎖定 批次計劃清除 生產計劃發放 採購計劃鎖定 採購計劃發放

主生產排程系統 物料需求計劃系統 成本計算管理系統 固定資產管理系統 營業稅申報系統 品質管理系統 保稅管理系統 多角貿易管理系統 Fax/Email處理系統 園區保稅管理系統 零用金管理系統 模具管理系統 合併財報管理系統 標準成本計算管理系統 產品序號管理系統 e-B Online 連結系統 E-BOM試產管理系統 SPC整合系統

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生 (LRPB01) [成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

1 選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

依據訂單為計劃來源

2 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

220-20190825001-0001

來源單別 220

來源單號 20190825001

來源序號 0001

確認 取消 週期性

選擇要列入計算的計劃來源：
若要將整張訂單需求列入推算，在左方來源編號直接選取；若僅針對訂單中某幾筆品項進行推算，可從右方選擇來源單別、單號、序號，點選帶到左方的來源編號。

我的ERP

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(10ms) CAPS NUM SCRL INS

步驟十二：批次需求計劃產生

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視 群組命名 鎖定方塊

重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

- 基本資料管理
- 資料維護管理
- 清單與明細表
- 報表列印
- 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

☐ 僅顯示未拋轉單據

選擇來源編號

220-20190825001-0001

來源單別 220

來源單號 20190825001

來源序號 0001

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起 迄

選擇鎖定狀態

確認 取消 週期性

預設來源單別單號為 生產/採購計劃批號

3 輸入計劃批號 220201908250010001

步驟十二：批次需求計劃產生

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

群組命名

鎖定方塊

重新登入

離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

批次需求計劃產生

生產計劃鎖定

批次計劃清除

生產計劃發放

採購計劃鎖定

採購計劃發放

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

產品序號管理系統

e-B Online 連結系統

E-BOM試產管理系統

SPC整合系統

我的ERP

作

批次需求計劃系統

批次需求計劃產生 (LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

4 批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

5 ☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

6 ☐ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☐ 需求量日期納入考慮

7 選擇需產生之計劃

全部

8 對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主附件維護檔的庫別

☒ 來源庫別

☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

成功科技 DS-System Administrator 127.0.0.1 192.168.20.221(9ms) CAPS NUM SCRL INS

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟十二：檢視批次生產計劃維護



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 220201908250010001

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
430002	數位相機-GT系列	GT101_A	2019/08/29	...	1A	成品倉	470	ea	☐	2019/08/27	...	2019/08/27	510	廠內

W. 批次生產計劃維護-依品號(LRPI01... - □ ×

庫存量	30.000
安全存量	0.000
預計進貨	0.000
預計採購	0.000
請拋採未確認	0.000
預計生產	0.000
預計銷售	500.000
預計領用	0.000
計劃採購	0.000
計劃生產	0.000
計劃銷售	0.000
計劃領用	0.000
毛需求量	500.000
已發放量	0.000

確定 取消

訂單需求量

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟十二：檢視批次生產計劃維護



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 220201908250010001

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
▶ 430002	數位相機-GT系列	GT101_A	2019/08/29	...	1A	成品倉	470	ea	☐	2019/08/27	...	2019/08/27	510	廠戶

下階半成品組件已進行生產備料，
供給>需求，不需生產。

批次生產計劃維護-依品號

材料品號	品名	規格	需領用量	單位	預計領料日	庫別	庫別名稱	製程順序	材料型態	取替代件	被取替代品號	備註	優先順序
150006	保證卡		470	pcs	2019/08/27	1C	原料倉	****	1:直接材料		150006		
150015	雷射防偽	GT_ATO	470	pcs	2019/08/27	1C	原料倉	****	1:直接材料		150015		
190025	使用手冊	GT系列_AT	470	pcs	2019/08/27	1C	原料倉	****	1:直接材料		190025		
190030	驅動&影	GT系列_AT	470	pcs	2019/08/27	1C	原料倉	****	1:直接材料		190030		
▶ 320015	PCBA-Ass	GT系列_AT	470	ea	2019/08/27	1B	半成品倉	****	1:直接材料		320015		
▶ 320016	PCBA-Ass	GT系列_AT	470	ea	2019/08/27	1B	半成品倉	****	1:直接材料		320016		

批次生產計劃維護-依品號

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟十二：檢視批次採購計劃維護



詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 220201908250010001

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	W. 批次採購計劃維護-依品號(LRPI03... - 窗 口	代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定	來源單別	來源單號	來源序號	製造商
190025	使用手冊-GT		...	原料倉	20	pcs	2019/08/21	NTD	50	☐	220	20190825	0001	...

庫存量	450.000
安全存量	0.000
預計進貨	0.000
預計請購	0.000
請拋採未確認	0.000
預計生產	0.000
預計銷售	0.000
預計領用	0.000
計劃採購	0.000
計劃生產	0.000
計劃銷售	0.000
計劃領用	470.000
毛需求量	470.000
已發放量	0.000

生產計畫需領料量

確定

取消

動手做做看!

客戶訂單建立作業
批次需求計劃產生

案例操作：

將當25日環球公司訂單作確認；並由生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。

客戶訂單建立作業(COPI06)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消 確認 取消確認 作廢 Excel 附件 應用 複製訂單 複製前置單據

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2019/08/25 拋轉狀態 N:未拋轉 收入遞延天數 3

訂單單號 20190825001 客戶代號 1001 環球公司 訂單日期 2019/08/25 版次 0000

流程代號 EBO拋轉狀態 不控管信

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一 國外訂

部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05 銷項

業務人員 303 陳外務 課稅別 2:應稅外加

出貨廠別 001 台北廠 營業稅率

交易幣別 NTD 訂金分批

匯率 1 訂金比率 10.00%

客戶單號 價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量
0001	430002	數位相機-GT系列	GT101_ATO 1A	成品倉	500	0		

訂單金額 11,500,000 總數量

訂單稅額 575,000 總毛重(Kg)

合計 12,075,000 總材積(CUFT)

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☐ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☐ 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別

☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算


☒ 考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

四、接單裝配生產案例

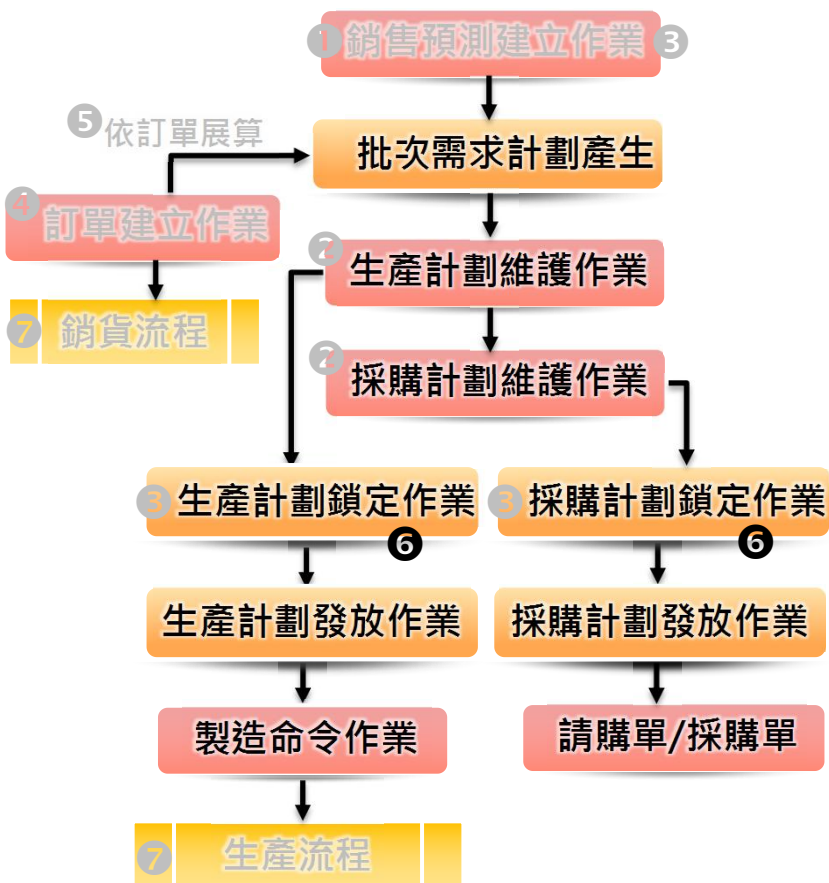

接單裝配生產計劃流程

1.	因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用(生管擬定銷售預測)。
2.	生管檢視計劃內容後，決議將半成品組件各多生產50組當庫存品。
3.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後將半成品進行生產/採購計劃鎖定與發放，並將銷售預測取消納入生產計劃(或指定結案)。
4.	客戶-環球公司於本月25日向業務人員訂購「430002數位相機GT系列」500台,要求月底出貨。
5.	生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
6.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
7.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備貨並出貨給客戶。

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟十三：生產計劃鎖定



品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	製
430002	數位相機-GT系列	GT101_A	2019/08/29	...	1A	成品倉	470	ea	☒	2019/08/27	...	2019/08/27	510	廠P

- 批次生產計劃維護的「鎖定」可以透過：
- (1)執行「生產計劃鎖定作業」更新
 - (2)手動勾選

步驟十四：生產計劃發放

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名

重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

- 基本資料管理
- 資料維護管理
- 清單與明細表
- 報表列印
- 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統

批次需求計劃系統

生產計劃發放作業(LRPB03)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇品號

起 迄

選擇庫別

選擇完工日

起 迄

選擇開工日

起 迄

選擇計劃批號

起 220201908250010001 迄 220201908250010001

選擇製令單別

選擇製令性質 全部

選擇計劃人員

選擇廠別

選擇狀態

☒ 鎖定 ☐ 全部

確認

取消

週期性

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



製令單別 510 廠內製令單

狀態碼 1:未生產 急料

列印 0 傳送次數 0

製令單號 20190825001

產品品號 430002

EBO拋轉狀態 不需拋轉

開單日期 2019/08/25

品名 數位相機-GT系列

性質 1:廠內製令

規格 GT101_ATO

類型 2:正式品號

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000



產品序號維護

時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

預計產量 470

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/27 <二>

BOM日期 2019/08/27

預計完工 2019/08/29 <四>

確認日 2019/08/25

實際開工

確認者 DS 系統管理者

實際完工

簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號
2.正式品號	150001	包裝盒		470	0	470	pcs	****
2.正式品號	150002	內隔板		470	0	470	pcs	****
2.正式品號	150003	氣泡袋		940	0	940	pcs	****
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙		470	0	470	pcs	****
2.正式品號	150005	產品序號貼紙		470	0	470	pcs	****
2.正式品號	150006	保證卡		470	0	470	pcs	****
2.正式品號	150015	雷射防偽貼紙 GT系列	GT_ATO	470	0	470	pcs	****
2.正式品號	190025	使用手冊-GT版	GT系列_ATO	470	0	470	pcs	****
2.正式品號	190030	驅動&影像軟體光碟-GT	GT系列_ATO	470	0	470	pcs	****
2.正式品號	320015	PCBA-Assembly Main-GT	GT系列_ATO	470	0	470	ea	****
2.正式品號	320016	PCBA-Assembly Sensor-GT	GT系列_ATO	470	0	470	ea	****

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

步驟十五：採購計劃鎖定



- 批次採購計劃維護的「鎖定」可以透過：
- (1)執行「採購計劃鎖定作業」更新
 - (2)手動勾選

步驟十六：採購計劃發放

Workflow ERP iGP [DS-System Administrator]

我的ERP 工具 幫助

公司別 成功科技

智能啟動 -

基礎速查

待辦 通知 警示 追蹤

佇列工作控制台

作業速查 我的訊息 工作管理員

作業清單 進階清單 個人清單

儲存檢視

新增流程 刪除方塊 鎖定方塊

群組命名 重新登入 離開

檢視類別 教室iGP設定的Menu

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

B 批次需求計劃

B 生產計劃鎖定

B 批次計劃清除

B 生產計劃發放

B 採購計劃鎖定

B 採購計劃發放

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

產品序號管理系統

e-B Online 連結系統

E-BOM試產管理系統

SPC整合系統

我的ERP

批次需求計劃系統

採購計劃發放作業(LRPB05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商

起 []

迄 []

選擇品號

起 []

迄 []

選擇採購日

起 []

迄 []

選擇計劃批號

☒ 區間選擇

起 220201908250010001

迄 220201908250010001

選擇廠別 []

選擇幣別 []

選擇庫別 []

選擇狀態

☒ 鎖定 ☐ 全部

選擇計劃人員 []

選擇發放方式

同品號、廠商、交貨日、交貨庫、幣別 合併發放

☒ 考慮最低補量及補貨倍量

☒ 採購單價重新計算

☒ 依發放日期

☐ 依採購計劃之採購日

確認

取消

週期性

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於



系統產生

採購單別 33A 國內採購單

單據日期 2019/08/25

拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 20190825001

供應廠商 1003

採購日期 2019/08/25

流程代號

日昇公司

確認者 DS

系統管理者

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一

交易資料二

多角貿易

資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠

列印格式 1:中文

審核狀態 N:不執行電子審核

採購人員 401 李採購

運輸方式

交易幣別 NTD

匯率 1

☐ 訂金分批

訂金比率 0.00%

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

備註

列印 0

傳送次數 0

☐ 單身多稅率☐ EBC確認碼

EBC採購單號

EBC採購版次

☐ 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	預交日	參考單別	參考單號	參考序號	來源單號	已交
0001	2.LRP	2.正式品號	190025	使用手冊-GT版	GT系列_ATO	1C	原料倉	20	2019/08/26	220	20190825001	0001	220201908250010001	

採購金額 1,000

稅額 50

金額合計 1,050

數量合計 20

動手做做看!

生產計劃鎖定/發放
採購計劃鎖定/發放

案例操作：

檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。

檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。

製造命令建立作業(MOC102)[成功科技]

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增 查詢 修改 刪除 列印 上筆 下筆 末筆 串查 儲存 取消

製令單別 510 廠內製令單 狀態 產品 品 規 單

製令單號 20190825001

開單日期 2019/08/25

性質 1.廠內製令

類型 2.正式品號

時程與產量 廠內/外

預計產量 470

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2019/08/27

預計完工 2019/08/29

實際開工

實際完工

類型 材料品號 品名

2.正式品號	150001	包裝盒
2.正式品號	150002	內隔板
2.正式品號	150003	氣泡袋
2.正式品號	150004	包裝盒貼紙
2.正式品號	150005	產品序號貼紙
2.正式品號	150006	保證卡
2.正式品號	150015	雷射防偽貼紙 GT系列
2.正式品號	190025	使用手冊-GT版
2.正式品號	190030	驅動&影像軟體光碟-GT
2.正式品號	320015	PCBA-Assembly Main-GT
2.正式品號	320016	PCBA-Assembly Sensor-GT

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2019/08/25 拋轉狀態 N.未拋轉

採購單號 20190825001 供應廠商 1003 採購日期 2019/08/25

流程代號 日昇公司 確認者 DS 系統管理者

版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1.中文 審核狀態 N.不執行電子審核

採購人員 401 李採購 運輸方式

交易幣別 NTD 匯率 1 訂金分批 訂金比率 0.00%

稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2.應稅外加 營業稅率 5.00%

備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率

EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	預交日	參考單別	參考單號	參考序號	來源單號	已交
0001	2.LRP	2.正式品號	190025	使用手冊-GT版	GT系列_ATO_1C	原料倉	...	20	2019/08/26	...	20190825001	0001	220201908250010001	

採購金額 1,000 稅額 50 金額合計 1,050


數量合計 20

瀏覽 單身資料筆數: 1 150001 包裝盒

瀏覽 單身資料筆數: 1 190025 使用手冊-GT版

127.0.0.1 - 211

四、接單裝配生產案例

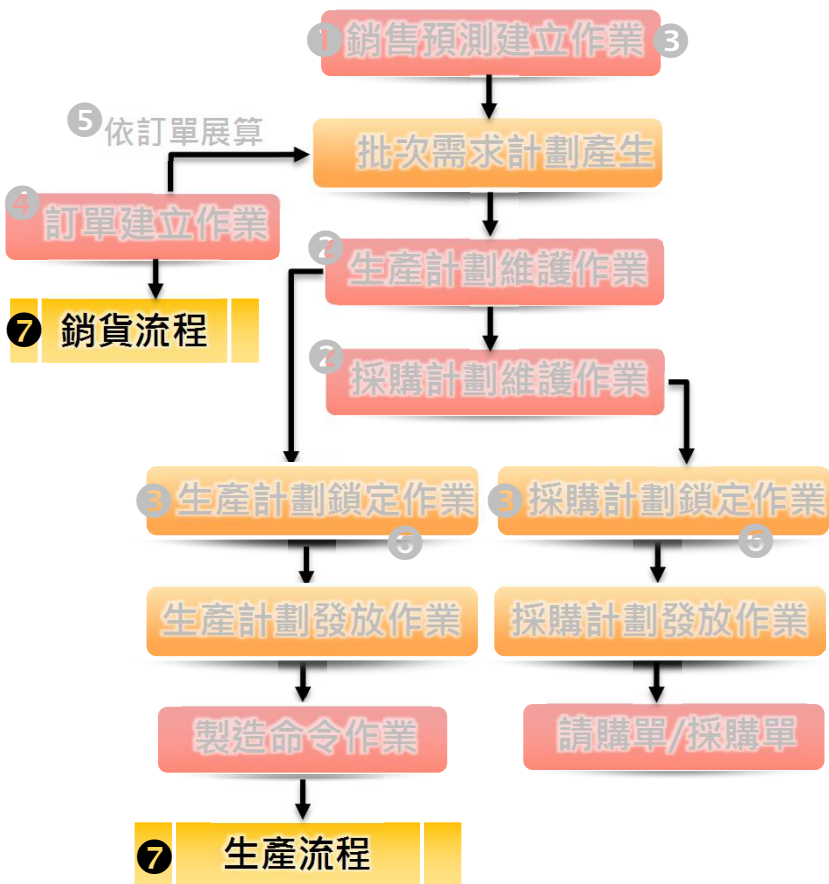

接單裝配生產計劃流程

1.	因業務預估月底「430002數位相機GT系列」客戶將會下單；為加快組裝出貨速度，經策略會議討論後決議將先行安排生產GT系列所需關鍵半成品組件各500組納入庫存備用(生管擬定銷售預測)。
2.	生管檢視計劃內容後，決議將半成品組件各多生產50組當庫存品。
3.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後將半成品進行生產/採購計劃鎖定與發放，並將銷售預測取消納入生產計劃(或指定結案)。
4.	客戶-環球公司於本月25日向業務人員訂購「430002數位相機GT系列」500台,要求月底出貨。
5.	生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
6.	再次檢視生產及採購計劃，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
7.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備貨並出貨給客戶。 <由講師示範操作>

常用 資料 功能 訊息通知 FAQ 關於

新增

查詢

刪除

修改

列印

上筆

下筆

末筆

串查

儲存

取消

確認

取消確認

作廢

Excel

附件

應用

資料維護 資料查詢

分組訂金資料維護 參照票號碼查詢

銷貨單別 230 內銷(核訂單) 單據日期 2019/08/31 銷貨日期 2019/08/31 產生分錄-收入 產生分錄-成本

銷貨單號 20190831001 客戶代號 1001 環球公司 拋轉狀態 N:未拋轉 EBO拋轉狀態 不需拋轉

流程代號 不控管信用額度 現銷

交易資料 送貨資料 發票資料(一) 發票資料(二) 發票資料(三)

部門代號 30 業務部門 幣別 NTD 台幣 審核狀態 N:不執行電子審核

業務人員 303 陳外務 匯率 1 確認者 DS

出貨廠別 001 台北廠 保稅碼 0 依品號預設 系統管理者

付款條件 2D1 結帳後一星期收款 備註 傳送次數 0

交易條件 1 一般交易 件數 0

列印 0 發票列印 0

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	單位	計價數量	單價	金額	訂單單別	訂單單號	訂單序號	贈/備品量
0001	...	430002	數位相機-GT系列	GT101_ATO	1A	成品倉		500	ea	500	23,000	11,500,000	220	20190825001	0001	0

原幣銷貨金額 11,500,000 原幣銷貨稅額 575,000 原幣合計 12,075,000

本幣銷貨金額 11,500,000 本幣銷貨稅額 575,000 本幣合計 12,075,000

總數量 500

常見問題Q&A



Q1

若一品號庫存單位與採購單位不同,則採購計劃以那個為主？

A1

以品號基本資料的庫存單位為主。

Q2

執行批次需求計畫產生時，系統會依母製令之預計完工日往前推算子製令的開工日期嗎？

A2

會，系統推算日期時，是從母製令之需求日往前推算其預計開、完工日，(推算時要記得扣掉檢驗天數)，再往前推算子製令的預計開、完工日。


課程回顧

一、何謂接單裝配生產(ATO)

二、名解解釋

三、批次需求計畫邏輯說明

四、接單裝配生產流程



企業包班課程

打造專屬於您的課程

Just For Yours ERP系統包班

只專屬於貴公司的課程，自選授課模式，改變學習思路，讓工作流程更清晰。

企業包班流程



需求訪談

1

接獲客戶需求後
指派專人與貴公司
了解訓練目的
、人員背景、訓練
課程方向。



規劃內容

2

依貴公司需求，
規劃課程大綱、
設計教案內容、
安排上課方式及
時間。



課程定案

3

依討論後的內容
調整及修正，並
提供簡易版教材
供確認、再提供
合約書簽約。



課程執行

4

由講師進行課程
訓練，內容包含
教學、上機實作
、案例討論等不
同方式進行。



課程訪談

5

課程結束後，針
對課程規劃或學
習狀況訪談訓練
成效，作為後續
規劃課程參考。

上課對象 ※此課程限鼎新電腦WF/SM/CM客戶報名參加

1. ERP系統重新上線部份流程教學。
2. 上線期需集中標準流程教學。
3. 公司人員異動，需集體重新教育訓練。
4. 公司人員眾多且分佈於各地區。

課程目的

強化使用者對ERP系統架構、流程
、應用之實務流程及管理功能與
內稽內控精神。

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明

詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主





手持勝券 成功在握

增加職場競爭力從ERP證照課程開始

想考ERP證照擔心抓不到重點?心動不如馬上行動....

課程目標

1. 強化對ERP系統架構與企業流程的認識。
2. 熟悉ERP系統之操作、單據建立、報表產生與閱讀...等能力。
3. 對ERP實務應用的流程、管理與內控精神有更深的體認。
4. 考取ERP正式認證。

適合對象

1. 計劃轉職
2. 待業準備
3. 想報考ERP證照
4. 想提升自我競爭力者

課程規劃



▶ 課程洽詢：Tel: (02) 8911-1688 Ext: 1049 Email: elearning@digiwin.com

欲知詳情，請點選右方QR Code留下聯絡方式，將由專人與您聯繫說明

詳細服務項目及內容說明以鼎捷雲市場網站/服務簡介所述為主

