

鼎新 | Workflow ERP GP
流程導向企業資源規劃系統

LRP接單式生產流程 MTO

課前提醒

1.環境介紹

洗手間/茶水間

2.課程進行方式

本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。

(教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！)

3.課後問卷與測驗

當天課後上網填寫問卷並測驗

學習地圖



系統基礎學習


- 製造實作演練班-生產循環



系統進階應用學習

- LRP接單式生產流程(MTO)
- LRP存貨式生產流程(MTS)
- LRP接單裝配生產流程(ATO)
- 預測長交期備料流程
- 進階實戰<<製造情境應用攻略>>

企業營運流程

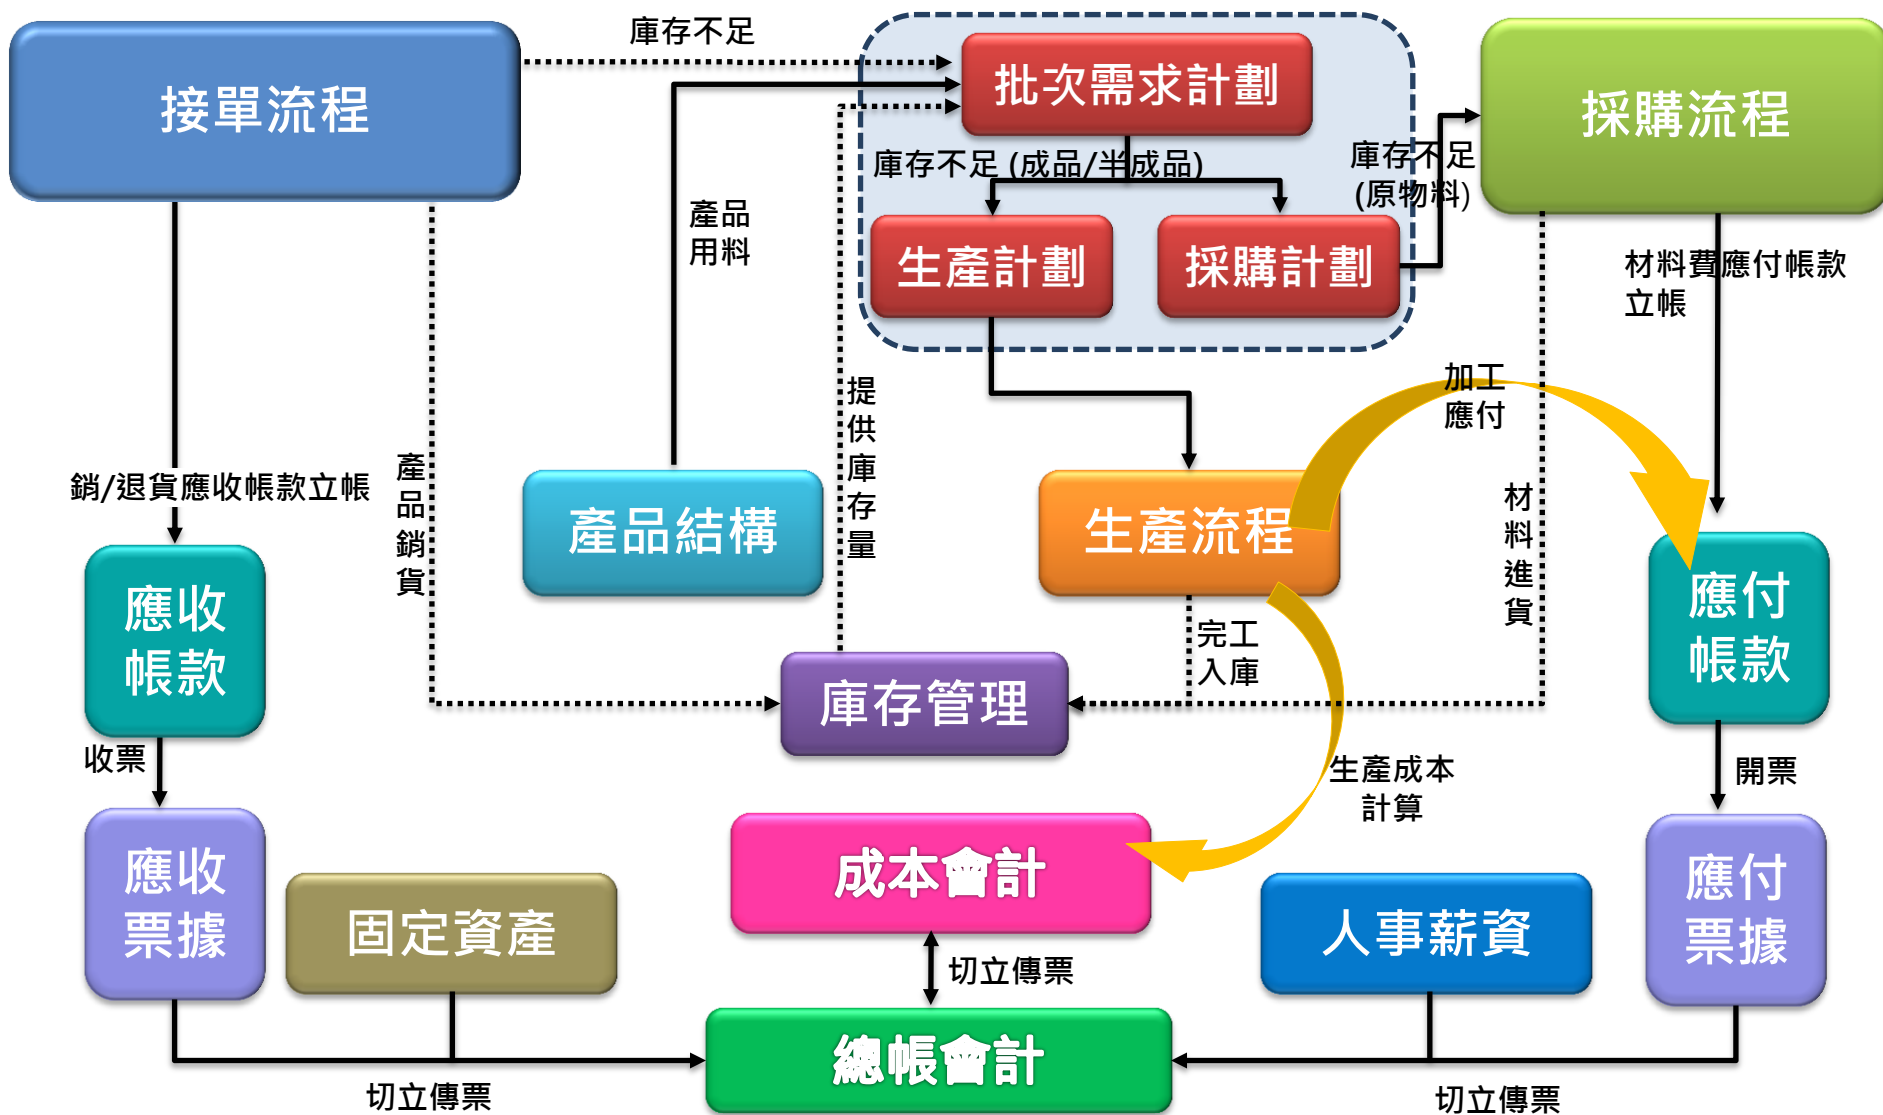

檢視類別 WF-環球的Menu

公司別 成功科技

程式代號

作業清單

WF-環球的Menu

- 主系統架構圖
- 電子表單工作匣
- 管理維護系統
- 基本資料管理系統
- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統

批次需求計劃系統

- 基本資料管理
- 資料維護管理
- 清單與明細表
- 報表列印
- 批次作業

- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統

▶▶ 批次需求計劃系統



課程大綱

一、何謂接單式生產(MTO)

二、名詞解釋

三、批次需求計畫邏輯說明

休息10分鐘

四、接單式生產流程



課程目標


- 1.清楚LRP名詞解釋
- 2.學會且能自行操作接單式生產流程

數位課程


系統別

批次需求計劃系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

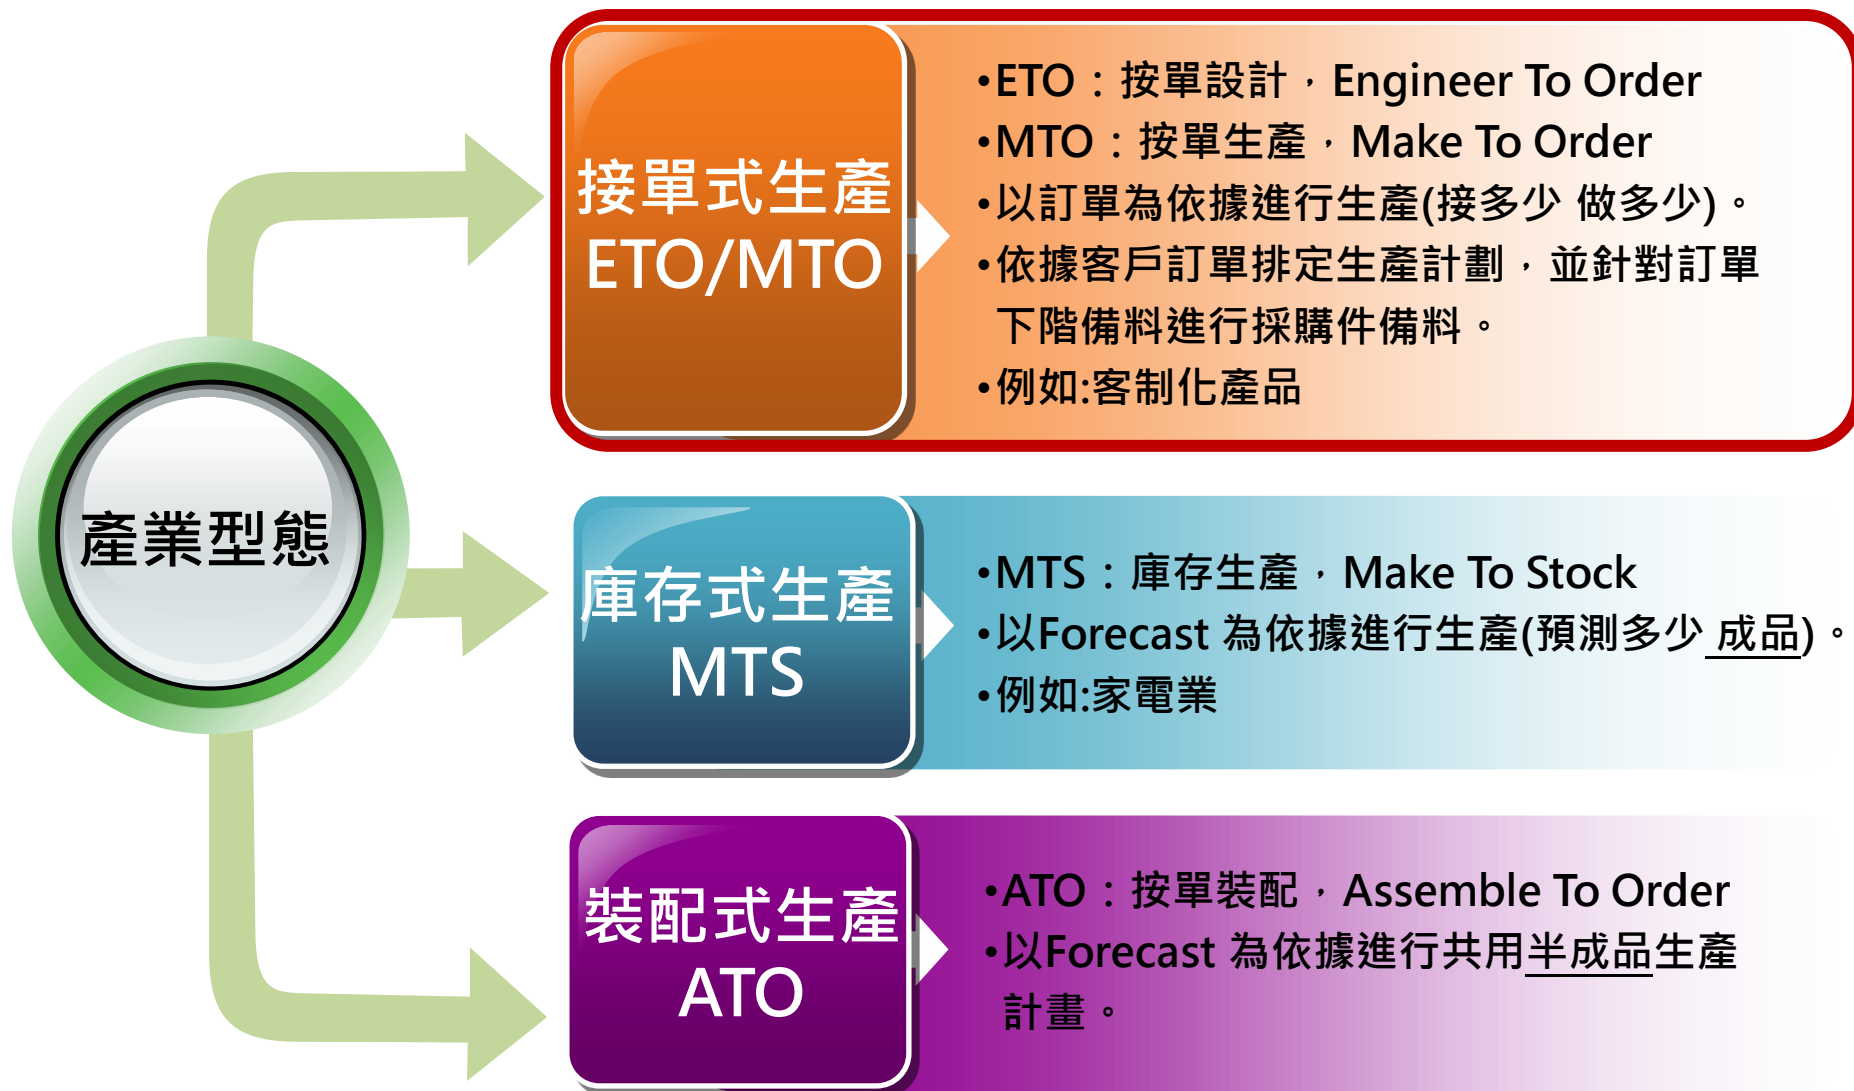


一、何謂接單式生產(MTO)?

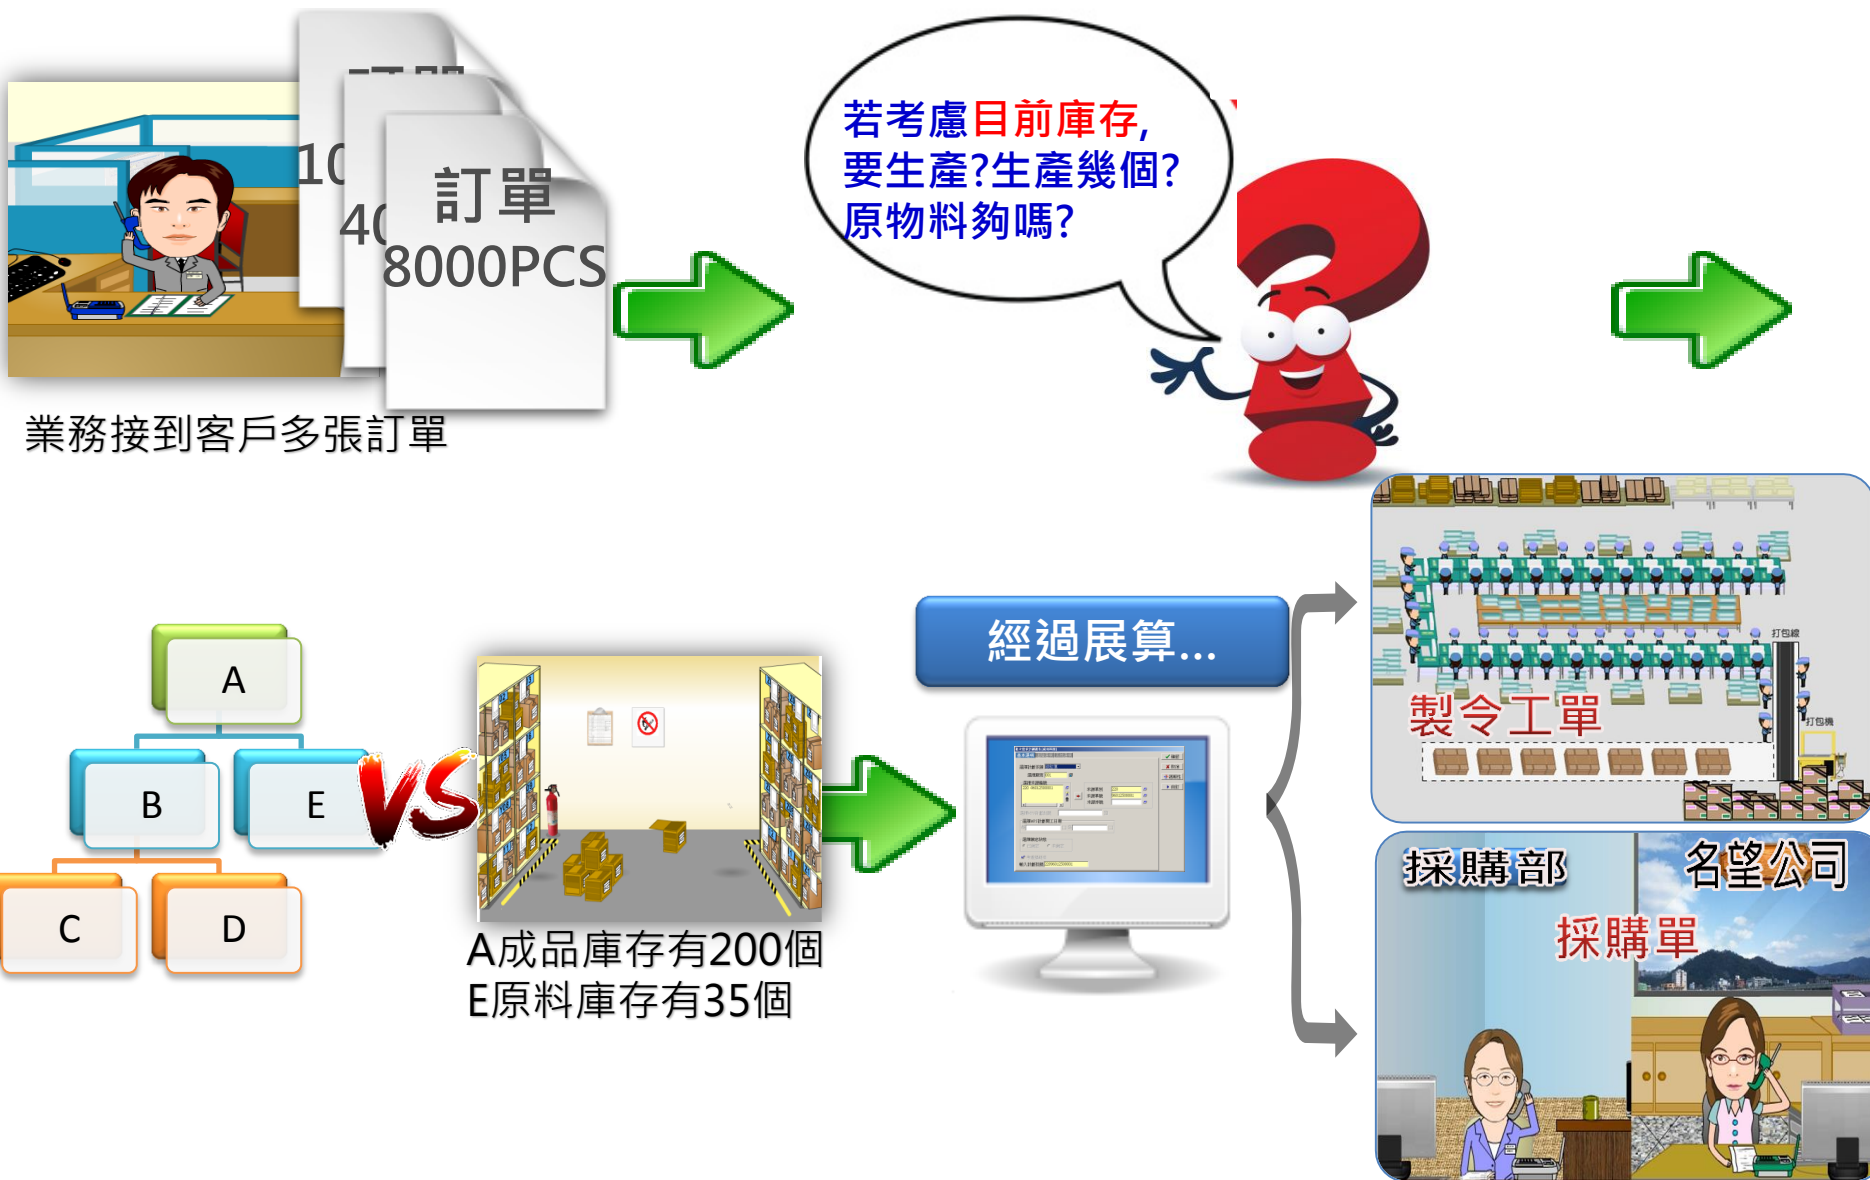

二、名詞解釋

以上述為例，有無考慮庫存量，生產及採購量將有不一樣的結果

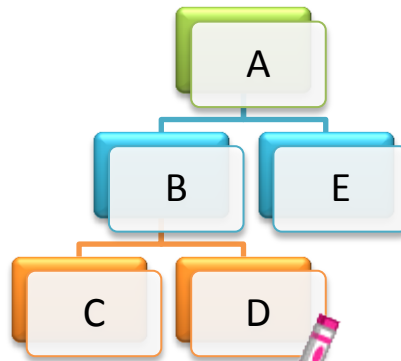

不考慮庫存量

A生產1000個
B生產1000個
C.D.E各採買1000個



A成品庫存有200個
E原料庫存有35個

考慮庫存量

A生產800個
B生產800個
C.D各採買800個
E採買_____個

對系統而言...

不考慮庫存量得出的結果稱為「毛需求」

考慮庫存量得出的結果稱為「淨需求」

三、批次需求計畫邏輯說明

毛需求

- 以需求數量為依據，完全**不考慮**「需求品號」的現有庫存量及十大量。
- 直接採實際需求量
- 若不考慮所有庫存量，展算時建議選擇毛需求

淨需求

≡

需求類

計劃銷售量
預計銷售量
預計領用量
計劃領用量

供給類

計劃生產量
計劃進貨量
預計生產量
預計進貨量
預計請購量
請拋採未確認量
現有庫存量

淨需求 = 需求(出庫) - 供給(入庫 + 庫存)
淨需求 > 0 ➔ 自製件(M)或託外加工件(S)產生生產計劃
採購件(P)產生採購計劃


十大量	說明	作業位置
計劃銷售量	未達成之銷售預測量 (預測數量 - 已受訂量)	訂單管理系統 \ 銷售預測建立作業
預計銷貨量	未結案訂單之未銷貨量 (訂單數量 + 贈備品量 - 已交數量 - 贈備品已交量)	訂單管理系統 \ 客戶訂單建立作業
計劃領料量	相依需求之需求量 (生產計劃維護上階主件的相依需求數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
預計領料量	未完工製令單身之應領未領料量 (需領用量 - 已領用量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
預計請購量	未更新之請購數量 (請購單已確認，未拋轉成採購單的數量)	採購管理系統 \ 請購單建立作業
預計進貨量	未結案採購單之未進貨量 (採購數量 - 已交數量)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
請拋採 未確認量	請購單已拋轉成採購單但未確認之採購數 (請注意，此種未確認的採購數量，必須要有相對應的「請購資料維護作業」的資料，也就是必須經由請購單來拋轉)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
預計生產量	未完工製令單頭之未生產量 (預計產量 - 已生產量 - 報廢量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
計劃生產量	生產計劃內之預計生產量 (生產計劃檔之生產數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
計劃採購量	採購計劃內之預計採購量 (採購計劃維護採購數量)	批次需求計劃系統 \ 採購計畫維護作業

三、批次需求計畫邏輯說明

訂單

品號：A
數量：500PCS
需求日：5/31

BOM用量資料：

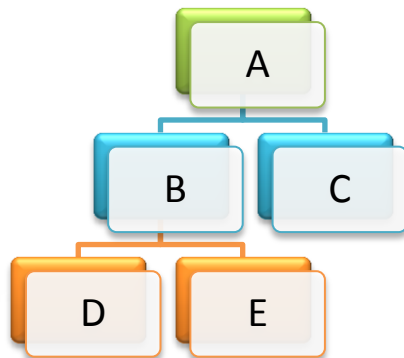

2018年5月						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

工廠行事曆：星期六、日休全天

品號	庫存數量	檢驗天數	固定前置天數	變動前置天數	批量	請填入數量
A	200	1	2	1	100	生產量_____
B	100	1	2	1	100	生產量_____
C	0(5/18預計進貨100PCS)	1	2	1	100	採購量_____
D	300	1	2	1	100	採購量_____
E	200	1	2	1	100	採購量_____

若以淨需求展算，A、B、C、D、E各需要生產或採購幾個？
何時生產/採購？

三、批次需求計畫邏輯說明(A成品)

A成品資料

客戶訂單：數量500PCS,需求日5/31


庫存數量：200PCS

檢驗天數：1天

固定前置天數：2天

變動前置天數：1天

批量：100

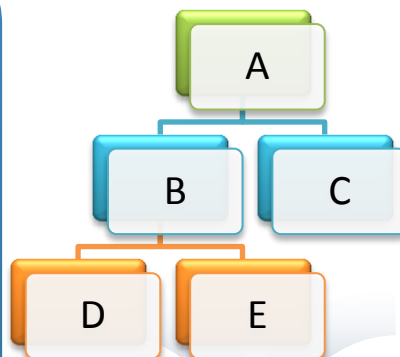

2018年5月						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

量的推算

A 成品計劃生產：500 - 200 = 300 (PCS)

日期的推算

預計完工日：預測需求日(5/31)-入庫天數(1天)-檢驗天數(1天) = 5/29

生產前置天數 = $\left(\frac{\text{預計產量}}{\text{批量}} \times \text{變動前置天數} \right) + \text{固定前置天數}$


$$= \left(\frac{300}{100} \times 1 \right) + 2 = 5$$

預計開工日：預計完工日(5/29) - 前置天數(5天) = 5/22

三、批次需求計畫邏輯說明(B原料)

B-材料

相依需求：300PCS
 庫存數量：100PCS
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

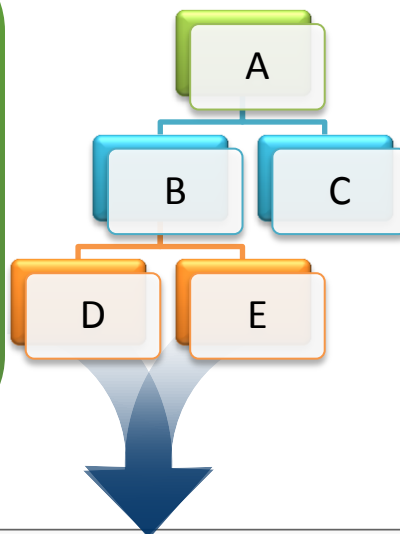

2018年5月						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

量的推算

A 成品計劃生產：300 (PCS)→ 需要 B 半成品 300PCS
 →B 半成品計劃生產：300 - 100 = 200 PCS

日期的推算

B 半成品的預計領料日=上階 A 成品開工日(5/22)

B 半成品的預計完工日= 預計領料日(5/22) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 5/18

生產前置天數 = (預計產量/批量×變動前置天數) + 固定前置天數
 = (200/100× 1) + 2 = 4

預計開工日 = 預計完工日(5/18) - 前置天數(4天) = 5/14

三、批次需求計畫邏輯說明(C原料)

C-材料

相依需求：300PCS

庫存數量：0


檢驗天數：1天

固定前置天數：2天

變動前置天數：1天

批量：100

預計進貨量：100

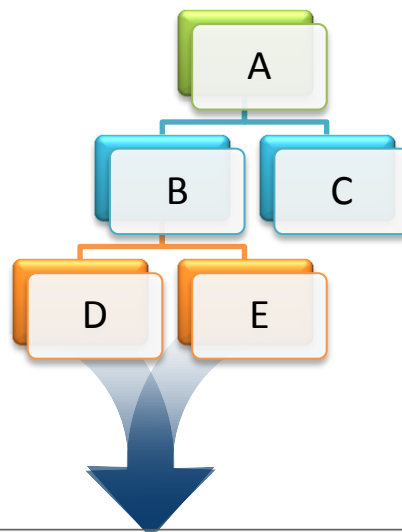

2018年5月						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

量的推算

A 成品計劃生產：300 (PCS)→ 需要 C 原料 300PCS

→C 原料計劃採購：300 - 100(預計進貨量) = 200 PCS

日期的推算

C 原料的預計領料日=上階 A 成品開工日(5/22)

C 原料的預計交貨日= 預計領料日(5/22) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 5/18


採購前置天數 = (預計採購量/批量×變動前置天數) + 固定前置天數
 = (200/100× 1) + 2 = 4

預計採購日 = 預計交貨日(5/18) - 前置天數(4天) = 5/14

三、批次需求計畫邏輯說明(D原料)

D-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：300
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

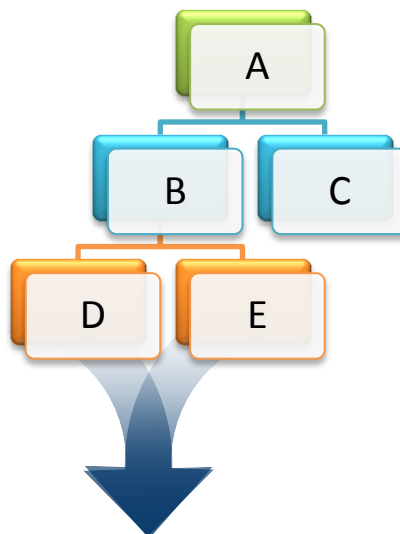

2018年5月						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS)→ 需要 D 原料 200PCS

→D 原料計劃採購：200-300(庫存量)=-100

淨需求 < 0 , 因此不用採買


日期的推算



三、批次需求計畫邏輯說明(E原料)

E-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：200
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100

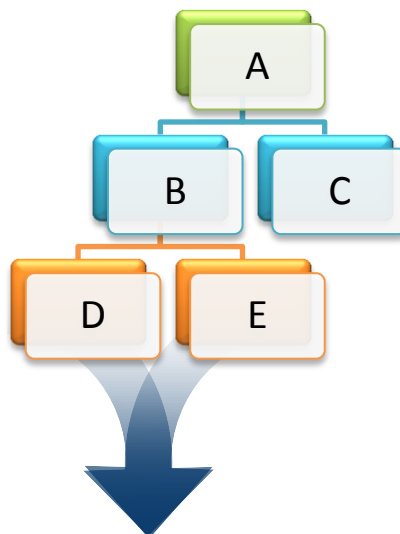

2018年5月						
日	一	二	三	四	五	六
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS)→ 需要 D 原料 200PCS
 →D 原料計劃採購：200(庫存量)-200=0
 淨需求 =0 ， 因此不用採買

日期的推算






批次需求計劃執行前置作業

順序	系統別	對應作業	必要性
1	基本資料管理系統	廠別資料建立	✓
2		庫別資料建立	✓
3		生產線資料建立	✓
4		職務類別建立	△
5		行事曆建立	✓
6	庫存管理系統	品號資料建立作業	✓
7	產品結構系統	BOM用量資料建立	✓
8	批次需求計劃系統	批次計劃設定檔	✓

註：△表示建議維護
✓表示一定要先維護

四、接單式生產流程

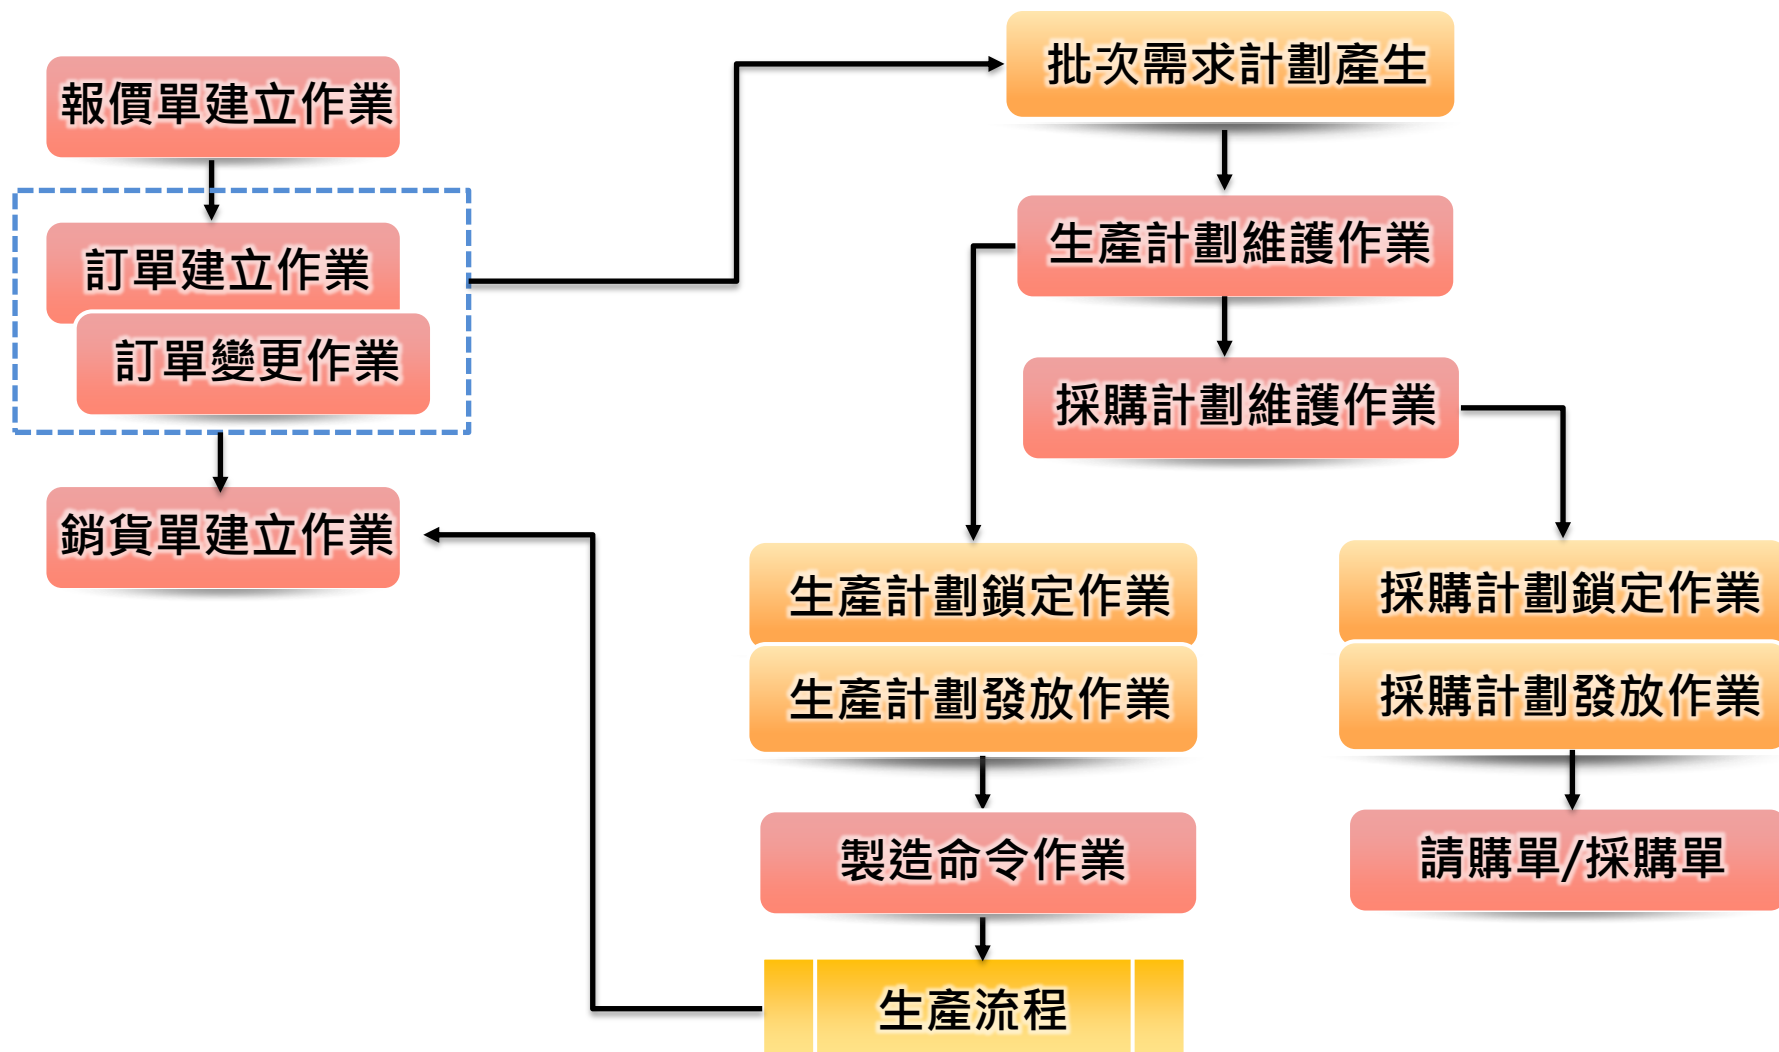

接單式生產案例-成功企業公司背景

主要營業項目是數位相機及相關產品，

除了銷售自行生產：

數位相機-SL系列/SV系列、

數位相機-大眾型、

數位相機-簡易型...等產品，

另外也有提供客戶數位相機 - 高手玩家型、
專業型及自動對焦數位相機...等外購商品。





公司當月5日，接到客戶「1008復興公司」的訂單
購買品號430001 數位相機-SV系列，數量100台，
單價15,000元，預計當月25日交貨。

針對此訂單，生管人員想了解公司庫存是否足夠？
需要生產？要生產多少？需要採購原物料？

何時要下採購單？



品號基本資料&BOM用量


品號	品名	品號屬性	補貨政策	前置天數	檢驗天數	庫存量
430001	數位相機-SV系列	M	L	2	1	20
320004	PCBA-Assembly Main	M	L	3	0	200
320005	PCBA-Assembly Sensor	S	L	3	0	50
390001	相機包材組	Y	R	0	0	0
110012	主開關連動板 SV系列	P	L	8	2	0
150001	包裝盒	P	R	1	0	9655
150007	包裝盒貼紙SV系列	P	R	1	0	1000
190006	影像軟體光碟-Ver 2.0 (當月15日預計進貨500PCS)	P	L	3	0	0

品號屬性：

M：自製件
S：託外加工件
P：採購件
Y：虛設件


補貨政策：

L：依LRP需求
R：依補貨點

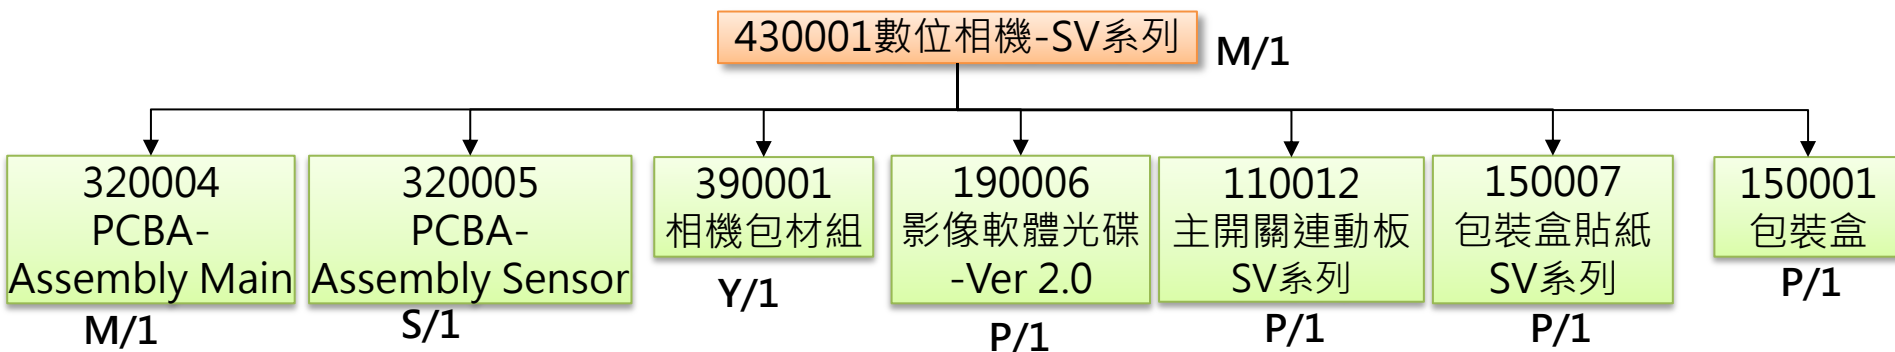

註：半成品(320004)下階材料之補貨政策階為R：依補貨點，本次計劃不納入考量。 23

四、接單式生產案例

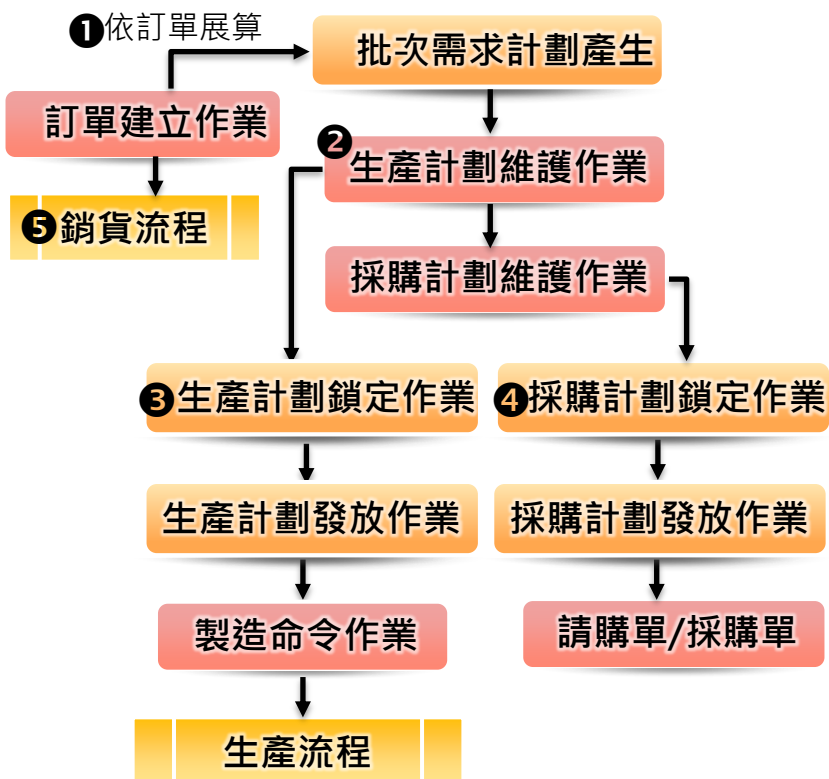

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。



詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別	220	☐ 國內訂單	單據日期	2018/05/05	☐	拋轉狀態	N:未拋轉
訂單單號	20180505002		客戶代號	1008	☐ 復興公司	訂單日期	2018/05/05
流程代號		☐	版次	0000	☐ 不控管信用額度	確認者	DS
收入遞延天數	0					EBO拋轉狀態	不需拋轉


來源：
客戶訂單

交易資料一	交易資料二	送貨資料	國外訂單一	國外訂單二	國外備註
部門代號	30	☐ 業務部門	稅別碼	S05	☐ 銷項三聯式發票-應稅外加
業務人員	301	☐ 孫業務	課稅別	2:應稅外加	☐ 單身多稅率
出貨廠別	001	☐ 台北廠	營業稅率	5.000%	傳送次數
交易幣別	NTD	\$	☐ 訂金分批		列印
匯率	1	\$	訂金比率	0.00%	簽核狀態
客戶單號			付款條件	2D1	☐ 結帳後一星期收款 60天票期
			價格條件		

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	預交日	類型	贈品量	贈品已交量	備品量	備品
0001		430001	數位相機-SV系列	SV1001	1A	成品倉	100	0	2018/05/25	1.贈	0	0	0	

須經主管確認並有完整的預計交貨日期

訂單金額	1,500,000	總數量	100
訂單稅額	75,000	總毛重(Kg)	0
合計	1,575,000	總材積(CUFT)	0



詳細欄位 資料瀏覽

採購單別 33A ☐ 國內採購單 單據日期 2018/05/01 ☐
 採購單號 20180501002 供應廠商 1001 ☐
 流程代號 ☐ 三星公司
 版次 0000

拋轉狀態 N:未拋轉
 採購日期 2018/05/01
 確認者 DS 系統
 EBO拋轉狀態 不需拋轉



來源：
採購單

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 ☐ 台北廠 列印格式 1:中文 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 採購人員 401 ☐ 李採購 運輸方式 ☐
 交易幣別 NTD \$ 匯率 1 \$ ☐ 訂金分批 訂金比率 0.00%
 稅別碼 P05 ☐ 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 備註 ☐ 列印 0 傳送次數 0 ☐ 單身多稅率
☐ EBC確認碼 EBC採購單號 ☐ EBC採購版次 ☐ 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	採購單價	預交日	營業稅
0001	9.其	2.正	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		1C	原料倉	500	0	0	pcs	20	2018/05/15	5.0

須經主管確認並有完整的預計交貨日期

採購金額 10,000 稅額 500 金額合計 10,500
 數量合計 500

動手做做看!

客戶訂單建立作業
採購單建立作業

案例操作：

- 1.將當月5日復興公司客戶訂單作確認。
- 2.將當月1日三星公司的採購單作確認。

客戶訂單建立作業(COP106)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2018/05/05
 訂單單號 20180505002 客戶代號 1008 復興公
 流程代號 版次 0000 不控管信用額
 收入遞延天數 0

交易資料一 交易資料二 送貨資料 國外訂單一

部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05
 業務人員 301 孫業務 課稅別 2:應稅
 出貨廠別 001 台北廠 營業稅率
 交易幣別 NTD 訂金分批
 匯率 1 訂金比率 0.00%
 客戶單號 付款條件 2D1
 價格條件

序號	業務品號	品號	品名	規格	庫別	庫別名
0001		430001	數位相機-SV系列	SV1001	1A	成品倉

訂單金額 1,500,000 總數量
 訂單稅額 75,000 總毛重(Kg)
 合計 1,575,000 總材積(CUFT)

瀏覽 單身資料筆數: 1 430001 數位相機-SV系列

採購單建立作業(PUR107)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2018/05/01
 採購單號 20180501002 供應商 1001
 流程代號 三星公司 確認者 DS 系統管理者
 版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽


廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 採購人員 401 李採購 運輸方式
 交易幣別 NTD 匯率 1 訂金分批
 稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率
 EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	採購單價	預交日	營業稅
0001	9.其	2.正	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		1C	原料倉	500	0	0	pcs	20	2018/05/15	5.0

採購金額 10,000 稅額 500 金額合計 10,500
 數量合計 500

瀏覽 單身資料筆數: 1 190006 影像軟體光碟-Ver 2.0

四、接單式生產案例

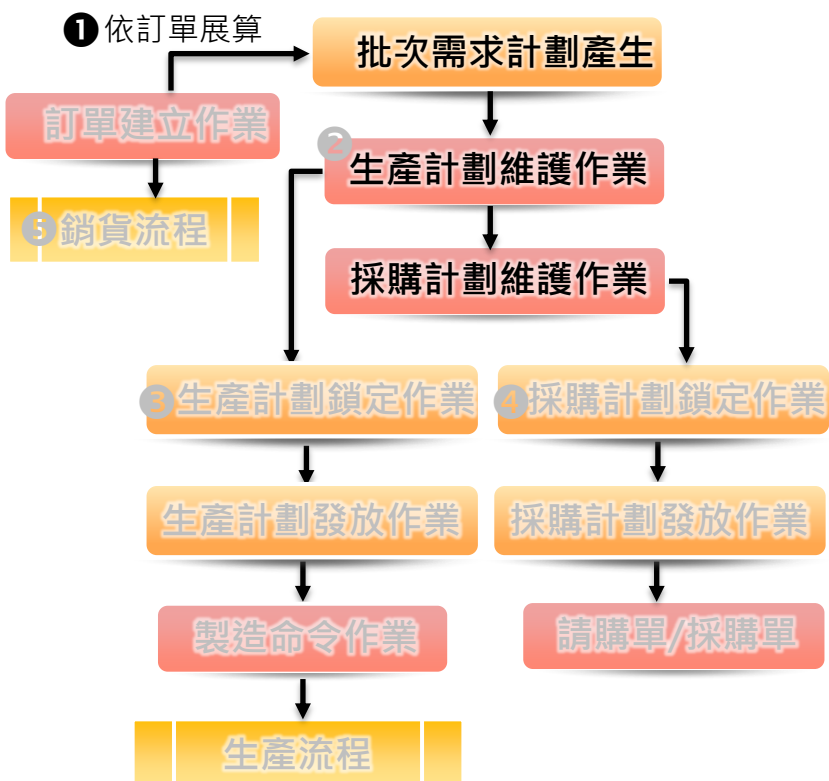

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。 <由講師示範操作>

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 系統+作業別
 - 主系統架構圖
 - 電子表單工作匣
 - 管理維護系統
 - 基本資料管理系統
 - 庫存管理系統
 - 產品結構管理系統
 - 基本資料管理
 - 日常異動處理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 料件用量資料複製作業
 - 元件資料整批修改作業
 - 失效元件整批刪除作業
 - 元件序號重排
 - 低階碼計算更新作業
 - 標準成本計算更新作業
 - BOM 自動請購作業產生
 - 取替代料件整批修改作業
 - 產品結構單據清除作業

產品結構管理系統

低階碼計算更新作業(BOMB05)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇主件品號

☒ 區間選擇

起

迄

材料用量複製

元件整批修改

✓ 確認

✗ 取消

↻ 週期性

▶ 自訂

步驟一：低階碼計算更新

低階碼計算更新作業

標準成本計算更新作業

品號基本資料
庫存管理系統
異動單據建立訂單管理系統
客戶訂單/銷貨單製令管理系統
製造命令建立

作業位置：產品結構管理系統 \ 批次作業 \ 低階碼計算更新
系統依品號低階碼的順序，展算批次需求計劃之『生產計劃』
及『採購計劃』。

作業清單

基本資料管理系統
行事曆建立作業

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

依據訂單為計劃來源

1 選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

2 選擇來源編號

220 -20180505002

來源單別 220

來源單號	20180505002
------	-------------

來源序號

✓ 確認


X 取消

② 週期性

► 自訂

選擇要列入計算的計劃來源：

若要將整張訂單需求列入推算，在左方來源編號直接選取；若僅針對訂單中某幾筆品項進行推算，可從右方選擇來源單別、單號、序號，點選  帶到左方的來源編號。

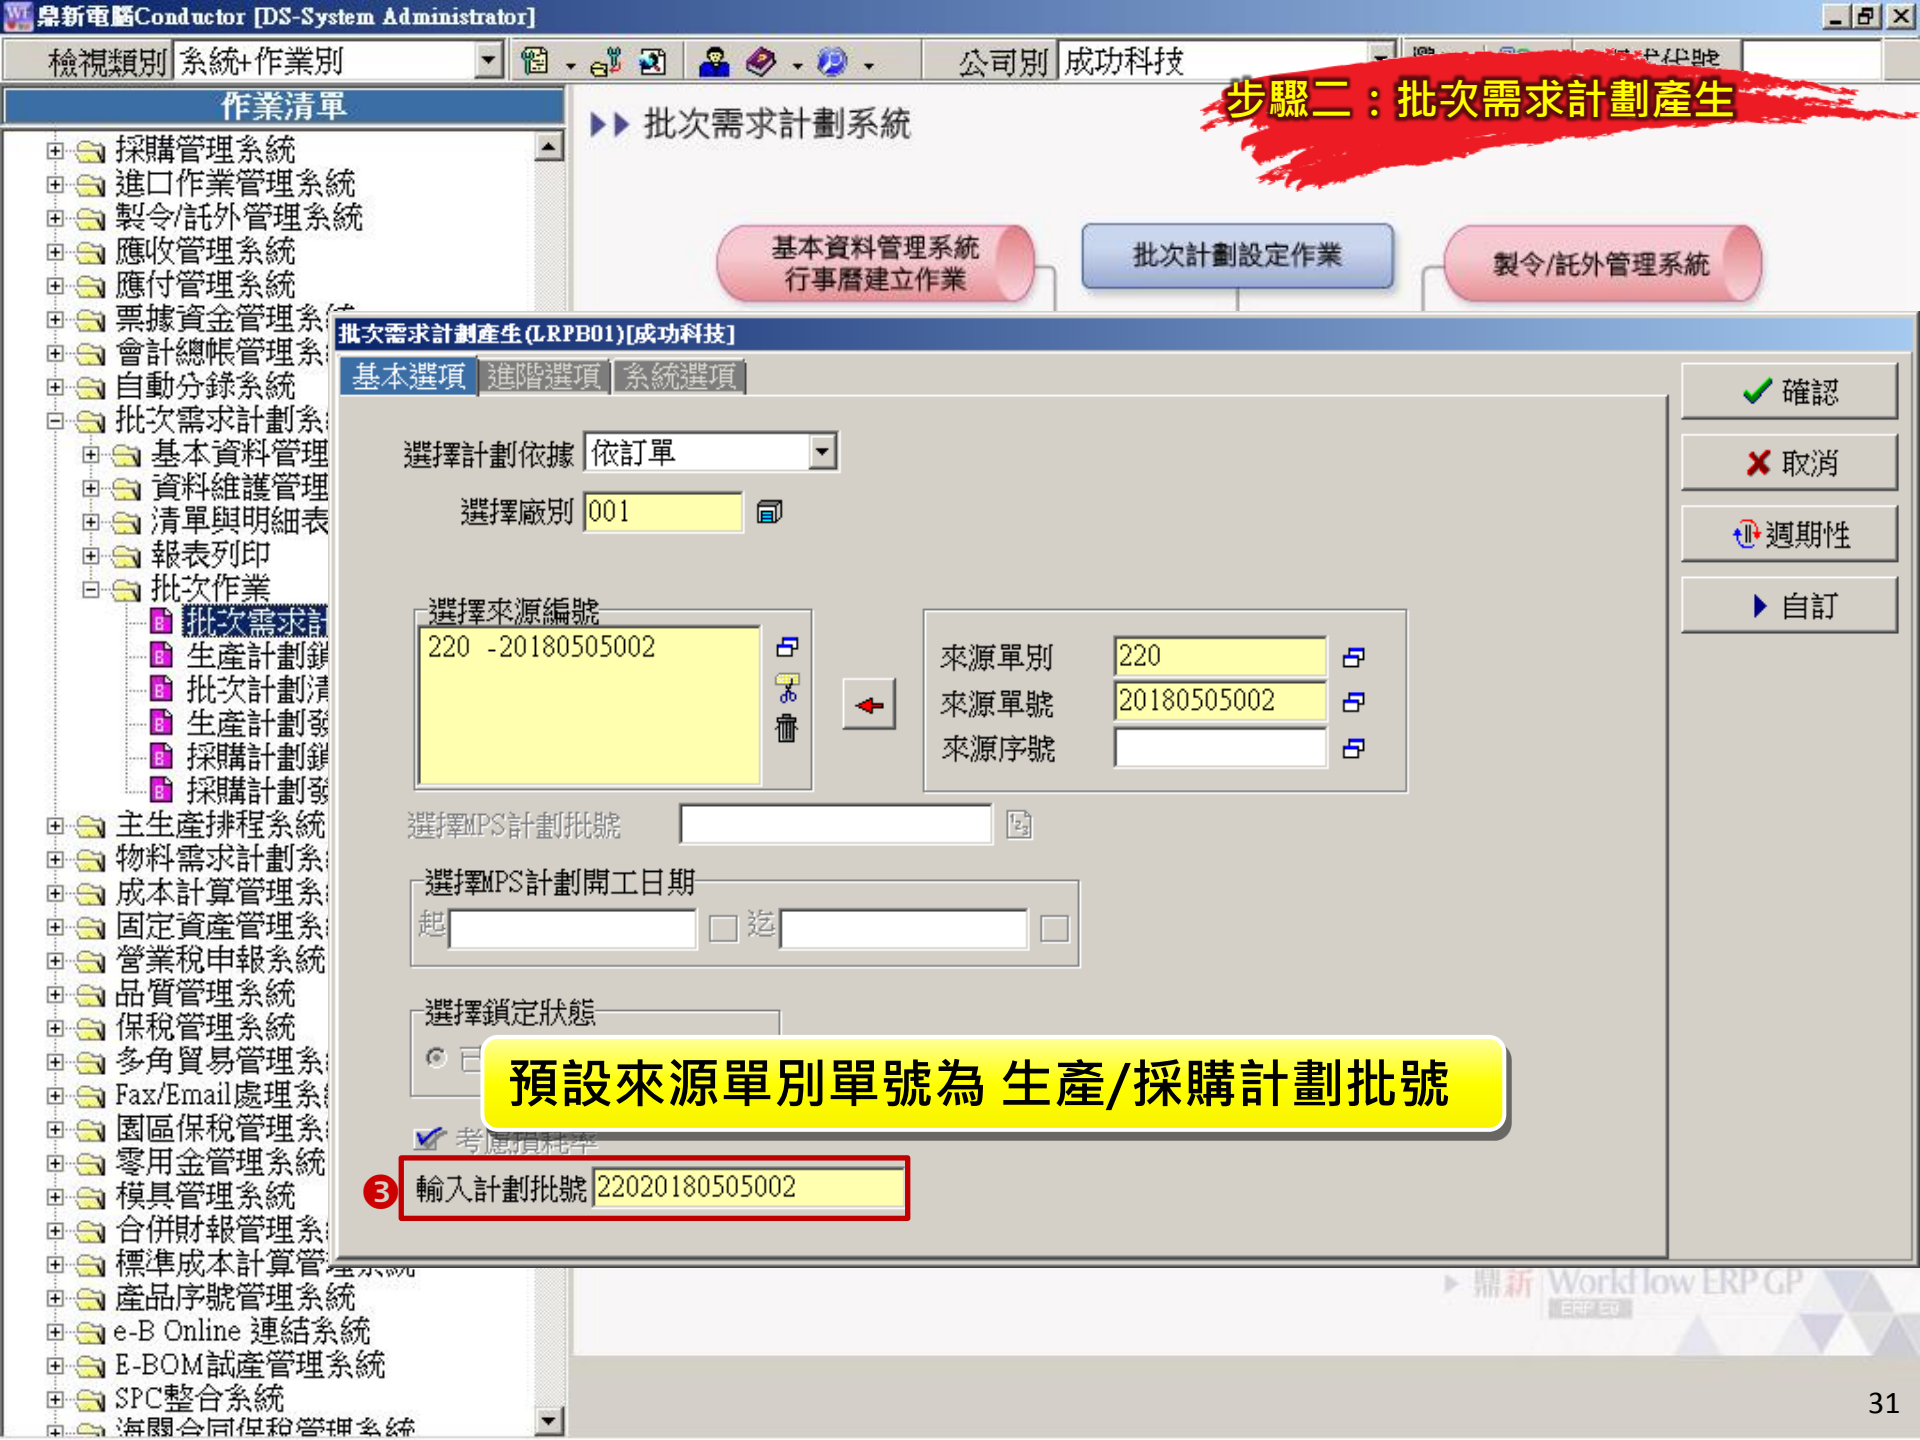

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

▶▶ 批次需求計劃系統

步驟二：批次需求計劃產生

基本資料管理系統
行事曆建立作業

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

批次需求計劃產生 (LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據 依訂單

選擇廠別 001

選擇來源編號

220 - 20180505002

來源單別

220

來源單號

20180505002

來源序號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起

迄

選擇鎖定狀態

預設來源單別單號為 生產/採購計劃批號

考慮損耗率


3 輸入計劃批號 22020180505002

確認

取消

週期性

自訂

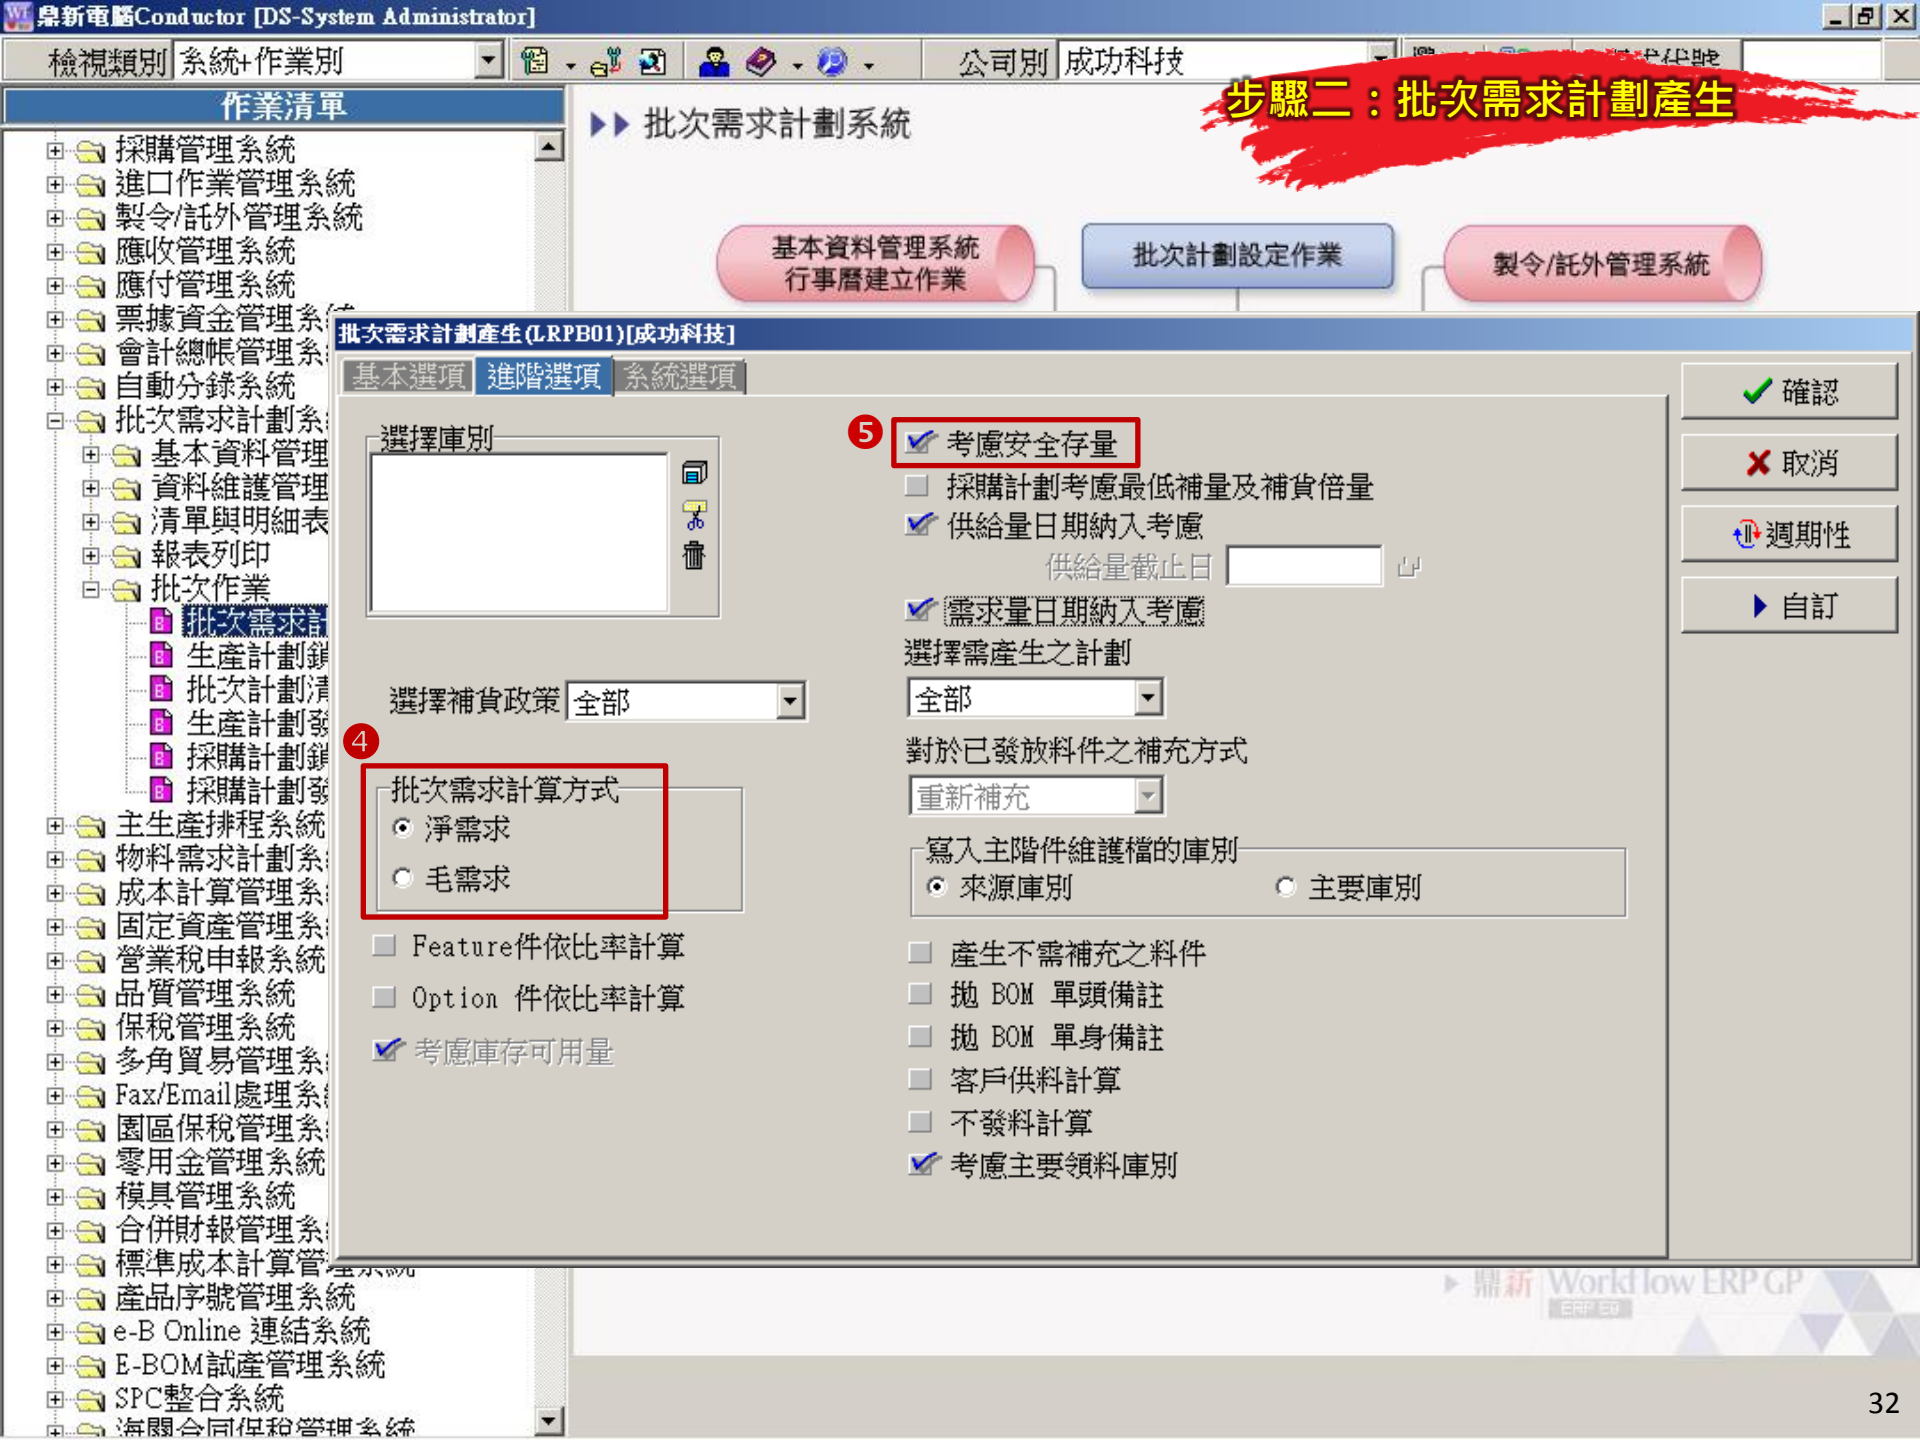

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

▶▶ 批次需求計劃系統

步驟二：批次需求計劃產生

基本資料管理系統
行事曆建立作業

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

批次需求計劃產生 (LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature 件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

5 ☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☒ 需求日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別

☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂

重點說明

◆ 批次需求計算方式：淨需求、毛需求。

(1) 選擇毛需求，則以原需求數量展BOM算出生產/採購。

(2) 選擇淨需求，以(需求數量 - 庫存可用量)的結果展BOM，計算出生產/採購量，且只補足該批**最大補量**。

註：

最大補量概念：採淨需求計算時，計算出來的需求數量不可 > 採毛需求計算出來的數量，最多只可與毛需求的數量相等。

例如訂單需求100PCS，現有庫存量20PCS，安全存量設定為30PCS，理論上總需求為110PCS，採淨需求計算時，計算出來的需求只有100PCS，不可大於毛需求的數量。

▶▶ 批次需求計劃系統

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

[illegible]

選擇補貨政策 全部

■ 批次需求計算方式

- ☒ 淨需求
- ☐ 毛需求

- ☐ Feature件依比率計算
☐ Option 件依比率計算
☒ 考慮庫存可用量

- ☒ 考慮安全存量

☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日 山

- ☒
- 需求量日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

- ☒
- 來源庫別
- ☐
- 主要庫別

- ☐ 產生不需補充之料件
- ☐ 拋 BOM 單頭備註
- ☐ 拋 BOM 單身備註
- ☐ 客戶供料計算
- ☐ 不發料計算
- ☒ 考慮主要領料庫別

✔ 確認


X 取消

周期性

► 自訂

重點說明

- ◆ 供給量日期/需求量日期納入考慮:
計算可用量時，若預計**供給**或**需求**的日期，晚於該批的需求日，是否要納入可用量計算？
 - ☑ 表示在「**考慮**」日期因素下，料件需求日期之後的需求量/供給量「**不納入**」計算。
 - ☒ 表示在「**考慮**」日期因素下，料件需求日期之後的需求量/供給量「**納入**」計算。

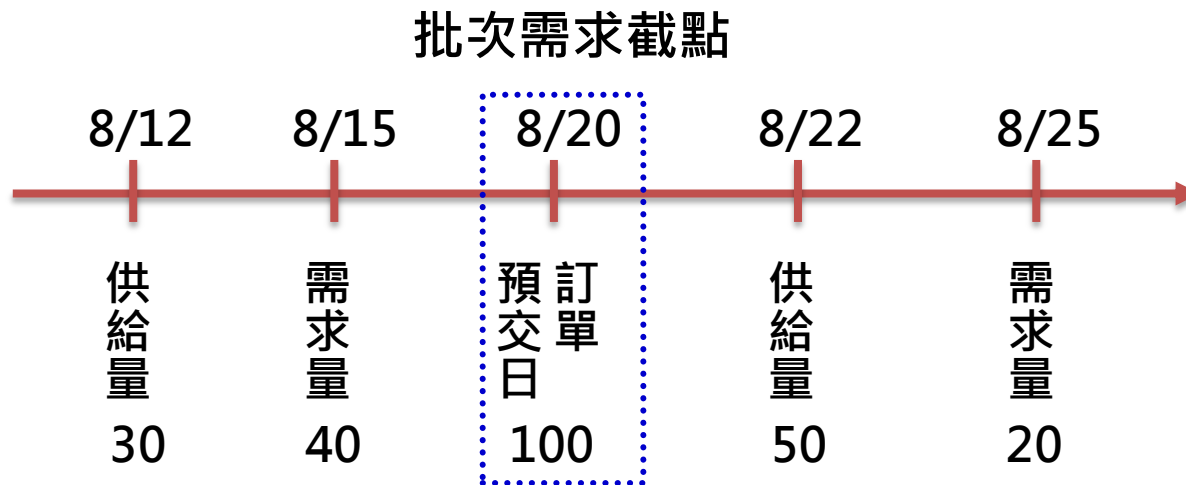

重點說明




執行「淨需求」時，

☒ 供給量日期納入考慮

☒ 需求量日期納入考慮

選項的意義？

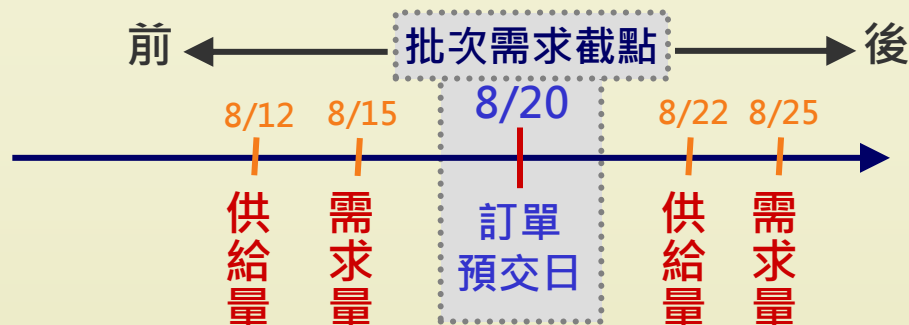

1

☐ 供給量日期納入考慮

☐ 需求量日期納入考慮

2

☒ 供給量日期納入考慮

☐ 需求量日期納入考慮

3

☐ 供給量日期納入考慮

☒ 需求量日期納入考慮

4

☒ 供給量日期納入考慮

☒ 需求量日期納入考慮

零庫存

特點：達供需平衡的水準。

缺點：如果截點後的供應來不及提前，就會有斷料風險。

特點：截點後的需求可提前備貨。

缺點：若提前備貨的需求被取消時，將造成閒置庫存增加。
如果有購買LRP建議用此項設定


特點：計劃截點後的供給，可提前供應此次的需求。

缺點：若供給未如預期在需求截點前補齊時，將有斷料風險。

插單型

特點：只考慮需求截點時的供需，適合接單式生產，或針對插單的訂單做計劃。

缺點：未來若有大批量入出，庫存量可能激增，或備貨不及。
同時有購買MRP/LRP建議此設定

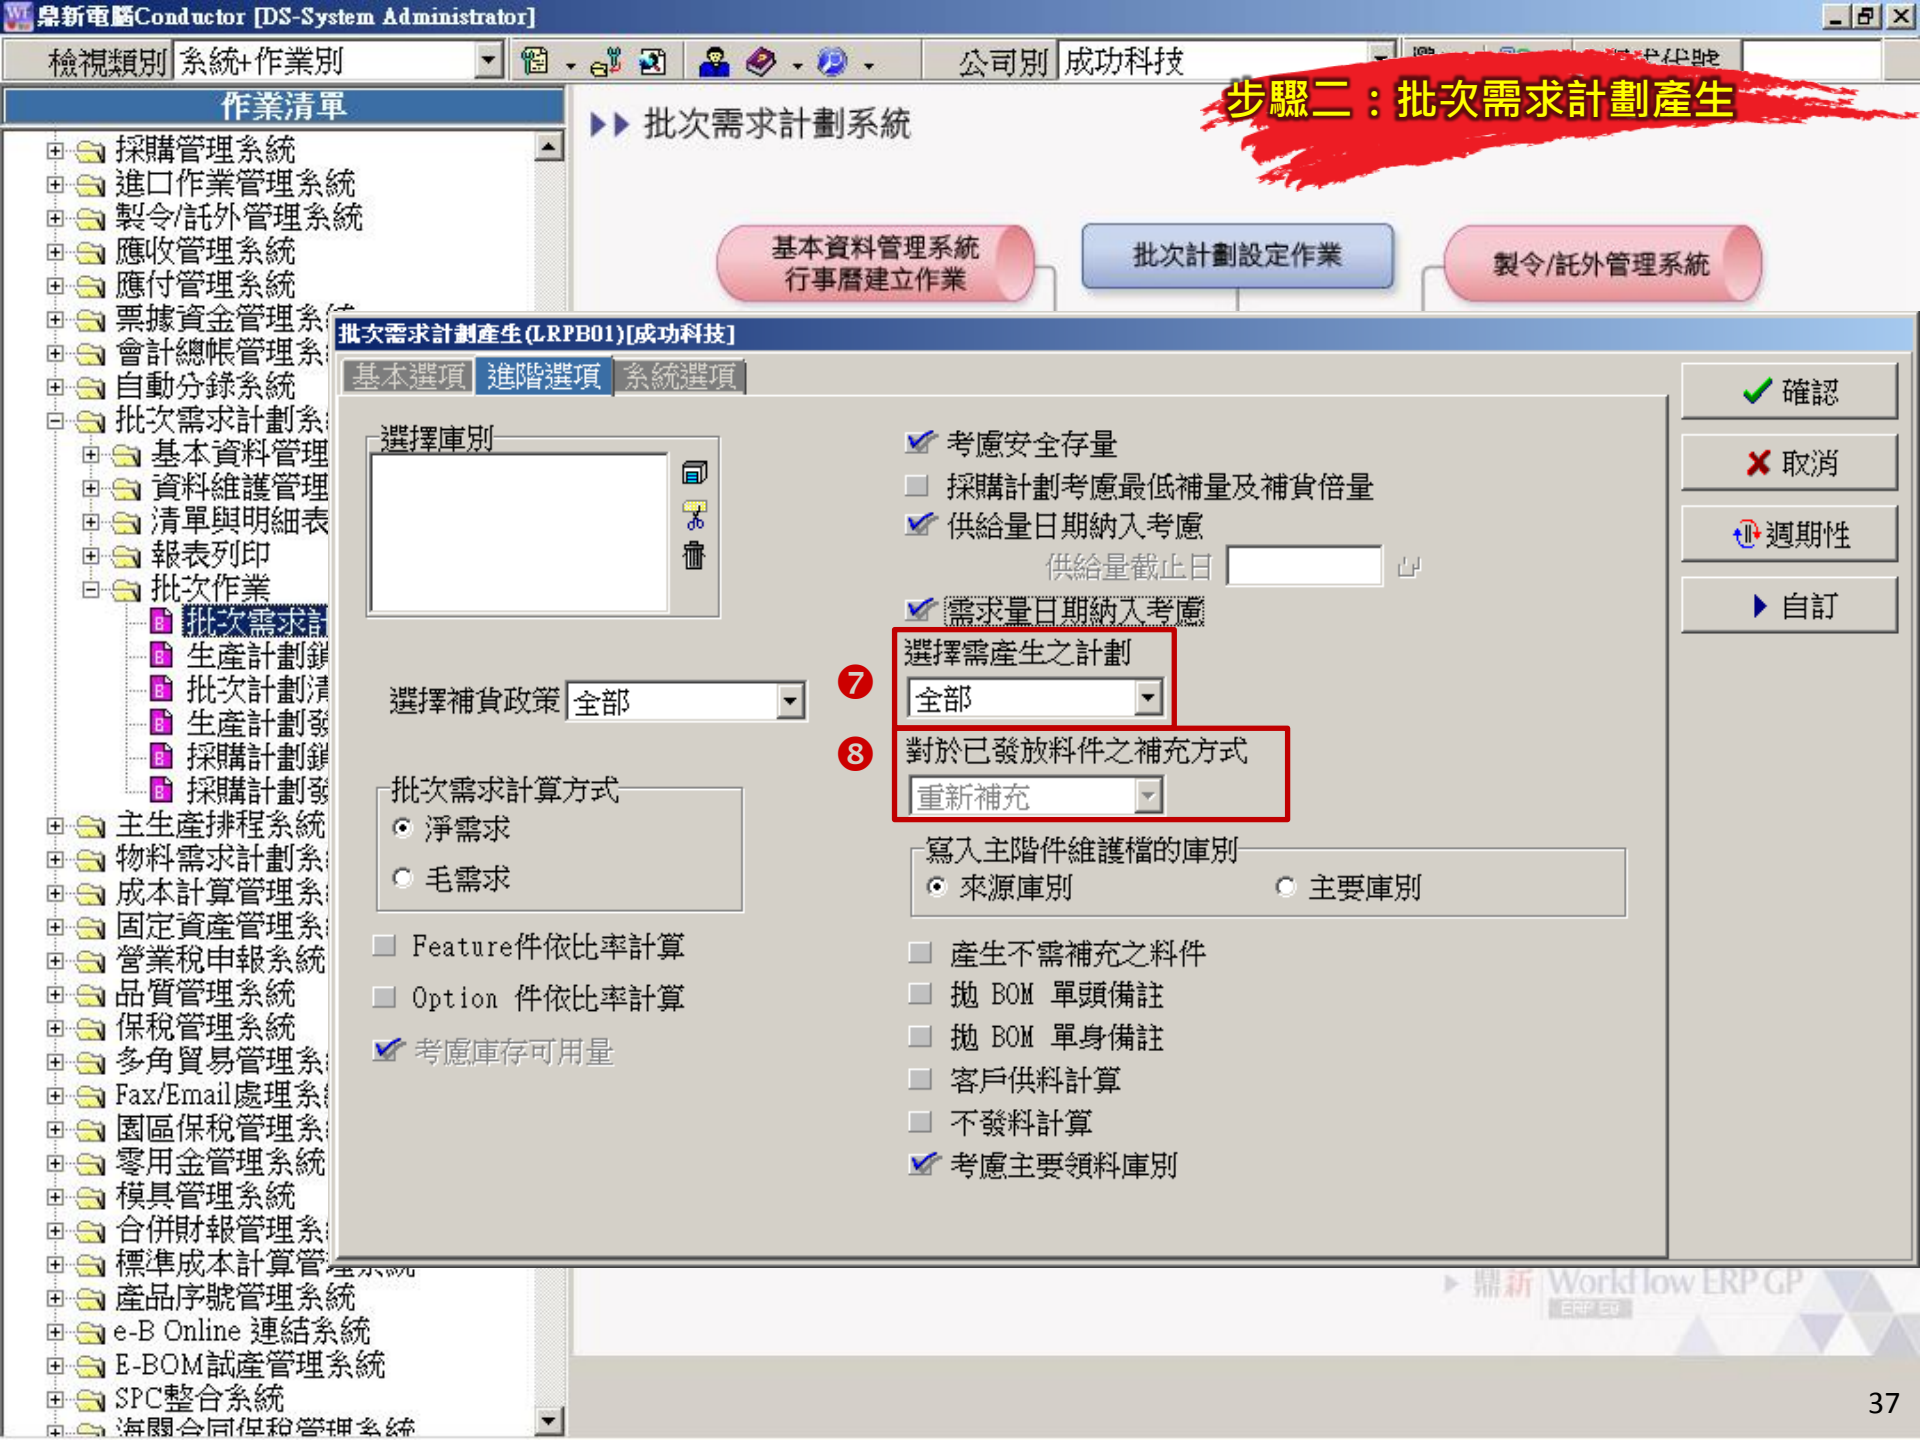

步驟二：批次需求計劃產生

批次需求計劃系統

基本資料管理系統
行事曆建立作業

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

批次需求計劃產生 (LRPB01) [成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式

☒ 淨需求

☐ 毛需求

☐ Feature 件依比率計算

☐ Option 件依比率計算

☒ 考慮庫存可用量

☒ 考慮安全存量

☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

☒ 需求日期納入考慮

選擇需產生之計劃

全部

對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別

☐ 主要庫別

☐ 產生不需補充之料件

☐ 拋 BOM 單頭備註

☐ 拋 BOM 單身備註

☐ 客戶供料計算

☐ 不發料計算

☒ 考慮主要領料庫別

確認

取消

週期性

自訂

重點說明

◆選擇需產生之計劃：可選擇「生產計劃」、「採購計劃」或「全部」。

- (1)建議**第一次執行計劃產生**時，選擇「**全部**」（產生**生產計劃及採購計劃**）；或是選擇「**生產計劃**」，執行完後再以產生出來之生產計劃為來源，選擇「採購計劃」來產生採購計劃。
- (2)**第一次產生計劃時，不可以直接選「採購計劃」**，因為系統是依生產計劃的內容來產生採購計劃。
- (3)「品號資料建立作業」之品號屬性若為：
M(自製件)或**S**(託外加工件)→產生**生產計劃**；
P(採購件)→產生**採購計劃**。

◆已發放料件補充方式：選擇**毛需求**計算方式才會啟用。

例如：訂單需求數量100，採毛需求計算並已發放製令單與採購單，後續因訂單變更追加數量為150，原訂單再次執行批次需求計劃產生時可選擇「不再補充」、「重新補充」或「補充差額」。



步驟三：檢視批次生產計劃維護

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

系統產生

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18		1B	半成品倉	30	ea	2018/05/15		2018/05/15	511
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23		1A	成品倉	80	ea	2018/05/21		2018/05/21	510

①

②

③

④

⑤

➤ 完工日 = 計劃來源之(需求日-檢驗天數-1)

➤ 開工日 = 完工日-生產前置天數

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

系統
產生

品號	品名
320005	PCBA-Asse
430001	數位相機

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[...]	
庫存量	50.000
安全存量	0.000
預計進貨	0.000
預計請購	0.000
請拋採未確認	0.000
預計生產	0.000
預計銷售	0.000
預計領用	0.000
計劃採購	0.000
計劃生產	0.000
計劃銷售	0.000
計劃領用	80.000
毛需求量	80.000
已發放量	0.000

原始需求量

庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單
1B	半成品倉	30	ea	2018/05/15		2018/05/15	511
1A	成品倉	80	ea	2018/05/21		2018/05/21	510

發放過的計劃批號，重新產生時，
顯示上次已發放量供參考。



步驟三：檢視批次生產計劃維護

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

系統產生

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購
511	託外製令單	3004	訊達公司		00:00:00	NTD	0	☐	1: 訂單	220	20180505002	0001	
510	廠內製令單	601	製一課		00:00:00		0	☐	1: 訂單	220	20180505002	0001	

6

7

8

- 預設「BOM用量資料建立作業」的「製令單別」，可修改。生產計劃依此單別發放成製令單。
- 生產品號屬性為「M:自製件」，預設品號資料的「生產線別」。
- 生產品號屬性為「S:託外加工件」，預設品號資料的「主供應商」及預設加工計價資料的最新「加工單價」。



步驟三：檢視批次生產計劃維護

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

系統產生

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購
511	託外製令單	3004	訊達公司		00:00:00	NTD	0	☐	1: 訂單	220	20180505002	0001	
510	廠內製令單	601	製一課		00:00:00		0	☐	1: 訂單	220	20180505002	0001	

9

10

- 若生管人員檢視此生產計劃無誤，勾選鎖定以利辨識與發放製令。
- 可追溯此生產計劃的來源依據(如：訂單)。

步驟三：檢視批次生產計劃維護

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

系統產生

11

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號	採購
511	託外製令單	3004	訊達公司		00:00:00	NTD	0	☐	1: 訂單	220	20180505002	0001	
510	廠內製令單	601	製一課		00:00:00		0	☐	1: 訂單	220	20180505002	0001	

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

材料品號	品名	規格	需領用量	單位	預計領料日	庫別	庫別名稱
120001	電阻		120	pcs	2018/05/15	1C	原料倉
120002	整流器		30	pcs	2018/05/15	1C	原料倉
120003	二極管		60	pcs	2018/05/15	1C	原料倉
120004	電容		180	pcs	2018/05/15	1C	原料倉
120005	變壓器		30	pcs	2018/05/15	1C	原料倉
120006	IC,CMOS		60	pcs	2018/05/15	1C	原料倉
130003	金屬接片		30	pcs	2018/05/15	1C	原料倉
190001							
200001							

瀏覽

點選子單身按鈕，查看該生產品號的相依需求料件。
 註：相依需求為生產品號之單階用量清單



步驟四：檢視批次採購計劃維護

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

系統產生

1

2

3

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
110012	主開關連動板 SV系列		2018/05/16	1003	日昇公司	IC	原料倉	80	pcs	2018/05/04	NTD	50	

➤ 根據生產計劃的相依領料需求推算。

交貨日 = 預計領料日 - 檢驗天數 - 1

➤ 採購廠商，預設品號資料的「主供應商」。



步驟四：檢視批次採購計劃維護

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

系統產生

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
110012	主開關連動板 SV系列		2018/05/16	1003	日昇公司	1C	原料倉	80	pcs	2018/05/04	NTD	50	

➤ 採購日 = 交貨日 - 採購前置天數

• 「批次需求計算方式」 = 毛需求，採購數量 = 毛需求量

• 「批次需求計算方式」 = 淨需求，採購數量 = 毛需求量 - 庫存可用量

動手做做看!

批次需求計劃產生

案例操作：

本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020180505002 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18		1B	半成品倉	30	ea	2018/05/15		2018/05/15	511
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23		1A	成品倉	80	ea	2018/05/21		2018/05/21	510

批次採購計劃維護-依品號(LRPI03)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020180505002 廠別 001 台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
110012	主開關連動板	SV系列	2018/05/16	1003	日昇公司	1C	原料倉	80	pcs	2018/05/04	NTD	50	

瀏覽 單身資料筆數: 2 320005

建議

➤ 補貨備料規劃:

- 通用性材料、常態性用料或較易取得的材料，可運用「品號再補貨建議表」、「製令需求檢視表」進行備料。(補貨政策 R)
- 成本高或取得較不容易(交期長)的料件，利用「批次需求計算方式」進行備料。(補貨政策 L)

報表應用-生產線負荷明細表

 **使用時機：**對於已經發放的正式製造命令或仍在計劃中之生產計劃，想瞭解其對生產線所造成之負荷情形，可利用此報表預估後續生產時所需耗費人時、機時，可作為估計生產進度用，藉以評估生產計劃之可行性，並做為調整生產計劃或調整產能之依據。

 **作業位置：**批次需求計劃系統 \ 報表列印 \ 生產線負荷明細表

生產線負荷明細表(LRPR07)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇廠別

選擇生產線別

☐ 區間選擇

選擇日期

起 2018/05/01 31

迄 2018/06/30 31

選擇生產負荷來源

☒ 製造命令

人時機時來源:

☒ 製令製程(當無製程時,取產品途程)

☐ 產品途程

☒ 生產計劃

確認

取消

週期性

自訂

即時報表



成功科技

生產線負荷明細表

製表日期: 2018/05/01

期間: 2018/05/01 至 2018/06/30

第 1 頁

廠別 廠別名稱	生產線 生產線名稱	日期 負荷來源	人工小時 機器小時	產品品號 單位	品名 規格	生產數量
001 台北廠	601 製一課	2018/05/06		420001	數位相機-SX系列	250.00
		510 -20180506001		ea	SX1001	
		2018/05/10		410006	數位相機-SL1322系列	100.00
		512 -20180510001		ea	SL1322	
		2018/06/04		410009	數位相機-防水G1系列	950.00
		****201805001		ea	G1001	
		2018/06/06		420001	數位相機-SX系列	250.00
		510 -20180606001		ea	SX1001	
		2018/06/10		410006	數位相機-SL1322系列	100.00
		512 -20180610001		ea	SL1322	
	605 製四課	2018/05/11		310006	LCD Display	100.00
		512 -20180511001		ea		
		2018/05/16		310006	LCD Display	100.00
		521 -20180516001		ea		
		2018/06/11		310006	LCD Display	100.00
		512 -20180611001		ea		
		2018/06/16		310006	LCD Display	100.00
		521 -20180616001		ea		
		小計:				2,050.00

<結 束>

報表應用-品號供需明細表

 **使用時機：**可依品號及截止時點列印現有庫存及在未來一段期間裡預計會異動的「十大量明細資料」的數量，以掌握各料件未來的供需狀況及在未來各時點的預計庫存結餘情形，亦可作為「產能變動」分析借調料可行性的參考依據。同時，可以檢視庫存是否有過多或過少的現象或判斷製造命令、生產計劃、採購單或採購計劃是否有不妥之處。

 **作業位置：**批次需求計劃系統 \ 報表列印 \ 品號供需明細表

品號供需明細表(LRPR05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇分類方式 會計 選擇廠別

選擇類別

選擇庫別 區間選擇

選擇品號 區間選擇

選擇計劃人員

選擇日期 起 2018/05/01 迄 2018/06/30

品號供需明細表(LRPR05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇品號補貨政策

☒ 依補貨點
 ☒ 依MRP需求
 ☒ 依LRP需求
 ☒ 不需
 ☒ 依歷史銷售

☐ 列印虛設品號
 ☒ 列印計劃資料
 ☒ 僅列印存在於計劃檔中的品號
 ☒ 生產計劃檔
 ☒ 採購計劃檔

選擇計劃批號 區間選擇

選擇列印條件 列印全部

☐ 列印期初為零且本期無異動
 ☒ 列印製令不發料及廠商供料

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂

🔍 即時報表

成功科技

品號供需明細表

製表日期: 2018/08/29


期間: 2018/05/01至2018/06/30

第 1 頁

品號	品名規格	單位 小單位	日期 異動別	庫別 庫別名稱	異動數量 預計結存	結存<安全存量	備註
150001	包裝盒	pcs	庫存可用量:		3,280.000		
			2018/05/06 預計領用	1C 原料倉	250.000 3,030.000		510 20180506001/420001/
			2018/06/04 計劃領用	1C 原料倉	950.000 2,080.000		****201805001
			2018/06/06 預計領用	1C 原料倉	250.000 1,830.000		510 20180606001/420001/
				1C 原料倉	250.000 1,580.000		510 20170606001/420001/
150008	包裝盒雷射貼紙 防水G1系列	pcs	庫存可用量:				
			2018/06/04 計劃領用	1C 原料倉	950.000 -950.000	*	****201805001
171001	電阻 防水G1系列	pcs	庫存可用量:				
			2018/05/16 計劃進貨	1C 原料倉	3,927.000 3,927.000		****201805001 /1003日昇公司
			2018/05/17 計劃領用	1C 原料倉	3,927.000		****201805001
171002	整流器 防水G1系列	pcs	庫存可用量:				
			2018/05/16 計劃進貨	1C 原料倉	935.000 935.000		****201805001 /1003日昇公司
			2018/05/17 計劃領用	1C 原料倉	935.000		****201805001
171003	二極管 防水G1系列	pcs	庫存可用量:				
			2018/05/16 計劃進貨	1C 原料倉	1,870.000 1,870.000		****201805001 /1003日昇公司
			2018/05/17 計劃領用	1C 原料倉	1,870.000		****201805001
171004	電容 防水G1系列	pcs	庫存可用量:				
			2018/05/17 計劃領用	1C 原料倉	5,610.000 -5,610.000	*	****201805001


<續下頁>

四、接單式生產案例

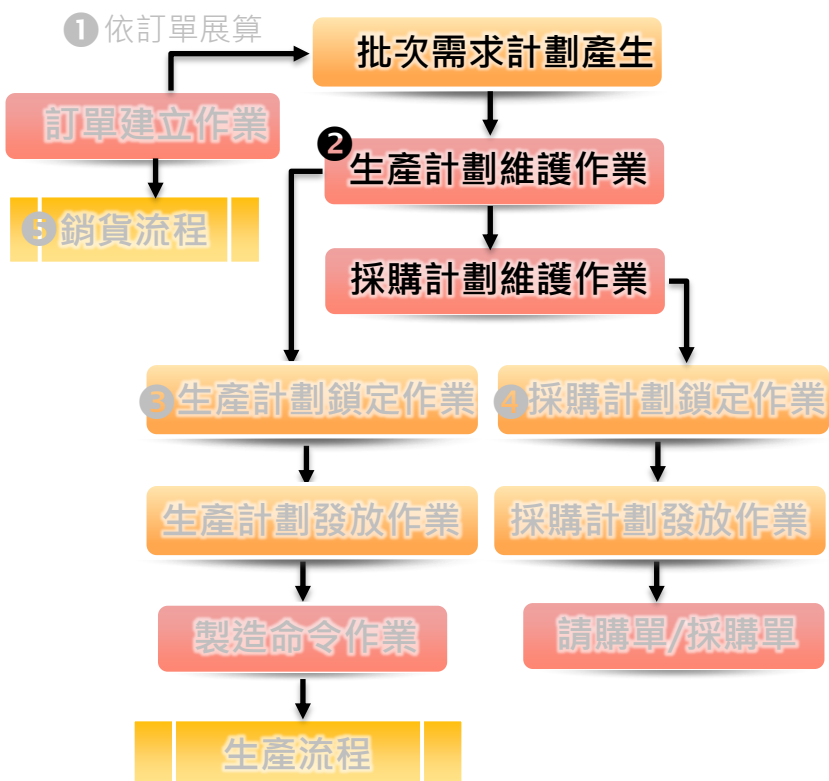

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。



步驟五：修改數量

詳細欄位

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	鎖定
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18	1B	半成品倉	30	ea	2018/05/15		2018/05/15	511	☐
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23	1A	成品倉	95	ea	2018/05/21		2018/05/21	510	☒

2

3

生產計劃新增或變更後，在半成品及材料重新展算前，該生產計劃必須勾選「鎖定」。



步驟五：修改數量

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020180505002 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	鎖定
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18	1B	半成品倉	30	ea	2018/05/15		2018/05/15	511	
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23	1A	成品倉	95	ea	2018/05/21		2018/05/21	510	☒

批次生產計劃維護-依品號(LRPI01)[成功科技]

☒ 相關資料有異動,是否重新產生相依需求資料

☐ 拋 BOM 單身備註

☒ 考慮主要領料庫別

☐ Feature件依比率計算

☐ Option 件依比率計算



步驟五：修改數量

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020180505002 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	鎖定
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18	1B	半成品倉	30	ea	2018/05/15		2018/05/15	511	
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23	1A	成品倉	95	ea	2018/05/21		2018/05/21	510	



成品改生產數量，半成品不用改？

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

步驟六：再次產生計劃

作業清單

▶▶ 批次需求計劃系統

基本資料管理系統
行事曆建立作業

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

批次需求計劃產生 (LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據 依計劃來源

選擇廠別 001

選擇來源編號

來源單別

選擇MP

選擇

起

選擇鎖定狀態

☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定☒ 考慮損耗率

2 輸入計劃批號 22020180505002

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂

- 重新執行「批次需求計劃產生」
- 在「生產計劃維護作業」中必須有資料，並將計劃資料鎖定。

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
- 基本資料管理系統
- 資料維護管理系統
- 清單與明細表
- 報表列印
- 批次作業
- 批次需求計劃
- 生產計劃鎖
- 批次計劃清
- 生產計劃發
- 採購計劃鎖
- 採購計劃發
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統
- e-B Online 連結系統
- E-BOM試產管理系統
- SPC整合系統
- 海關合同保稅管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統

基本資料管理系統
行事曆建立作業

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

步驟六：再次產生計劃

批次需求計劃產生 (LRPB01) [成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

3 批次需求計算方式

- ☐ 淨需求
- ☐ 毛需求

☐ Feature件依比率計算☐ Option 件依比率計算☒ 考慮庫存可用量4 ☒ 考慮安全存量☐ 採購計劃考慮最低補量及補貨倍量4 ☒ 供給量日期納入考慮

供給量截止日

5 ☒ 需求日期納入考慮

5 選擇需產生之計劃

全部

6 對於已發放料件之補充方式

重新補充

寫入主階件維護檔的庫別

☒ 來源庫別☐ 主要庫別☐ 產生不需補充之料件☐ 拋 BOM 單頭備註☐ 拋 BOM 單身備註☐ 客戶供料計算☐ 不發料計算☒ 考慮主要領料庫別

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂



步驟六：檢視生產計劃

詳細欄位

資料瀏覽

結果

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	依據	來源單別	來源單號	製令單
▶ 320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18	1B	半成品倉	45	ea	2018/05/15	3:計劃	220	20180505002	511
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23	1A	成品倉	95	ea	2018/05/21	1:訂單	220	20180505002	510

此生產計劃的來源依據為追加數量後的生產計劃。



步驟六：檢視採購計劃

詳細欄位

資料瀏覽

結果

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
110012	主開關連動板 SV系列		2018/05/16	1003	日昇公司	1C	原料倉	95	pcs	2018/05/04	NTD	50	

動手做做看!

批次需求計劃產生

案例操作：

檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品；調整後並重新執行「批次需求計劃產生」



批次生產計劃維護-依品號(LRP101)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號 22020180505002 廠別 001 台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別	鎖定
320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18	1B	半成品倉	30	ea	2018/05/15		2018/05/15	511	
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23	1A	成品倉	95	ea	2018/05/21		2018/05/21	510	☒

批次需求計劃產生(LRPB01)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇計劃依據 依計劃來源

選擇廠別 001

選擇來源編號

來源單別

來源單號

來源序號

選擇MPS計劃批號

選擇MPS計劃開工日期

起 迄

選擇鎖定狀態


☒ 已鎖定 ☐ 未鎖定

☒ 考慮損耗率

輸入計劃批號 22020180505002

確認 取消 週期性 自訂

四、接單式生產案例

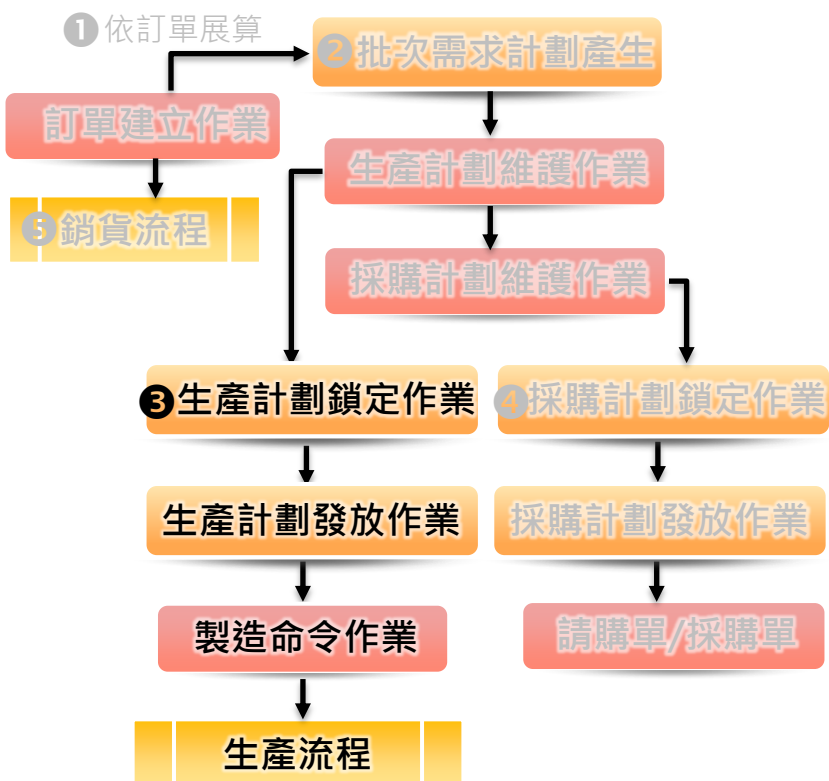

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。

作業清單

- [-] 進口作業管理系統
- [-] 製令/託外管理系統
- [-] 應收管理系統
- [-] 應付管理系統
- [-] 票據資金管理系統
- [-] 會計總帳管理系統
- [-] 自動分錄系統
- [-] 批次需求計劃系統
 - [-] 基本資料管理
 - [-] 資料維護管理
 - [-] 清單與明細表
 - [-] 報表列印
 - [-] 批次作業
 - [-] 批次需求計劃產生
 - [-] 生產計劃鎖定
 - [-] 批次計劃清除
 - [-] 生產計劃發放
 - [-] 採購計劃鎖定
 - [-] 採購計劃發放
- [-] 主生產排程系統
- [-] 物料需求計劃系統
- [-] 成本計算管理系統
- [-] 固定資產管理系統
- [-] 營業稅申報系統
- [-] 品質管理系統
- [-] 保稅管理系統
- [-] 多角貿易管理系統
- [-] Fax/Email處理系統
- [-] 園區保稅管理系統
- [-] 零用金管理系統
- [-] 模具管理系統
- [-] 合併財報管理系統
- [-] 標準成本計算管理系統
- [-] 產品序號管理系統
- [-] e-B Online 連結系統
- [-] E-BOM試產管理系統
- [-] SPC整合系統(中方)
- [-] 海關合同保稅管理系統



Workflow ERP GP

作業目的

- 將檢核未發放的生產計劃，設定為「鎖定」，作為計劃發放的控制依據。
- 重新執行「需求計劃產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。



檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統

基本資料管理系統

批次計劃設定作業

生產計劃鎖定作業(LRPB02)[成功科技]

基本選項 系統選項

選擇鎖定狀態

☒ 鎖定☐ 取消鎖定

選擇品號

起 迄 選擇廠別

選擇庫別

選擇完工日

起 31迄 31

選擇計劃批號

起 22020180505002迄 22020180505002選擇製令單別 選擇計劃人員

✓ 確認

✗ 取消

↻ 週期性

▶ 自訂

步驟七：生產計劃鎖定作業



詳細欄位

資料瀏覽

結果

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	鎖定	BOM日期	製令單別	製令名稱
▶ 320005	PCBA-Assembly Sensor	SV系列	2018/05/18	1B	半成品倉	45	ea	2018/05/15	☒	2018/05/15	511	託外製令單
430001	數位相機-SV系列	SV1001	2018/05/23	1A	成品倉	95	ea	2018/05/21	☒	2018/05/21	510	廠內製令單

批次生產計劃維護的「鎖定」可以透過：

- 1.執行「生產計劃鎖定作業」更新
- 2.手動勾選

備註：

生產計劃新增或變更後，在半成品及材料重新展算前，該生產計劃也必須勾選「鎖定」。

GP 鼎新電腦Conductor [DS-System Administrator]

檢視類別系統+作業別

公司別成功科技

程式代號

作業清單

進口作業管理系統

製令/託外管理系統

應收管理系統

應付管理系統

票據資金管理系統

會計總帳管理系統

自動分錄系統

批次需求計劃系統

基本資料管理

資料維護管理

清單與明細表

報表列印

批次作業

批次需求計劃產生

生產計劃鎖定

批次計劃清除

生產計劃發放

採購計劃鎖定

採購計劃發放

主生產排程系統

物料需求計劃系統

成本計算管理系統

固定資產管理系統

營業稅申報系統

品質管理系統

保稅管理系統

多角貿易管理系統

Fax/Email處理系統

園區保稅管理系統

零用金管理系統

模具管理系統

合併財報管理系統

標準成本計算管理系統

產品序號管理系統

e-B Online 連結系統

E-BOM試產管理系統

SPC整合系統(中方)

海關合同保稅管理系統

Workflow ERP GP

作業目的

➤ 將生產計劃發放成為「廠內/託外製造命令」，作為生產的依據。

➤ 未做鎖定的資料後續也可發放。

65

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統

步驟八：生產計劃發放

生產計劃發放作業(LRPB03)[成功科技]

基本選項

進階選項

系統選項

選擇品號

起

迄



選擇庫別



選擇完工日

起

迄

31

31

選擇開工日

起

迄

31

31

選擇狀態

☒ 鎖定☐ 全部

選擇製令單別



選擇製令性質

全部

選擇計劃人員



選擇計劃批號

起

22020180505002



迄

22020180505002



選擇廠別



✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統

生產計劃發放作業(LRPB03)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇發放方式 皆不合併

發放排序依據 計劃批號

☒ 發放託外製令之加工單價為零者☒ 開工,完工日小於發放日期更改與發放日期相同

輸入生管/採購人員

輸入發放日期 2018/05/05 31

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂

生產計劃推算出的預計開工日、預計完工日
可能會早於實際發放日期，建議勾選此選項
確保資料的合理性。

步驟八：生產計劃發放



詳細欄位 資料瀏覽



計劃批號 廠別

備註

品號	品名	規格	完工日	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	鎖定	BOM日期	製令單別	製令名稱
						0			☐			

- 生產計劃發放後，「批次生產計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被**清空**。
- 另可於製令管理系統之「製造命令建立作業」**查詢**發放後所產生之製令工單。



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20180505001 產品品號 430001 傳送次數 0

開單日期 2018/05/05 品名 數位相機-SV系列

性質 1:廠內製令 規格 SV1001

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

系統產生



時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

預計產量 95

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2018/05/21 <—>

預計完工 2018/05/23 <—>

實際開工 / /

實際完工 / /


BOM日期 2018/05/21

確認日 2018/05/05

確認者 DS 系統管理者

簽核狀態 N:不執行電子簽核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件
2.正	110012	主開關連動板 SV系列		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150001	包裝盒		190	0	190	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150002	內隔板		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150003	氣泡袋		190	0	190	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150004	包裝盒貼紙		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150005	產品序號貼紙		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150006	保證卡		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150007	包裝盒貼紙 SV系列		0	0	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製

製令單號 20180505001

開單日期 2018/05/05

性質 1:廠內製令

類型 2.正式品號

狀態碼 1:未生產

急料

列印 0

產品品號 430001

傳送次數 0

品名 數位相機-SV系列

規格 SV1001

單位 ea

BOM版次 0000

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/託外

進階資料

包裝資料

資料瀏覽

計劃批號 22020180505002

客戶代號 1008

復興公司

母製令號 510 20180505001

客戶單號

訂單單號 220 20180505002 0001

客戶品號

採購限制日

專案代

備註

紀錄製令的來源依據

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件
2.正	110012	主開關連動板 SV系列		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150001	包裝盒		190	0	190	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150002	內隔板		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150003	氣泡袋		190	0	190	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150004	包裝盒貼紙		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150005	產品序號貼紙		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150006	保證卡		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150007	包裝盒貼紙 SV系列		0	0	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1



詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20180505001 產品品號 320005 傳送次數 0

開單日期 2018/05/05 品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令 規格 SV系列

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉



時程與產量 廠內/託外 進階資料 包裝資料 資料瀏覽

計劃批號 22020180505002 客戶代號

母製令號 511 20180505001 客戶單號

訂單單號 客戶品號

採購限制日期 / /

專案代號

備註

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件
2.正	120001	電阻		180	0	180	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	120002	整流器		45	0	45	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	120003	二極管		90	0	90	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	120004	電容		270	0	270	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	120005	變壓器		45	0	45	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	120006	IC,CMOS		90	0	90	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	130003	金屬接片		45	0	45	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190001	PCB電板		45	0	45	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	200001	錫		45	0	45	g	****		1C	原料倉	1:直接材	2

動手做做看!

生產計劃鎖定作業
生產計劃發放作業

案例操作：

再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20180505001 產品品號 320005 傳送次數 0

開單日期 2018/05/05 品名 PCBA-Assembly Sensor

性質 2:託外製令 規格 SV系列

版本 0000

製造命令建立作業(MOCI02)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20180505001 產品品號 430001 傳送次數 0

開單日期 2018/05/05 品名 數位相機-SV系列

性質 1:廠內製令 規格 SV1001

類型 2.正式品號 單位 ea BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉


時程與產量	廠內/託外	進階資料	包裝資料	資料瀏覽
預計產量	95			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			
預計開工	2018/05/21 <-->	BOM日期	2018/05/21	
預計完工	2018/05/23 <-->	確認日	2018/05/05	
實際開工	/ /	確認者	DS 系統管理者	
實際完工	/ /	簽核狀態	N:不執行電子簽核	

程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	1
**		1C	原料倉	1:直接材	2

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件
2.正	110012	主開關連動板 SV系列		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150001	包裝盒		190	0	190	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150002	內隔板		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150003	氣泡袋		190	0	190	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150004	包裝盒貼紙		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150005	產品序號貼紙		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150006	保證卡		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	150007	包裝盒貼紙 SV系列		0	0	0	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1
2.正	190006	影像軟體光碟-Ver 2.0		95	0	95	pcs	****		1C	原料倉	1:直接材	1

瀏覽 單身資料筆數: 11 110012 主開關連動板 SV系列 127.0.0.1 - 211

四、接單式生產案例

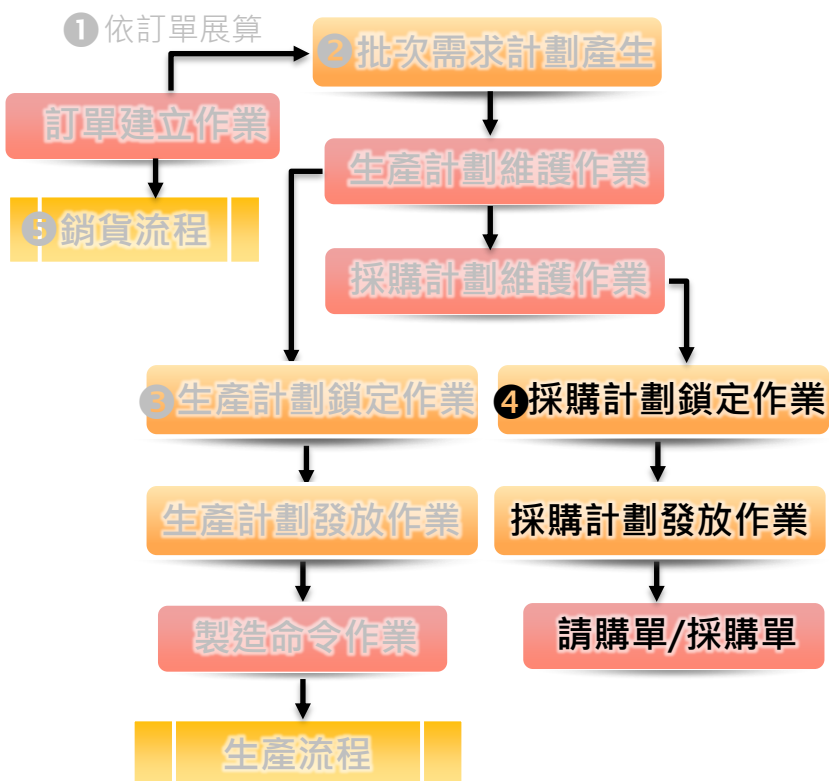

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。

作業清單

- [-] 採購管理系統
- [-] 進口作業管理系統
- [-] 製令/託外管理系統
- [-] 應收管理系統
- [-] 應付管理系統
- [-] 票據資金管理系統
- [-] 會計總帳管理系統
- [-] 自動分錄系統
- [-] 批次需求計劃系統
 - [-] 基本資料管理
 - [-] 資料維護管理
 - [-] 清單與明細表
 - [-] 報表列印
 - [-] 批次作業
 - [-] 批次需求計劃產生
 - [-] 生產計劃鎖定
 - [-] 批次計劃清除
 - [-] 生產計劃發放
 - [-] 採購計劃鎖定
 - [-] 採購計劃發放
- [-] 主生產排程系統
- [-] 物料需求計劃系統
- [-] 成本計算管理系統
- [-] 固定資產管理系統
- [-] 營業稅申報系統
- [-] 品質管理系統
- [-] 保稅管理系統
- [-] 多角貿易管理系統
- [-] Fax/Email處理系統
- [-] 園區保稅管理系統
- [-] 零用金管理系統
- [-] 模具管理系統
- [-] 合併財報管理系統
- [-] 標準成本計算管理系統
- [-] 產品序號管理系統
- [-] e-B Online 連結系統
- [-] E-BOM試產管理系統
- [-] SPC整合系統(中方)



Workflow ERP GP

作業目的

- 將檢核未發放的採購計劃後，設定為「鎖定」，作為計劃發放的控制依據。
- 重新執行「需求計劃產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。



檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統

基本資料管理系統

批次計劃設定作業

製令/託外管理系統

採購計劃鎖定作業(LRPB04)[成功科技]

基本選項

系統選項

選擇鎖定狀態

☒ 鎖定☐ 取消鎖定

選擇交貨日

起 31迄 31

選擇品號

起 迄 

選擇採購日

起 31迄 31選擇廠別 

選擇庫別






選擇計劃批號

起 22020180505002 迄 22020180505002 選擇計劃人員 

✓ 確認

✗ 取消

↺ 週期性

▶ 自訂



詳細欄位

資料瀏覽

結果

計劃批號 22020180505002

廠別 001

台北廠

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
110012	主開關連動板 SV系列		2018/05/16	1003	日昇公司	1C	原料倉	95	pcs	2018/05/04	NTD	50	☒

批次採購計劃維護的「鎖定」可以透過：

- 1.執行「採購計劃鎖定作業」更新。
- 2.手動勾選。

作業清單

- + 採購管理系統
- + 進口作業管理系統
- + 製令/託外管理系統
- + 應收管理系統
- + 應付管理系統
- + 票據資金管理系統
- + 會計總帳管理系統
- + 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - + 基本資料管理
 - + 資料維護管理
 - + 清單與明細表
 - + 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃產生
 - 生產計劃鎖定
 - 批次計劃清除
 - 生產計劃發放
 - 採購計劃鎖定
 - 採購計劃發放
- + 主生產排程系統
- + 物料需求計劃系統
- + 成本計算管理系統
- + 固定資產管理系統
- + 營業稅申報系統
- + 品質管理系統
- + 保稅管理系統
- + 多角貿易管理系統
- + Fax/Email處理系統
- + 園區保稅管理系統
- + 零用金管理系統
- + 模具管理系統
- + 合併財報管理系統
- + 標準成本計算管理系統
- + 產品序號管理系統
- + e-B Online 連結系統
- + E-BOM試產管理系統
- + SPC整合系統(中方)



Workflow ERP GP

作業目的

- 將採購計劃發放成為「請購單」或「採購單」，作為採買料件的依據。
- 未做鎖定的資料後續也可發放。



檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

步驟十：採購計劃發放

作業清單

▶▶ 批次需求計劃系統

採購計劃發放作業(LRPB05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

選擇廠商

起

迄

選擇計劃批號

起 22020180505002



迄 22020180505002



選擇廠別

選擇品號

起

迄

選擇庫別

選擇採購日

起

迄

選擇幣別

選擇狀態

☒ 鎖定

☐ 全部

✓ 確認

✗ 取消

↻ 週期性

▶ 自訂

將廠商規範的最低補量及補貨倍量
納入採購數量評估。

☒ 考慮最低補量及補貨倍量

檢視類別 系統+作業別

公司別 成功科技

作業清單

- 庫存管理系統
- 產品結構管理系統
- 訂單管理系統
- 出口作業管理系統
- 採購管理系統
- 進口作業管理系統
- 製令/託外管理系統
- 應收管理系統
- 應付管理系統
- 票據資金管理系統
- 會計總帳管理系統
- 自動分錄系統
- 批次需求計劃系統
 - 基本資料管理
 - 資料維護管理
 - 清單與明細表
 - 報表列印
 - 批次作業
 - 批次需求計劃
 - 生產計劃鎖
 - 批次計劃清單
 - 生產計劃發
 - 採購計劃鎖
 - 採購計劃發
- 主生產排程系統
- 物料需求計劃系統
- 成本計算管理系統
- 固定資產管理系統
- 營業稅申報系統
- 品質管理系統
- 保稅管理系統
- 多角貿易管理系統
- Fax/Email處理系統
- 園區保稅管理系統
- 零用金管理系統
- 模具管理系統
- 合併財報管理系統
- 標準成本計算管理系統
- 產品序號管理系統

▶▶ 批次需求計劃系統

採購計劃發放作業(LRPB05)[成功科技]

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 發放採購單價為零者☒ 預交日小於發放日期更改與發放日期相同

採購計劃推算出的預交日可能會早於實際發放日期，建議勾選此選項確保資料的合理性。

☒ 依來源單據產生專案代號

輸入單別 33A

輸入流程代號

輸入發放日期 2018/05/05 31

輸入請購人員

選擇採購人員方式 輸入指定採購人員

輸入指定採購人員 401

選擇品號採購人員

✓ 確認

✗ 取消

↻ 週期性

▶ 自訂



詳細欄位 資料瀏覽




計劃批號 廠別

備註

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
								0				0	☐

- 採購計劃發放後，「批次採購計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被**清空**。
- 另可於採購管理系統之「請購單」或「採購單」**查詢**發放後所產生之單據。



詳細欄位 資料瀏覽

採購單別 33A ☐ 國內採購單 單據日期 2018/05/05 ☐

拋轉狀態 N:未拋轉

採購單號 20180505001 供應廠商 1003

採購日期 2018/05/05

流程代號 ☐ 日昇公司

確認者 DS

系統管理者

版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 ☐ 台北廠

列印格式 1:中文

簽核狀態 N:不執行電子簽核

採購人員 401 李採購

運輸方式 ☐

交易幣別 NTD \$ 匯率 1 \$

☐ 訂金分批

訂金比率 0.00%

稅別碼 P05 ☐ 進項三聯式發票-應稅外加

課稅別 2:應稅外加

營業稅率 5.00%

備註 ☐ 列印 0

傳送次數 0

☐ 單身多稅率☐ EBC確認碼

EBC採購單號

EBC採購版次

☐ 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	預交日	計價數量	計價單位
0001	2.LR	2.正	110012	主開關連動板 SV系列		1C	原料倉	1,008	0	1000	pcs	2018/05/16	1,008	pcs

採購金額 50,400

稅額 2,520

金額合計 52,920

數量合計 1,008

動手做做看!

採購計劃鎖定作業
採購計劃發放作業

案例操作：

再次檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放



採購單建立作業(PUR107)[成功科技]

資料(D) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2018/05/05 拋轉狀態 N:未拋轉
採購單號 20180505001 供應廠商 1003 採購日期 2018/05/05
流程代號 日昇公司 確認者 DS 系統管理者
版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽


廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 簽核狀態 N:不執行電子簽核
採購人員 401 李採購 運輸方式
交易幣別 NTD 匯率 1 訂金分批 訂金比率 0.00%
稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率
EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	類型	品號	品名	規格	交貨庫別	庫別名稱	採購數量	已交數量	最低補量	單位	預交日	計價數量	計價單位
0001	2.LR	2.正	110012	主開關連動板 SV系列		1C	原料倉	1,008	0	1000	pcs	2018/05/16	1,008	pcs

採購金額 50,400 稅額 2,520 金額合計 52,920
數量合計 1,008

瀏覽 單身資料筆數: 1 110012 主開關連動板 SV系列 127.0.0.1 - 211

四、接單式生產案例

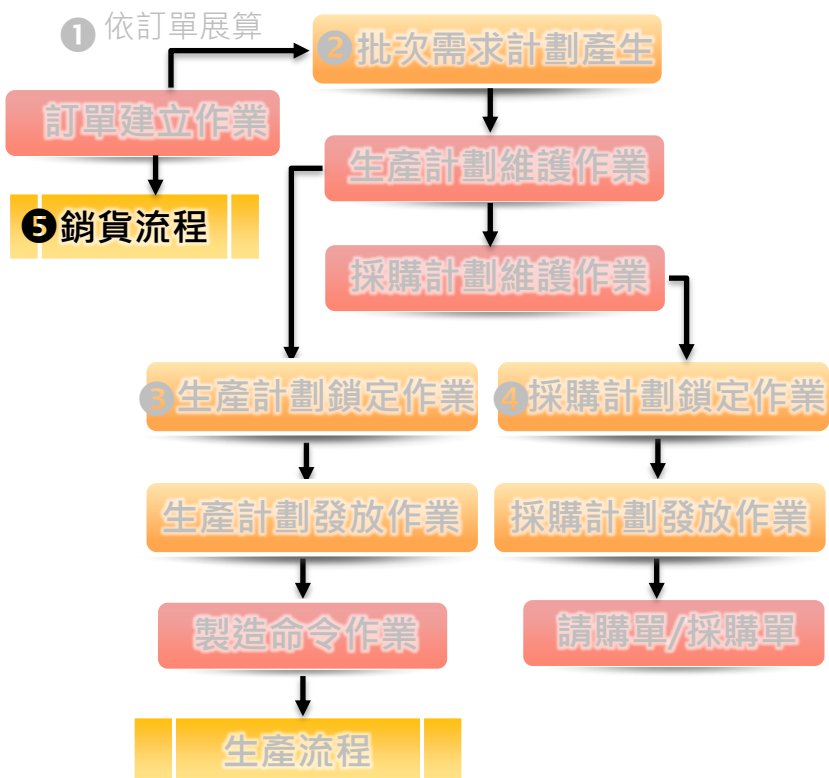

接單式生產計劃流程

1.	本月5日 收到客戶-復興公司的訂單，預計當月25日交貨，生管於該訂單進行需求計畫產生。
2.	檢視計劃內容後，生管決議將430001多生產15個當庫存品。
3.	再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
4.	檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5.	當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容準備出貨給客戶。 <由講師示範操作>



詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 230 ☐ 內銷(核訂) 單據日期 2018/05/25 ☐ 銷貨日期 2018/05/25 ☐ 產生分錄-收入
 銷貨單號 20180525001 客戶代號 1008 ☐ 復興公司 ☐ 產生分錄-成本
 流程代號 ☐ ☐ 不控管信用額度 拋轉狀態 N:未拋轉
☐ 現銷 EBO拋轉狀態 不需拋轉



交易資料

送貨資料

發票資料(一)

發票資料(二)

其他資料

訂金/

部門代號 30 ☐ 業務部門 幣別 NTD \$ 台幣 簽核狀態 N:不執行電子簽核
 業務人員 301 ☐ 孫業務 匯率 1 \$ 確認者 DS
 出貨廠別 001 ☐ 台北廠 保稅碼 0.依品號預設 系統管理者
 付款條件 2D1 ☐ 結帳後一星期 備註
 交易條件 1 ☐ 一般交易 件數 0
 列印 0 發票列印 0 傳送次數 0

序號	類型	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	數量	單位	計價數量	計價單位	單價	訂單單別	訂單單號	訂單序號	營
0001	1.贈	430001	數位相機-SV系列	SV1001	1A	成品倉	100	ea	100	ea	15,000	220	20180505002	0001	

原幣銷貨金額 1,500,000
 本幣銷貨金額 1,500,000
 總數量 100

原幣銷貨稅額 75,000
 本幣銷貨稅額 75,000

原幣合計 1,575,000
 本幣合計 1,575,000

常見問題Q&A



Q1

若一品號庫存單位與採購單位不同,則採購計劃以那個為主？

A1

以品號基本資料的庫存單位為主。


Q2

執行批次需求計畫產生時，系統會依母製令之預計完工日往前推算子製令的開工日期嗎？

A2

會，系統推算日期時，是從母製令之需求日往前推算其預計開、完工日，(推算時要記得扣掉檢驗天數)，再往前推算子製令的預計開、完工日。

補充：接單設計生產流程(ETO)

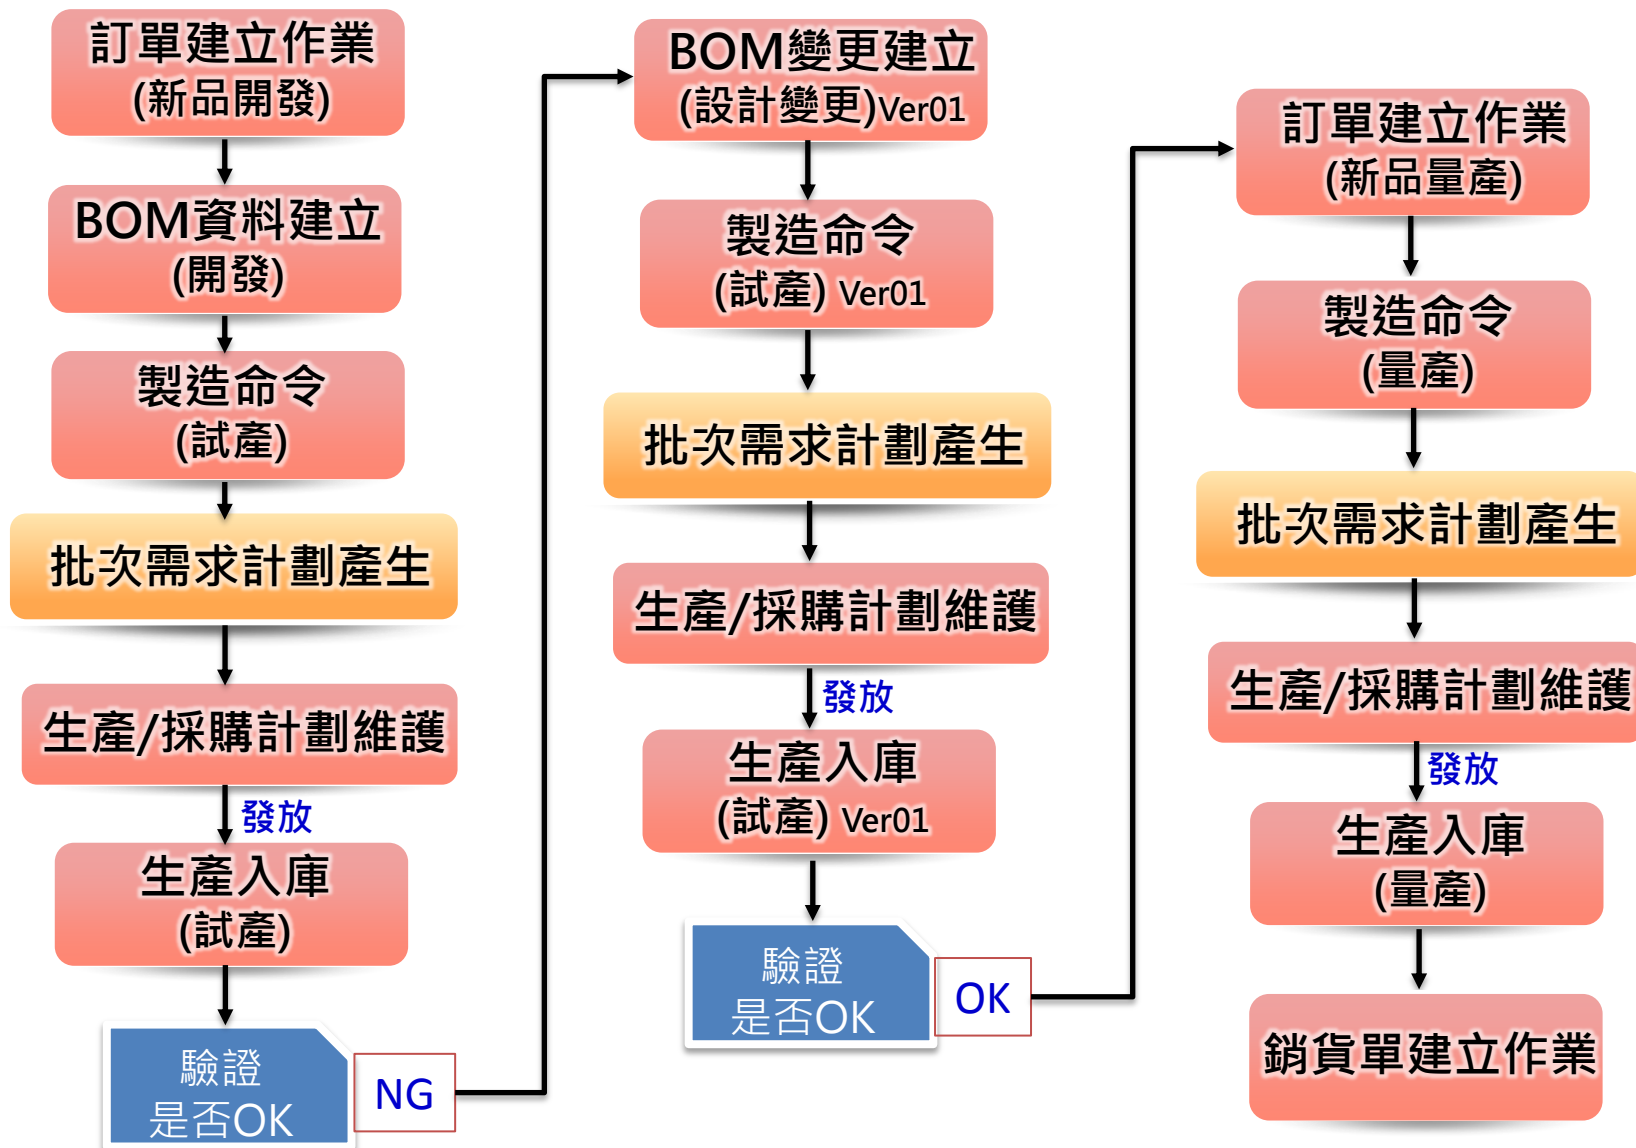

課程回顧

一、何謂接單式生產(MTO)


二、名詞解釋

三、批次需求計畫邏輯說明

四、接單式生產流程

課

程



運用報表 掌握管理重點與時機

每堂課只需3.5小時，高效學習

透過報表提早進行因應對策、數據管理



▶ 課程費用：1500元 或 使用點數1點 (服務合約的經營管理增值課程點數)

▶ 名方式：可至 <http://elearning.dsc.com.tw> 或 【洽詢專線】 02-8911-1688 分機1025 俐安
