

課前提醒

- 1.環境介紹**
洗手間/茶水間
- 2.課程進行方式**
本課程採實作練習，課程內容以標準流程授課並提供學員上機操作，以達最大學習成效與應用。
(教材案例供上課演練用，非正式公司資料，僅供參考！)
- 3.課後問卷**
當天課後上網填寫問卷


2

學習地圖



3

企業營運流程

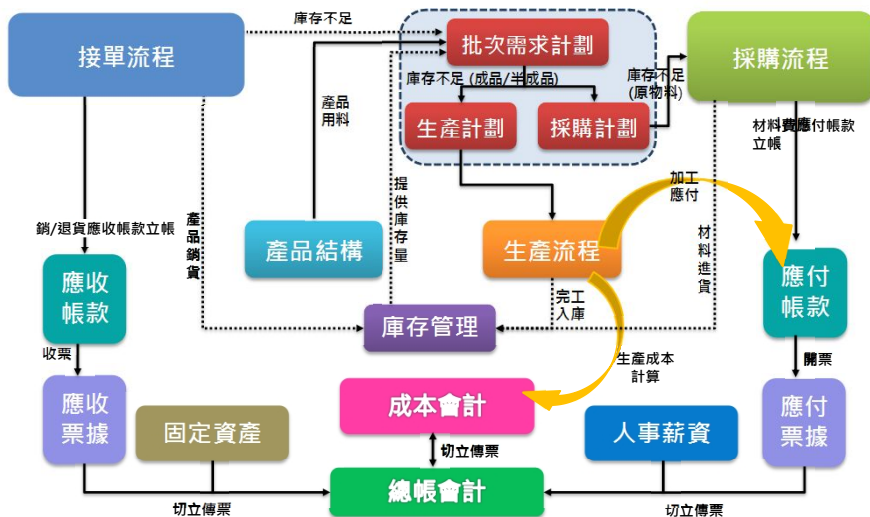

4

課程大綱

課
程

一、何謂庫存式生產

二、名解解釋

三、批次需求計畫邏輯說明

休息10分鐘

四、庫存式生產流程



課程目標



- 1.清楚LRP名詞解釋
- 2.學會且能自行操作計劃性生產流程

數位課程

系統別


批次需求計劃系統

※講師的小提醒：若您在上課前尚未進行數位課程學習，建議課後可再利用以上課程複習，加強系統熟悉度。

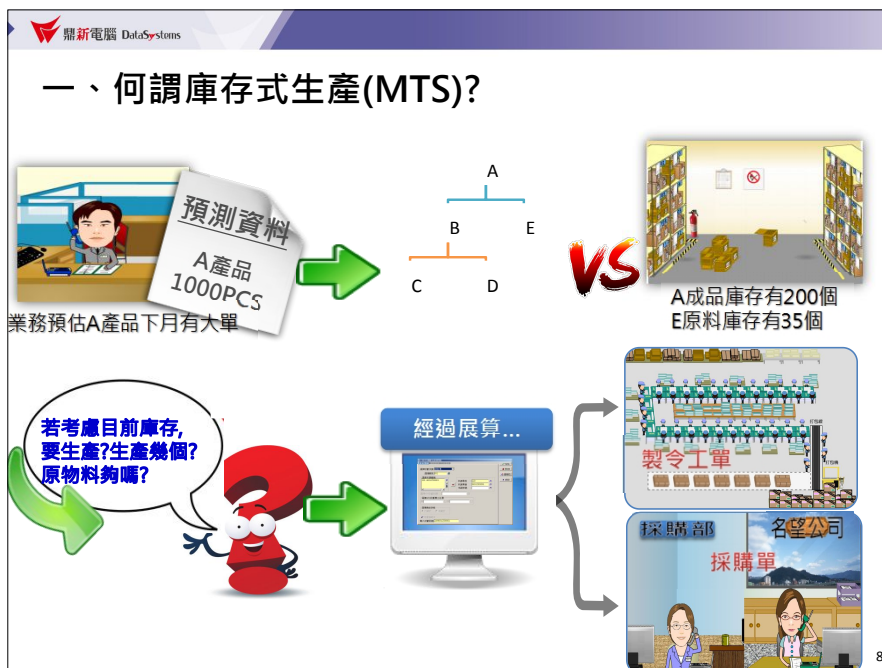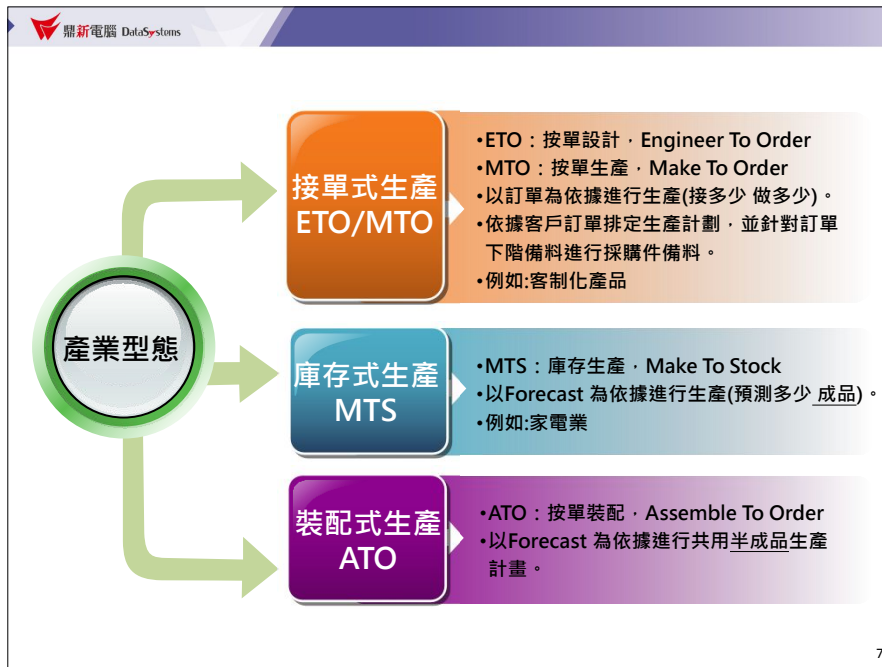


二、名詞解釋

以上述為例，有無考慮庫存量，生產及採購量將有不一樣的結果

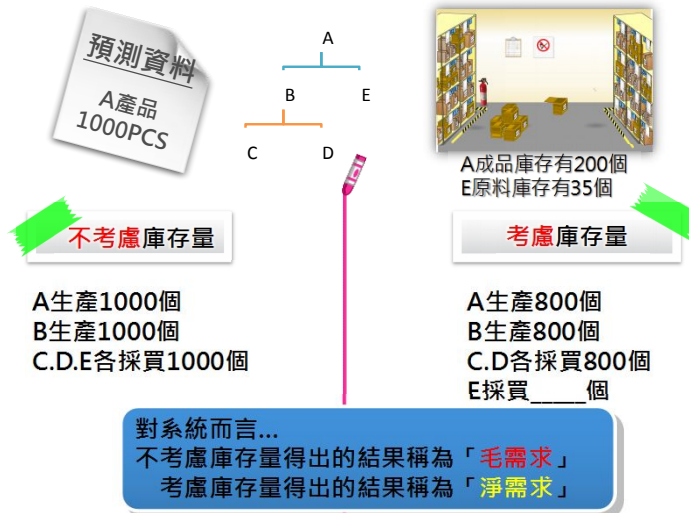

9

二、批次需求計畫邏輯說明

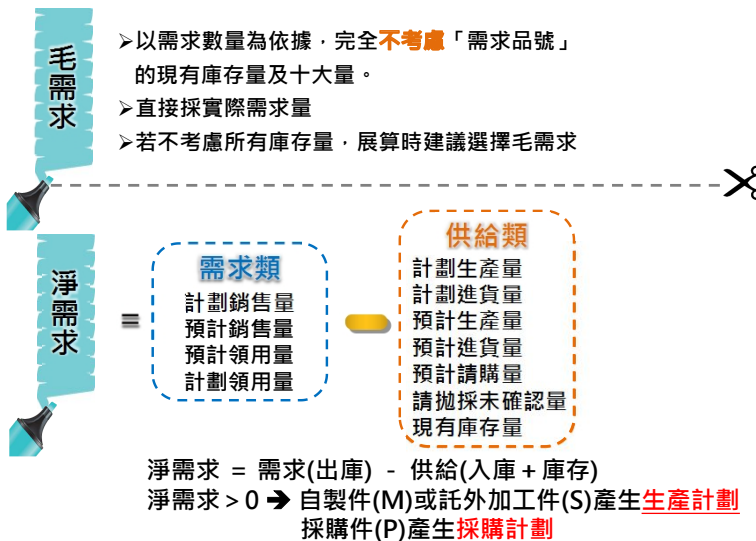

10


十大量	說 明	作業位置
計劃銷售量	未達成之銷售預測量 (預測數量 - 已受訂量)	訂單管理系統 \ 銷售預測建立作業
預計銷貨量	未結案訂單之未銷貨量 (訂單數量 + 贈備品量 - 已交數量 - 贈備品已交量)	訂單管理系統 \ 客戶訂單建立作業
計劃領料量	相依需求之需求 (生產計劃維護上階主件的相依需求數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
預計領料量	未完工製令單身之應領未領料量 (需領用量 - 已領用量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
預計請購量	未更新之請購數量 (請購單已確認, 未拋轉成採購單的數量)	採購管理系統 \ 請購單建立作業
預計進貨量	未結案採購單之未進貨量 (採購數量 - 已交數量)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
請拋採 未確認量	請購單已拋轉成採購單但未確認之採購數 (請注意, 此種未確認的採購數量, 必須要有相 對應的「請購資料維護作業」的資料, 也就是必 須經由請購單來拋轉)	採購管理系統 \ 採購單建立作業
預計生產量	未完工製令單頭之未生產量 (預計產量 - 已生產量 - 報廢量)	製令外管理系統 \ 製造命令建立作業
計劃生產量	生產計劃內之預計生產量 (生產計劃檔之生產數量)	批次需求計劃系統 \ 生產計劃維護作業
計劃採購量	採購計劃內之預計採購量 (採購計劃維護採購數量)	批次需求計劃系統 \ 採購計畫維護作業

11

三、批次需求計畫邏輯說明



BOM用量資料:



2016年3月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

工廠行事曆: 星期六、日休全天

品號	庫存數量	檢驗天數	固定前置天數	變動前置天數	批量	請填入數量
A	200	1	2	1	100	生產量_____
B	100	1	2	1	100	生產量_____
C	0(3/18預計進 貨100PCS)	1	2	1	100	採購量_____
D	300	1	2	1	100	採購量_____
E	200	1	2	1	100	採購量_____


若以淨需求展算, A、B、C、D、E各需要生產或採購幾個?
何時生產/採購?

12

三、批次需求計畫邏輯說明(A成品)

A成品資料

客戶訂單：數量500PCS,需求日3/31
 庫存數量：200PCS
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100



2016年3月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

量的推算

A 成品計劃生產：500 - 200 = 300 (PCS)

日期的推算

預計完工日：預測需求日(3/31)-入庫天數(1天)-檢驗天數(1天) = 3/29

生產前置天數 = $\frac{\text{預計產量}}{\text{批量}} \times \text{變動前置天數} + \text{固定前置天數}$

$$= \left(\frac{300}{100} \times 1 \right) + 2 = 5$$


預計開工日：預計完工日(3/29) - 前置天數(5天) = 3/22

13

三、批次需求計畫邏輯說明(B原料)

B-材料

相依需求：300PCS
 庫存數量：100PCS
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100



2016年3月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

量的推算

A 成品計劃生產：300 (PCS) → 需要 B 半成品 300PCS

→ B 半成品計劃生產：300 - 100 = 200 PCS

日期的推算

B 半成品的預計領料日 = 上階 A 成品開工日(3/22)

B 半成品的預計完工日 = 預計領料日(3/22) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 3/18

生產前置天數 = $\frac{\text{預計產量}}{\text{批量}} \times \text{變動前置天數} + \text{固定前置天數}$
 $= \left(\frac{200}{100} \times 1 \right) + 2 = 4$


預計開工日 = 預計完工日(3/18) - 前置天數(4天) = 3/14

14

三、批次需求計畫邏輯說明(C原料)

C-材料

相依需求：300PCS
 庫存數量：0
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100
 預計進貨量：100



2016年3月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

量的推算

A 成品計劃生產：300 (PCS) → 需要 C 原料 300PCS
 → C 原料計劃採購：300 - 100(預計進貨量) = 200 PCS

日期的推算

C 原料的預計領料日 = 上階 A 成品開工日(3/22)

C 原料的預計交貨日 = 預計領料日(3/22) - 入庫天數(1天) - 檢驗天數(1天) = 3/18

採購前置天數 = (預計採購量/批量 × 變動前置天數) + 固定前置天數
 = (200/100 × 1) + 2 = 4


預計採購日 = 預計交貨日(3/18) - 前置天數(4天) = 3/14

15

三、批次需求計畫邏輯說明(D原料)

D-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：300
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100



2016年3月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS) → 需要 D 原料 200PCS
 → D 原料計劃採購：200-300(庫存)=-100

淨需求 < 0，因此不用採買

日期的推算




16

三、批次需求計畫邏輯說明(E原料)

E-材料

相依需求：200PCS
 庫存數量：200
 檢驗天數：1天
 固定前置天數：2天
 變動前置天數：1天
 批量：100



2016年3月						
日	一	二	三	四	五	六
28	29	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

量的推算

B 半成品計劃生產：200 (PCS)→ 需要 D 原料 200PCS

→D 原料計劃採購：200(庫存數量)-200=0

淨需求 =0，因此不用採買

日期的推算



17



批次需求計劃執行前置作業


順序	系統別	對應作業	必要性
1	基本資料管理系統	廠別資料建立	✓
2		庫別資料建立	✓
3		生產線資料建立	✓
4		職務類別建立	△
5		行事曆建立	✓
6	庫存管理系統	品號資料建立作業	✓
7	產品結構系統	BOM用量資料建立	✓
8	批次需求計劃系統	批次計劃設定檔	✓

註：△表示建議維護

✓表示一定要先維護

18

四、庫存式生產流程

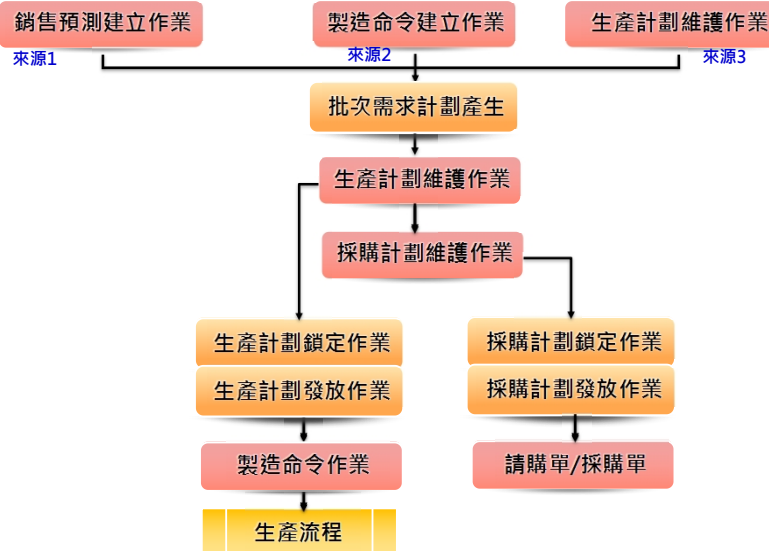

19

成功機械公司背景

成功機械




成功機械是一家提供高度客製化機械產品公司，主要以生產車床為主（也就是製造機械的機台）。

最近研發團隊為提升機台效能，研發出最新機種，推出後接獲不少客戶訂單。

接下來介紹庫存式生產相關作業程序。

20

四、庫存式生產案例

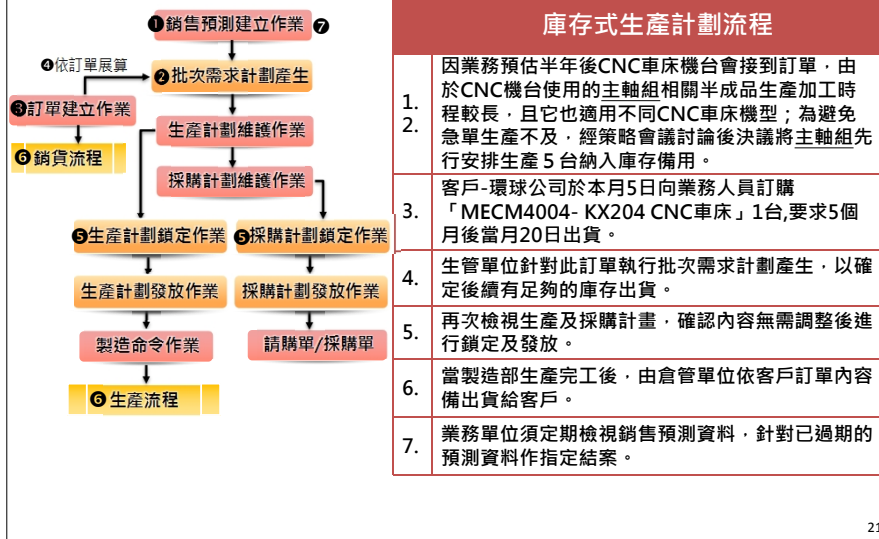

21

銷售預測建立作業(MEC118)(成功機帳)

資料(E) 功能(F) 離開(G)

詳細欄位

預測代號: M20161201 通路:

客戶代號: 型態:

部門: 地區:

業務員: 國家:

☒ 納入生產計劃 路線:

備註: 其他:

廠別: 001 台北廠

序號	品號	品名	規格	日期	預測庫	庫別名稱	預測數量	已受訂量	單位	幣別	單價	預測金額	結案碼	優先順序	鎖定交期
0001	MECY1004	主軸組		2017/06/15	1B	半成品倉	5	0	組	NTD	0	0	N:未結	00010	

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECY1004 主軸組 127.0.0.1 - 211 22

採購單建立作業(PUR107)(成功機核)

資料(F) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2016/12/01 拋轉狀態 N:未拋轉
 採購單號 20161201003 供應廠商 1005 採購日期 2016/12/01
 流程代號 百全公司 確認者 DS 系統
 版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉

來源：採購單

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 審核狀態 N:不執行電子審核
 採購人員 運輸方式 訂金分批 訂金比率 0.00%
 交易幣別 NTD 匯率 1 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率
 EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	採購數量	已交數量	採購單價	採購金額	預交日	結案碼	庫別名稱	類型	最低存量
0001	9.其他	MECP1034	馬達座(未		IC	2	0	0	0	2017/02/25	N:未結	原料倉	2.正	0

採購金額 0 稅額 0 金額合計 0
 數量合計 2

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECP1034 馬達座(未噴漆) 127.0.0.1 - 211 23

鼎新電腦 DataSystems

動手做做看!
 銷售預測建立作業
 採購單建立作業

案例操作：

- 1.請將當月銷售預測資料查詢出來後將『納入生產計劃』勾選。
- 2.將當月1日百全公司的採購單作確認。

***銷售預測建立作業(MEC118)(成功機核)**

資料(F) 功能(F) 離開(O)

詳細欄位 資料瀏覽

預測代號 20161201
 客戶代號
 部門
 業務員
 納入生產計劃
 備註
 廠別 001

採購單建立作業(PUR107)(成功機核)

採購單別 33A 國內採購單 單據日期 2016/12/01 拋轉狀態 N:未拋轉
 採購單號 20161201003 供應廠商 1005 採購日期 2016/12/01
 流程代號 百全公司 確認者 DS 系統管理者
 版次 0000 EBO拋轉狀態 不需拋轉



交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料瀏覽

廠別代號 001 台北廠 列印格式 1:中文 審核狀態 N:不執行電子審核
 採購人員 運輸方式 訂金分批 訂金比率 0.00%
 交易幣別 NTD 匯率 1 課稅別 2:應稅外加 營業稅率 5.00%
 稅別碼 P05 進項三聯式發票-應稅外加 備註 列印 0 傳送次數 0 單身多稅率
 EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	採購數量	已交數量	採購單價	採購金額	預交日	結案碼
0001	9.其他	MECP1034	馬達座(未		IC	2	0	25,000	50,000	2017/02/25	N:未結

瀏覽 單身資料筆數: 1

24

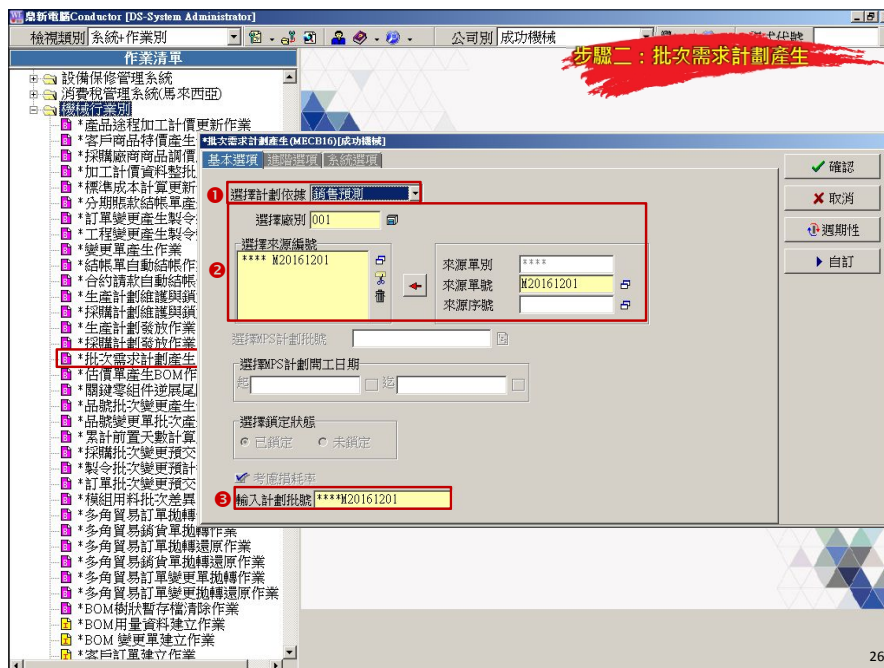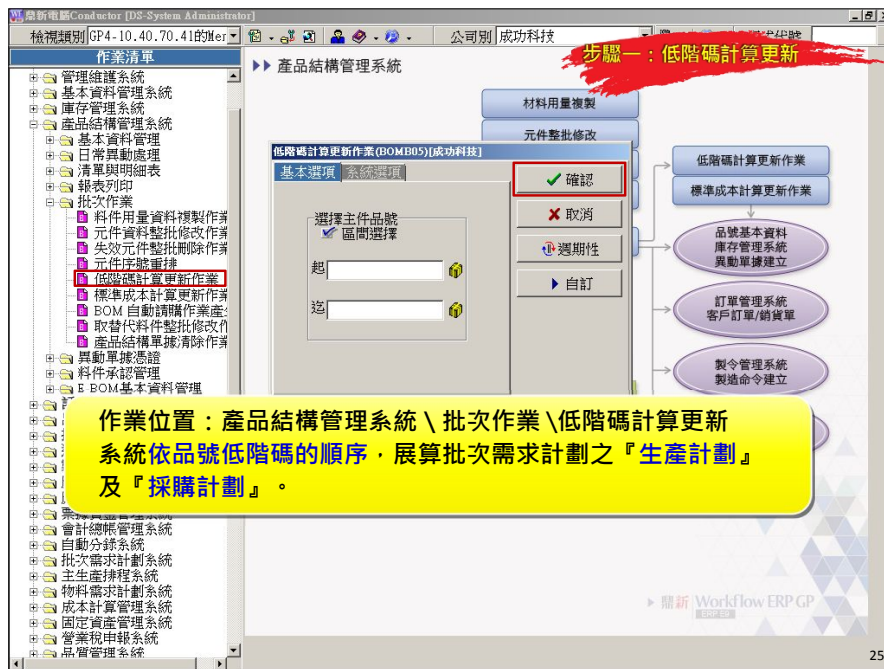


步驟二：批次需求計劃產生

➢ 批次需求計算方式：淨需求、毛需求。
 (1) **毛需求**，則以原需求數量展BOM算出生產/採購。
 (2) **淨需求**，以(需求數量 - 庫存可用量)的結果展BOM，計算出生產/採購量，且只補足該批最大補量。
 ➢ **最大補量概念**：採淨需求計算時，計算出來的需求數量不可 > 採毛需求計算出來的數量，最多只可與毛需求的數量相等。例如訂單需求100PCS，現有庫存20PCS，安全存量設定為30PCS，理論上總需求為110PCS，採淨需求計算時，計算出來的需求只有100PCS，不可大於毛需求的量

步驟二：批次需求計劃產生

計算可用量時，若預計供給或需求的日期，晚於該批的需求日，是否要納入可用量計算？
 勾選☑：料件需求日期之後的需求量/供給量「不納入」計算。
 不勾口：料件需求日期之後的需求量/供給量「納入」計算。
 < 範例說明如下頁 >

範例說明

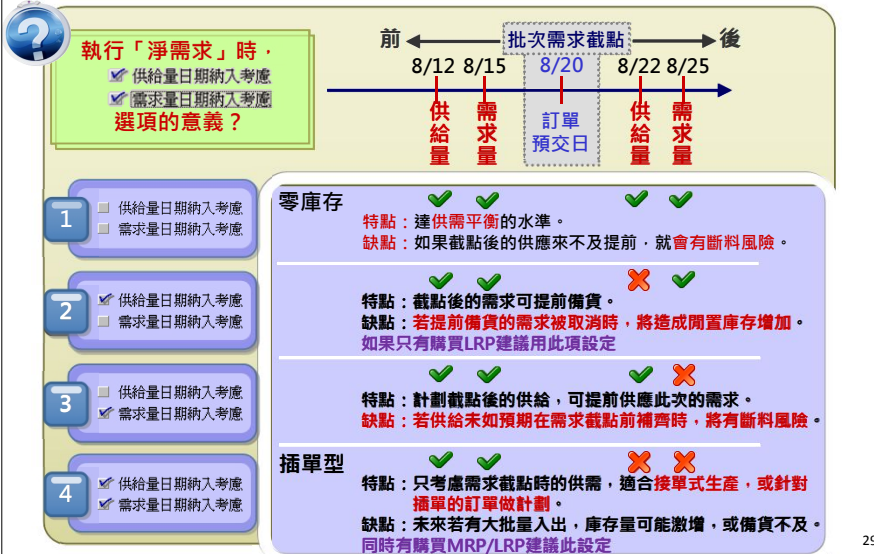

29

鼎新電腦Conductor [DS-System Administrator]

檢視類別 系統+作業別 公司別 成功機械

作業清單

- 設備維修管理系統
- 消費稅管理系統(馬來西亞)
- 採購管理系統
- 產品途徑加工計價更新作業
- 客戶商品特價產生
- 採購廠商商品調價
- 加工計價資料整批
- 標準成本計算更新
- 分期賬款結帳單產生
- 訂單變更產生製令
- 工程變更產生製令
- 變更單產生作業
- 結帳單自動結帳作
- 合約請款自動結帳
- 生產計劃維護與領
- 採購計劃維護與領
- 生產計劃發放作業
- 採購計劃發放作業
- 批次需求計劃產生

步驟二：批次需求計劃產生

選擇庫別

選擇補貨政策 全部

批次需求計算方式 淨需求

考慮安全存量

採購計劃考慮最低補量及補貨倍量

供給量日期納入考慮

供給量截止日

需求日期納入考慮

選擇需產生之計劃 全部

對於已發放料件之補充方式 重新補充

確認 取消 週期性 自訂

➢ 選擇需產生之計劃：可選擇生產計劃、採購計劃或全部。


(1) 建議第一次執行計劃產生時，選擇「全部」（同時產生生產及採購計劃）；或是選擇「生產計劃」，執行完後再以產生出來之生產計劃為來源，選擇「採購計劃」來產生採購計劃。

(2) 第一次產生計劃時，不可以直接選「採購計劃」，因為系統是依生產計劃的內容來產生採購計劃。

(3) 「品號資料建立作業」之品號屬性若為：

- M(自製件)或S(託外加工件)→產生生產計劃；
- P(採購件)→產生採購計劃。

30

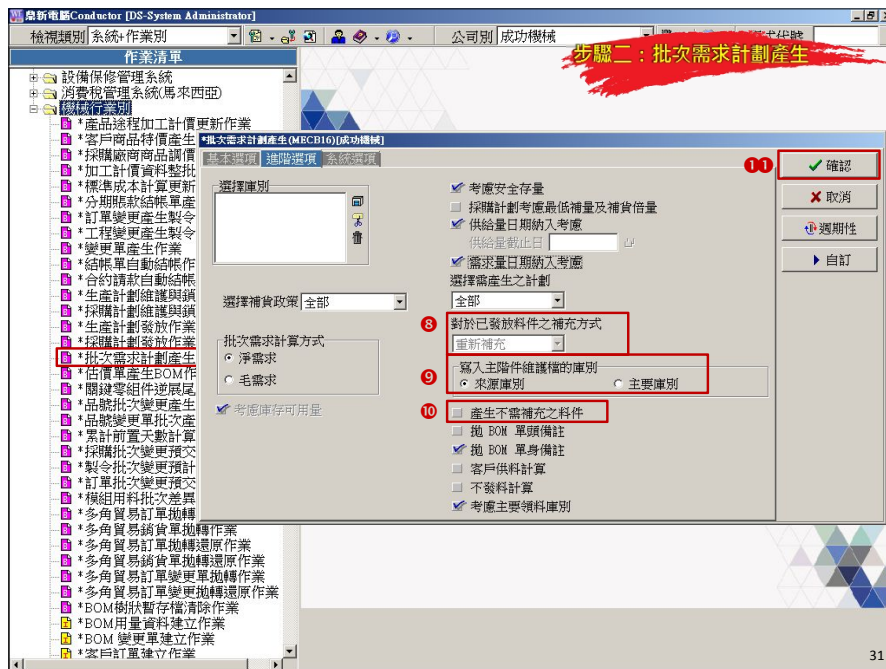

批次生產計劃維護-依品號(LRP101)[成功維護]

資料(E) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

計劃批號: [M20161201] 廠別: 001 台北廠

備註: 系統產生

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別
MECM1004	主軸外箱		2017/06/13		1B	半成品倉	5	組	2017/06/06		2017/06/06	510
MECS1014	主軸箱		2017/06/05		1B	半成品倉	5	組	2017/05/01		2017/05/01	511
MECS1024	馬達座				1B	半成品倉	5	組	2017/05/16		2017/05/16	511
MECS1034	軸承座				1B	半成品倉	5	組	2017/05/09		2017/05/09	511
MECY1004	主軸組				1B	半成品倉	5	組	2017/06/14		2017/06/14	510

庫存量 0.000
安全存量 0.000
預計進貨 0.000
預計採購 0.000
請拋採未確認 0.000
預計生產 0.000
預計銷售 0.000
預計領用 0.000
計劃採購 0.000
計劃生產 0.000
計劃銷售 0.000
計劃領用 5.000
毛需求量 5.000
已發放量 0.000

確定 取消

修改 單身資料筆數: 5 127.0.0.1 - 211 33

步驟三：檢視批次生產計劃維護

發放過的計劃批號，重新產生時，顯示上次已發放量供參考。

批次生產計劃維護-依品號(LRP101)[成功維護]

資料(E) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

計劃批號: ****M20161201 廠別: 001 台北廠

備註: 系統產生

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號
510	廠內製令單	601	製一課		00:00:00	NTD	0		4:銷售預測	****	M20161201	0001
511	託外製令單	3004	訊達公司		00:00:00	NTD	12,000		4:銷售預測	****	M20161201	0001
511	託外製令單	3005	達比公司		00:00:00	NTD	20,000		4:銷售預測	****	M20161201	0001
511	託外製令單	3004	訊達公司		00:00:00	NTD	18,000		4:銷售預測	****	M20161201	0001
510	廠內製令單	601	製一課		00:00:00	NTD	0		4:銷售預測	****	M20161201	0001

6 7 8 9 10

預設「BOM用量資料建立作業」的「製令單別」，可修改。
生產計劃依此單別發放成製令單。

生產品號屬性為「M:自製件」，預設品號資料的「生產線別」。

生產品號屬性為「S:託外加工件」，預設品號資料的「主供應商」及預設加工計價資料的最新「加工單價」。

瀏覽 單身資料筆數: 5 MECM1004 主軸外箱 127.0.0.1 - 211 34

步驟三：檢視批次生產計劃維護

批次生產計劃維護-依品號 (LRPI01) [成功機核]

資料(L) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註: 系統產生

步驟三：檢視批次生產計劃維護

製令單別	製令名稱	加工廠商/線別	簡稱	外包類型	作業時間	幣別	加工單價	鎖定	依據	來源單別	來源單號	來源序號
510	廠內製令單	601	製一課		00:00:00	NTD	0		4:銷售預測	****	M20161201	0001
511	託外製令單	3004	訊達公司		00:00:00	NTD	12,000		4:銷售預測	****	M20161201	0001
511	託外製令單	3005	達比公司		00:00:00	NTD	20,000		4:銷售預測	****	M20161201	0001
511	託外製令單	3004	訊達公司		00:00:00	NTD	18,000		4:銷售預測	****	M20161201	0001
510	廠內製令單	601	製一課		00:00:00	NTD	0		4:銷售預測	****	M20161201	0001

點選子單身按鈕，查看該生產品號的相依需求料件。
註：相依需求為生產品號之單階用量清單

瀏覽 單身資料筆數: 5 MECM1004 主軸外箱 127.0.0.1 - 211

批次採購計劃維護-依品號 (LRPI03) [成功機核]

資料(L) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註: 系統產生

步驟四：檢視批次採購計劃維護

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
MECP1014	主軸箱(鑄料)		2017/04/28	1003	日昇公司	1C	原料倉	5 組		2017/01/13	NTD	1,100	
MECP1024	主軸前蓋		2017/06/05	1003	日昇公司	1C	原料倉	5 組		2017/03/13	NTD	935	
MECP1034	馬達座(未噴漆)		2017/05/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	3 組		2017/02/13	NTD	700	
MECP1044	軸承座(未噴漆)	150x80x177	2017/05/08	1003	日昇公司	1C	原料倉	5 組		2017/01/30	NTD	1,000	

➢ 根據生產計劃的相依領料需求推算。
交貨日=預計領料日-檢驗天數-1

瀏覽 單身資料筆數: 4 MECP1014 主軸箱(鑄料) 127.0.0.1 - 211 36

批次採購計劃維護-依品號(LRP103)[成功維護]

資料(L) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註: 系統產生

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
MECP1014	主軸箱(鑄料)		2017/04/28	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組	2017/01/13	NTD	1,100	
MECP1024	主軸前蓋		2017/06/05	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組	2017/03/13	NTD	933	
MECP1034	馬達座(未噴漆)		2017/05/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	3	組	2017/02/13	NTD	700	
MECP1044	軸承座(未噴漆)	150x80x177	2017/05/08	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組	2017/01/30	NTD	1,000	

4 5 6

> 採購日=交貨日-採購前置天數
 • 「批次需求計算方式」=毛需求，採購數量=毛需求量
 • 「批次需求計算方式」=淨需求，採購數量=毛需求量-庫存可用量

瀏覽 單身資料筆數: 4 MECP1014 主軸箱(鑄料) 127.0.0.1 - 211 37

鼎新電腦 DataSystems

動手做做看!
批次需求計劃產生

因業務預估半年後CNC車床機台會接到訂單，由於CNC機台使用的主軸組相關半成品生產加工時程較長，且它也適用不同CNC車床機型；為避免急單生產不及，經策略會議討論後決議將主軸組先行安排生產5台納入庫存備用。

批次生產計劃維護-依品號(LRP101)[成功維護]

資料(L) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註:

品號 品名

MECP1004 主軸外

MECS1014 主軸箱

MECS1024 馬達座

MECS1034 軸承座

MECY1004 主軸組

瀏覽 單身資料筆數: 5

批次採購計劃維護-依品號(LRP103)[成功維護]

資料(L) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註:

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位
MECP1014	主軸箱(鑄料)		2017/04/28	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組
MECP1024	主軸前蓋		2017/06/05	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組
MECP1034	馬達座(未噴漆)		2017/05/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	3	組
MECP1044	軸承座(未噴漆)	150x80x177	2017/05/08	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組

38

報表應用-生產線負荷明細表

 **使用時機：**對於已經發放的正式製造命令或仍在計劃中之生產計劃，想瞭解其對生產線所造成之負荷情形，可利用此報表預估後續生產時所需耗費人時、機時，可作為估計生產進度用，藉以評估生產計劃之可行性，並做為調整生產計劃或調整產能之依據。

 **作業位置：**批次需求計劃系統 \ 報表列印 \ 生產線負荷明細表

生產線負荷明細表(LRP07)(成功科技)

基本選項

選擇廠別

選擇生產線別
區間選擇

選擇日期
起 / / 迄 2017/06/30

選擇生產負荷來源
☒ 製造命令
☐ 人時機時來源
☐ 製令製程(當無製程時,取產品途程)
☐ 產品途程
☒ 生產計劃

確認
取消
週期性
自訂
即時報表

39

台管理控制台[System Administrator][成功科技] [圖覽報表(生產線負荷明細表-工作代號:20160614000004-201606140001)]

成功科技

生產線負荷明細表

報表日期: 2016/03/01 期間: 2016/03/01 至 2016/04/30

廠別	生產線	日期	負荷來源	人工小時	機器小時	產品品號	品名	規格	生產數量
001 台北廠	601 製一課	2016/03/01	510 - 1050301001			IN4001	辦公椅SL	300	100.00
		2016/03/01	510 - 20160301001			410001	數位相機-SL系列	SL1001	100.00
		2016/03/03	510 - 1050303001			IN4001	辦公椅SL	500	100.00
		2016/03/10	510 - 1050305001			IN4001	辦公椅SL	500	100.00
		2016/03/10	512 - 1050310001			410006	數位相機-SL1322架	SL1322	100.00
		2016/03/11	510 - 1050310001			ea	數位相機-SL1322架	SL1322	50.00
		2016/03/21	510 - 1050306001			IN4007	辦公椅SP	750	95.00
		22000160305001	510 - 1050400001			430001	數位相機-SV系列	SV1001	100.00
		2016/04/01	510 - 1050401001			IN4001	辦公椅SL	500	100.00
		2016/04/03	510 - 1050403001			IN4001	辦公椅SL	500	100.00
		2016/04/10	510 - 1050405001			IN4001	辦公椅SL	500	100.00
		2016/04/10	512 - 1050410001			410006	數位相機-SL1322架	SL1322	100.00
		2016/04/11	510 - 1050406001			IN4007	辦公椅SP	750	50.00
		2016/04/13	510 - 1050406001			ea	數位相機-防水01架	SL1001	950.00
		2016/03/11	512 - 1050311001			310006	LCD Display	310006	100.00
		2016/03/16	521 - 1050316001			310006	LCD Display	310006	100.00
		2016/04/11	512 - 1050411001			310006	LCD Display	310006	100.00
		2016/04/16	521 - 1050416001			310006	LCD Display	310006	100.00
		2016/03/09	510 - 1050309001	2.67		0-M2	中支	一絲	100.00
		2016/03/09	510 - 1050309002	1.83		0-M2	中支	一絲	50.00
		2016/03/09	510 - 1050309003	6.00		0-M2	中支	一絲	300.00
		2016/04/09	510 - 1050409001	2.67		0-M2	中支	一絲	100.00
		2016/04/09	510 - 1050409002	1.83		0-M2	中支	一絲	50.00
		2016/04/09	510 - 1050409003	6.00		0-M2	中支	一絲	300.00
CPA1 裁切線		2016/03/09	510 - 1050309001	2.67		0-M2	中支	一絲	100.00
		2016/03/09	510 - 1050309002	1.83		0-M2	中支	一絲	50.00
		2016/03/09	510 - 1050309003	6.00		0-M2	中支	一絲	300.00
		2016/04/09	510 - 1050409001	2.67		0-M2	中支	一絲	100.00

結束

座標(英吋)X:9.38, Y:6.24 (X: 900, Y: 599)

五、庫存式生產案例



庫存式生產計劃流程

1. 因業務預估半年後CNC車床機台會接到訂單，由於CNC機台使用的主軸組相關半成品生產加工時程較長，且它也適用不同CNC車床機型；為避免急單生產不及，經策略會議討論後決議將主軸組先行安排生產5台納入庫存備用。
2. 客戶-環球公司於本月5日向業務人員訂購「MECM4004- KX204 CNC車床」1台，要求5個月後當月20日出貨。
3. 生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
4. 再次檢視生產及採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5. 當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備出貨給客戶。
6. 業務單位須定期檢視銷售預測資料，針對已過期的預測資料作指定結案。

43

客戶訂單建立作業 (MECI03) (成功機號)

資料(左) 功能(中) 離開(右)

詳細欄位 資料欄位

訂單單別 220 國內訂單 單號日期 2016/12/05 拋轉狀態 N:未拋轉
 訂單單號 20161205003 客戶代號 1001 環球公司 訂單日期 2016/12/05
 流程代號 版次 0000 不控管信用額度 確認者 DS 系統管理者
 收入遞延天數 3 EBO拋轉狀態 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 出貨資料 國外訂單一 國外訂單二 國外備註 唛頭資料 多角貿易

部門代號 30 業務部門 稅別碼 S05 銷項三聯式發票-應稅外加
 業務人員 303 陳外務 課稅別 2:應稅外加 單身多稅率
 出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.000% 傳送次數 0
 交易幣別 NTD 分期帳款 訂金比率 10.00% 審核狀態 N:不執行電子簽
 匯率 1 付款條件 2D1 結帳後一星期收款 60天票期
 客戶單號 價格條件

序	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	類型	贈品量	預交日	預測代號	預測序號	結案碼
0001	MECM4004	KX204 CNC車床	1A	成品倉		1	0	1.贈品量	0	2017/06/25	M20161201	0001	N:未結案

核銷銷售預測可以不同品號、不同幣別。

訂單金額 2,400,000 總數量 1
 訂單稅額 120,000 總毛重 (Kg) 0
 合計 2,520,000 總材積 (CUFT) 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECM4004 KX204 CNC車床 127.0.0.1 - 211

*銷售預測建立作業(MEC110)[成功機幀]

資料(E) 功能(F) 離開(X)

詳細開位 資料清單

預測代號: M20161201 通路:

客戶代號: 型態:

部門: 地區:

業務員: 國家:

☒ 納入生產計劃 路線:


備註: 其他:



廠別: 001 台北廠

系統更新

序號	品號	品名	規格	日期	預測庫	庫別名稱	預測數量	已受訂量	單位	幣別	單價	預測金額	結案碼	優先順序	鎖定交期
0001	MECY1004	主軸組		2017/06/15	1B	半成品倉	5	1	組	NTD	0	0.00	N:未結	00010	

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECY1004 主軸組 127.0.0.1 - 211 45

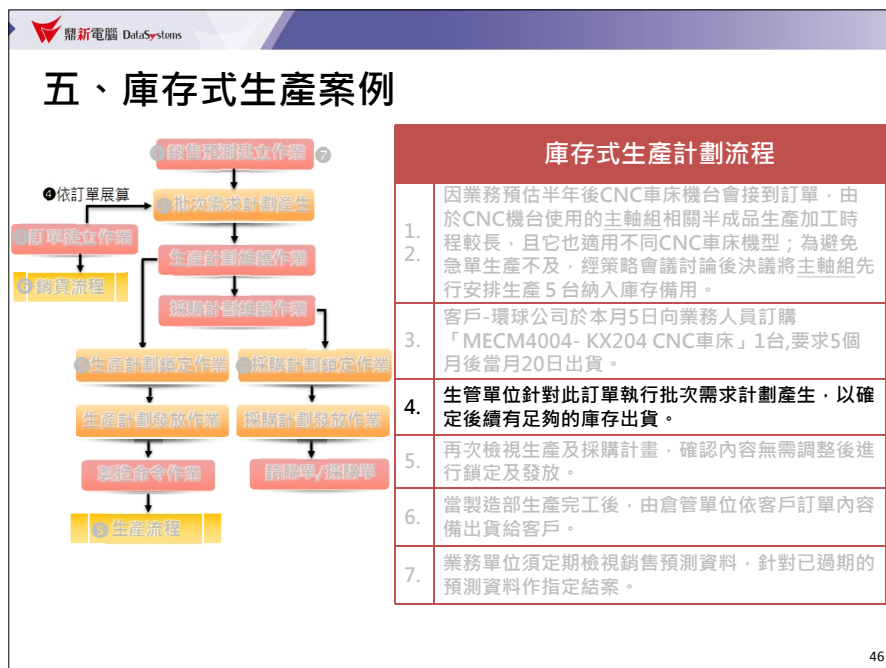

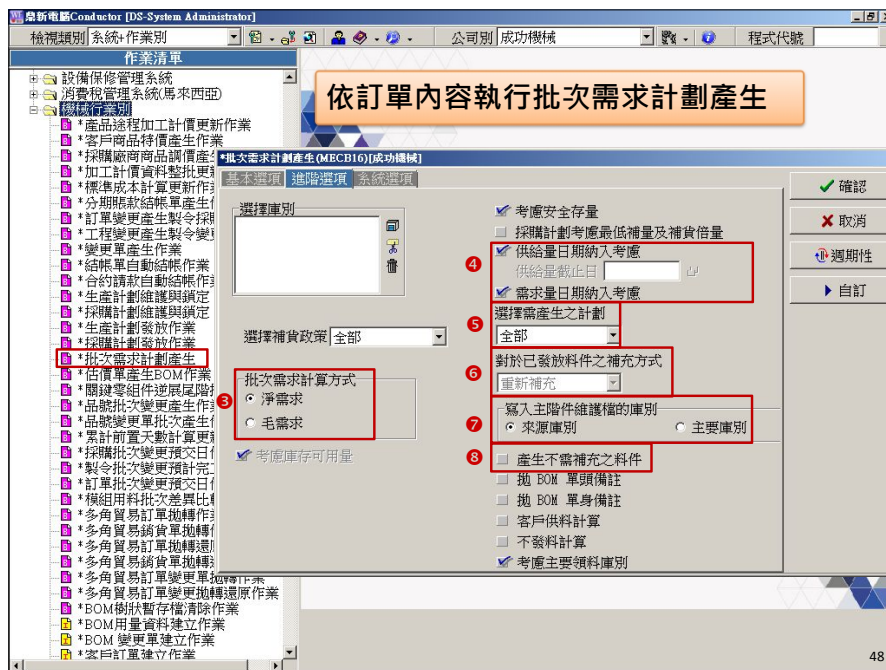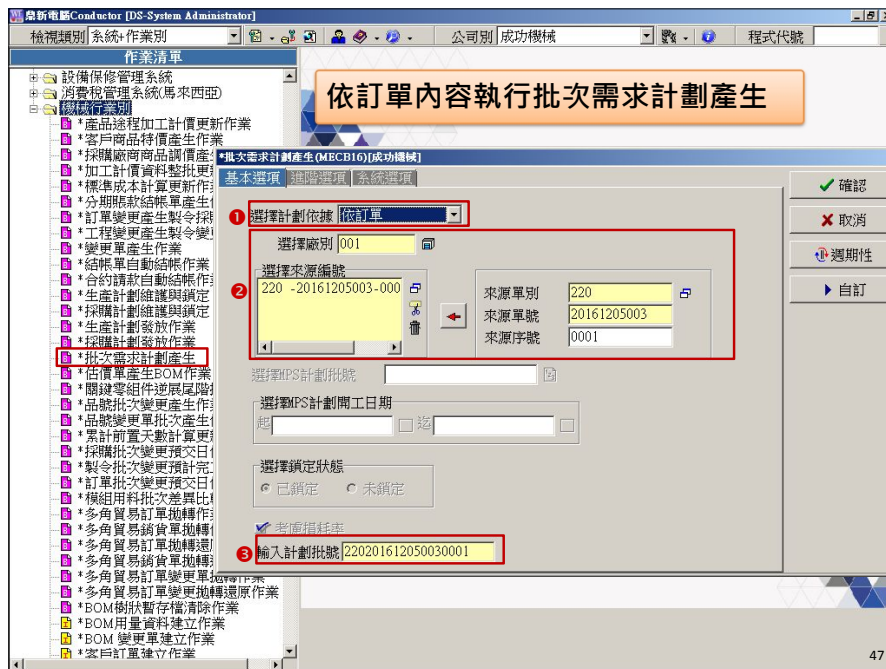

批次生產計劃維護-依品號 (MRP101) [成功開啟]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

計劃批號 220201612050030001 廠別 001 台北廠

備註

結果

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	BOM日期	製令單別
MECM2004	尾座組		2017/06/22		1B	半成品倉	1	組		2017/06/15	2017/06/15	510
MECM2101	油壓刀塔8支刀		2017/06/22		1B	半成品倉	1	組		2017/06/15	2017/06/15	510
MECM4004	KX204 CNC車床		2017/06/23		1A	成品倉	1	台		2017/06/23	2017/06/23	510
MECS2101	刀具座8支刀		2017/06/22		1B	半成品倉	1	組		2017/06/15	2017/06/15	511

▶ 無MECM1004、MECS1014、MECS1024、MECS1034
 以MECM1004為例：

需求類

計劃銷售量
預計銷售量
預計領用量
計劃領用量(1)

-

供給類

計劃生產量(5)
計劃進貨量
預計生產量
預計進貨量
預計請購量
請拋採未確認量
現有庫存量

淨需求 =

= -4 (由於 < 0 因此不需生產)

瀏覽 單身資料筆數: 4 MECM2004 尾座組 127.0.0.1 - 211 49

鼎新電腦 DataSystems

動手做做看!
客戶訂單建立作業
批次需求計劃產生

案例操作：
將當月5日環球公司訂單作確認；並由生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。

客戶訂單建立作業 (MRP103) [成功開啟]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細欄位 新增資料

訂單單別 220 國內訂單 單據日期 2016/12/05 採購狀態 新-未開辦 訂單日期 2016/12/05

訂單單號 20161205003 客戶代號 1001 環球公司 訂單日期 2016/12/05

流程代號 3 廠次 0000 不控管信用額度 確認者 系統管理 系統管理

收入遞延天數 3 EBO報轉狀態 不需報轉

客戶單號

基本資訊

部門代號 10 業務部門 稅別碼 505 統籌三層式裝 營業稅率 5.000%

業務人員 03 關外務 營業稅率 5.000%

出貨廠別 001 台北廠 營業稅率 5.000%

交易幣別 010 匯率 1.000%

客戶單號

分期帳款 訂金比率 10.000%

付款條件 20 結帳後一星期收

價格條件

品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	訂單數量	已交數量	類型
MECM4004	KX204 CNC車床	1A	成品倉	1	0.1	0.1	備品

訂單金額 2,400,000 總數量 1

訂單稅額 120,000 總毛重 (kg) 0

合計 2,520,000 總材積 (CBF) 0

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECM4004 KX204 CNC車床

批次需求計劃產生 (MRP106) [成功開啟]

基本資訊

選擇計劃依據 選擇單別 001

選擇來源編號 220 - 20161205003-000

來源單別 220

來源單號 20161205003

來源序號 0001

選擇MRP計劃批號

選擇MRP計劃開工日期

選擇鎖定狀態 已鎖定 未鎖定


考慮損耗率

輸入計劃批號 220201612050030001

確認 取消 過期性 自訂

50

五、庫存式生產案例

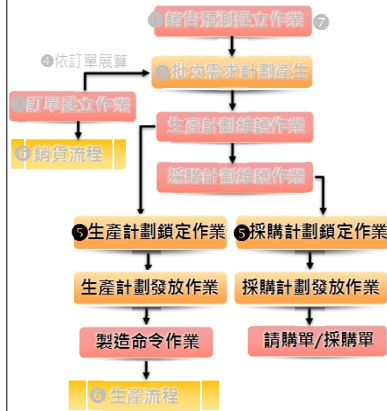

庫存式生產計劃流程

1. 因業務預估半年後CNC車床機會接到訂單，由於CNC機台使用的主軸組相關半成品生產加工時程較長，且它也適用不同CNC車床機型；為避免急單生產不及，經策略會議討論後決議將主軸組先行安排生產5台納入庫存備用。
2. 客戶-環球公司於本月5日向業務人員訂購「MECM4004- KX204 CNC車床」1台，要求5個月後當月20日出貨。
3. 生管單位針對此訂單執行批次需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
4. 再次檢視生產及採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5. 當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備出貨給客戶。
6. 業務單位須定期檢視銷售預測資料，針對已過期的預測資料作指定結案。

51

鼎新電腦Conductor [DS-System Administrator]

檢視類別 系統+作業別 公司別 成功機械 程式代號

作業清單

- 設備保養管理系統
- 消費稅管理系統(馬來西亞)
- 生產計劃
 - *產品途徑加工計畫更新作業
 - *客戶商品特價產生作業
 - *採購廠商商品調價產生作業
 - *加工計畫資料整批更新作業
 - *標準成本計算更新作業
 - *分期開款結帳單產生作業
 - *訂單變更產生製令採購變更建議
 - *工程變更產生製令變更建議作業
 - *變更單產生作業
 - *結帳單自動結帳作業
 - *合約請款自動結帳作業
 - *生產計劃維護與鎖定
 - *採購計劃維護與鎖定
 - *生產計劃發放作業
 - *採購計劃發放作業
 - *批次需求計劃產生
 - *估價單產生BOM作業
 - *關鍵零件選展展尾端批次作業
 - *品號批次變更產生作業
 - *品號變更單批次產生作業
 - *累計前次大數計算更新作業
 - *採購批次變更預完工日作業
 - *製令批次變更預完工日作業
 - *訂單批次變更預完工日作業
 - *模組用料批次差異比較作業
 - *多角貿易訂單拋轉作業
 - *多角貿易銷貨單拋轉作業
 - *多角貿易銷貨單拋轉還原作業
 - *多角貿易銷貨單拋轉還原作業
 - *多角貿易銷貨單變更單拋轉作業
 - *多角貿易銷貨單變更單拋轉還原作業
 - *BOM樹狀圖存檔清除作業
 - *BOM用量資料建立作業
 - *BOM變更單建立作業
 - *客戶訂單建立作業

作業目的

- 將檢核未發放的生產計劃，設定為「鎖定」，作為計劃發放的控制依據。
- 重新執行「需求計劃產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。
- 批次生產計劃維護的「鎖定」可以透過：
 - (1) 執行「生產計劃鎖定作業」更新
 - (2) 手動勾選

***生產計劃維護與鎖定(MECB12)[成功機城]**

基本選項 系統選項

選擇計劃批號: ****W20161201

分類方式: 生管採購

類別: 4105 鑄件-主軸箱

選擇加工廠商: 區間選擇

選擇開工日期: 起 [31] 迄 [31]

選擇計劃人員: 區間選擇

選擇完工日期: 起 [31] 迄 [31]

步驟八：生產計劃鎖定作業

可選分號分類方式、類別、加工廠商等篩選條件，展出計劃內容以便進行維護與鎖定。

例如：主軸箱或刀塔組要事先預組，可以指定品號類別為【生管採購】，類別＝鑄件-主軸箱，維護好並鎖定後發放製令。

鎖定碼	生產品號	品名	規格	單位	完工日	加工廠商/線別	庫別	生產數量	庫別名稱	開工日
☒	MECM1004	主軸外箱		組	20170613	601	1B	5	半成品倉	20170606
☒	MECS1014	主軸箱		組	20170605	3004	1B	5	半成品倉	20170501
☒	MECS1024	馬達座		組	20170613	3005	1B	5	半成品倉	20170516

4 全選 取消全選 儲存設定

***生產計劃維護與鎖定(MECB12)[成功機城]**

基本選項 系統選項

選擇計劃批號: ****W20161201

分類方式: 生管採購

類別: 4105 鑄件-主軸箱

選擇加工廠商: 區間選擇

選擇開工日期: 起 [31] 迄 [31]

選擇計劃人員: 區間選擇

選擇完工日期: 起 [31] 迄 [31]

確認

取消

週期性

自訂

鎖定碼	生產品號	品名	規格	單位	完工日	加工廠商/線別	庫別	生產數量	庫別名稱	開工日
☒	MECM1004	主軸外箱		組	20170613	601	1B	5	半成品倉	20170606
☒	MECS1014	主軸箱		組	20170605	3004	1B	5	半成品倉	20170501
☒	MECS1024	馬達座		組	20170613	3005	1B	5	半成品倉	20170516

可針對欄位作欄寬及位置調整，調整後點選【儲存設定】存檔。

全選 取消全選 儲存設定

批次生產計劃維護-依品號 (RPI01) [成功機械]

資料(L) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料清單

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註:

結果

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	鎖定	開工日	BOM日期	製令單別	製令
MECM1004	主軸外箱		2017/06/13		1B	半成品倉	5	組	☒	2017/06/06	2017/06/06	510	廠內
MECS1014	主軸箱		2017/06/05		1B	半成品倉	5	組	☒	2017/05/01	2017/05/01	510	廠內
MECS1024	馬達座		2017/06/13		1B	半成品倉	5	組	☒	2017/05/16	2017/05/16	510	廠內
MECS1034	軸承座	150x80x177mm	2017/06/13		1B	半成品倉	5	組	☐	2017/05/09	2017/05/09	510	廠內
MECY1004	主軸組		2017/06/14		1B	半成品倉	5	組	☐	2017/06/14	2017/06/14	510	廠內

➤ 批次生產計劃維護的「鎖定」可以透過：
 (1)執行「生產計劃鎖定作業」更新
 (2)手動勾選
 ➤ 備註：
 生產計劃新增或變更後，在半成品及材料重新展算前，該生產計劃也必須勾選「鎖定」。

瀏覽 單身資料筆數: 5 MECS1034 軸承座 127.0.0.1 - 211 55

最新電腦Conductor [DS-System Administrator]

檢視類別: 系統+作業別 公司別: 成功機械 程式代號:

作業清單

- 設備管理系統
- 消費稅管理系統(馬來西亞)
- 生產計劃維護
 - *產品途徑加工計價更新作業
 - *客戶商品特價產生作業
 - *採購廠商商品調價產生作業
 - *加工計價資料整批更新作業
 - *標準成本計算更新作業
 - *分期賬款結帳單產生作業
 - *訂單變更產生製令採購變更建議
 - *工程變更產生製令變更建議作業
 - *變更單產生作業
 - *結帳單自動結帳作業
 - *合約請款自動結帳作業
 - *生產計劃維護與鎖定
 - *採購計劃維護與鎖定
 - *生產計劃發放作業
 - *採購計劃發放作業
 - *批次需求計劃產生
 - *估價單產生BOM作業
 - *關鍵零件選展展層批次作業
 - *品號批次變更產生作業
 - *品號變更單批次產生作業
 - *累計前置大數計算更新作業
 - *採購批次變更預交日作業
 - *製令批次變更預交完工日作業
 - *訂單批次變更預交日作業
 - *模組用料批次差異比較作業
 - *多角貿易訂單拋轉作業
 - *多角貿易銷售單拋轉作業
 - *多角貿易訂單拋轉還原作業
 - *多角貿易銷售單拋轉還原作業
 - *多角貿易訂單變更單拋轉還原作業
 - *多角貿易訂單變更單拋轉還原作業
 - *BOM樹狀圖存檔清除作業
 - *BOM用量資料建立作業
 - *BOM變更單建立作業
 - *客戶訂單建立作業

作業目的

➤ 將生產計劃發放成為「廠內/託外製造命令」，作為生產的依據。
 ➤ 未做鎖定的資料後續也可發放。

56

***生產計劃發放作業(MECB14)(成功機城)**

基本選項 詳細維護 維護後發放

分類方式 生管採購

類別 4105 鑄件-主軸箱

選擇品號

起: [] 迄: []

☐ 篩選開工日

輸入開工日

起: [] 迄: []

☐ 篩選完工日

輸入完工日

起: [] 迄: []

選擇計劃批號

起: ****W20161201 迄: ****W20161201

選擇廠別 []

選擇庫別 []

選擇狀態

☐ 鎖定 ☒ 全部

選擇製令單別 []

選擇製令性質 全部

選擇計劃人員 []

選擇銷售預測代號-序號

☒ 區間選擇

起: [] 迄: []

步驟八：生產計劃發放

取消 週期性 自訂

➤ 可依分號分類方式、類別、預測代號 - 序號等篩選條件，展出計劃內容以便進行發放。
例如：主軸箱或刀塔組要事先預組，可以指定品號類別為【生管採購】，類別 = 鑄件 - 主軸箱，維護後發放製令。

批次生產計劃維護-依品號(LRP101)(成功機城)

資料(2) 功能(2) 離開(2)

詳細欄位 查詢結果

計劃批號 ****W20161201 廠別 001 台北廠

備註 []

結果

品號	品名	規格	完工日	完工時間	庫別	庫別名稱	生產數量	單位	開工日	開工時間	BOM日期	製令單別
MECS1034	軸承座	150x80x177mm	2017/06/13		1B	半成品倉	5	組	2017/05/09		2017/05/09	511
MECY1004	主軸組		2017/06/14		1B	半成品倉	5	組	2017/06/14		2017/06/14	510

➤ 生產計劃發放後，「批次生產計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被**清空**。
➤ 另可於製令管理系統之「製造命令建立作業」**查詢**發放後所產生之製令工單。
➤ 後續MECS1034維護後，如果確定要發放，再重複執行「生產計劃維護與鎖定、生產計劃發放作業」即可！

瀏覽 單身資料筆數: 2 MECS1034 軸承座 127.0.0.1 - 211 58

*製造命令建立作業(MEC110)[成功機核]

資料(L) 功能(F) 離開(X)

詳細價位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20161201003 產品品號 MECM1004 傳送次數 0

開單日期 2016/12/01 品名 主軸外箱

性質 1:廠內製令 規格

類型 2.正式品號 單位 組 BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量 廠內/許外 進階資料 包裝資料 生產資訊 資訊

預計產量 5

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2017/06/06

預計完工 2017/06/13

BOM日期 2017/06/06

確認日 2016/12/01

實際開工 / /

實際完工 / /

確認者 DS 系統管理者

審核狀態 N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被
2.正	MECP1024	主軸前蓋		5	0	5	組	****		1C	原料倉	1:直接材		MECP1024	**
2.正	MECS1014	主軸箱		5	0	5	組	****		1B	半成品倉	1:直接材		MECS1014	**

瀏覽 單身資料筆數:2 MECP1024 主軸前蓋 127.0.0.1 - 211 59

*製造命令建立作業(MEC110)[成功機核]

資料(L) 功能(F) 離開(X)

詳細價位 資料瀏覽

製令單別 510 廠內製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20161201003 產品品號 MECM1004 傳送次數 0

開單日期 2016/12/01 品名 主軸外箱

性質 1:廠內製令 規格

類型 2.正式品號 單位 組 BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量 廠內/許外 進階資料 包裝資料 生產資訊 資訊

計劃批號 ****20161201 客戶代號

母製令號 510 20161201003 客戶單號

訂單單號 客戶品號

採購限制日期 / /

專案代號

備註

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被
2.正	MECP1024	主軸前蓋		5	0	5	組	****		1C	原料倉	1:直接材		MECP1024	**
2.正	MECS1014	主軸箱		5	0	5	組	****		1B	半成品倉	1:直接材		MECS1014	**

瀏覽 單身資料筆數:2 MECP1024 主軸前蓋 127.0.0.1 - 211 60

*製造命令建立作業(MEC110)[成功機械]

資料(L) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20161201002 產品品號 MBCS1014 傳送次數 0

開單日期 2016/12/01 品名 主軸箱

性質 2:託外製令 規格

類型 2.正式品號 單位 組 BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/託外 進階資料 包裝資料 生產資訊 資訊

預計產量 5

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2017/05/01 BOM日期 2017/05/01

預計完工 2017/06/05 確認日 2016/12/01

實際開工 / / 確認者 DS 系統管理者

實際完工 / / 審核狀態 N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被
2.正	MBCP1014	主軸箱(鑄)		5	0	5	組	****		1C	原料倉	1:直接材		MBCP1014	**

瀏覽 單身資料筆數:1 MEC1014 主軸箱(鑄料) 127.0.0.1 - 211 61

*製造命令建立作業(MEC110)[成功機械]

資料(L) 功能(F) 離開(E)

詳細欄位 資料瀏覽

製令單別 511 託外製令單 狀態碼 1:未生產 急料 列印 0

製令單號 20161201003 產品品號 MBCS1024 傳送次數 0

開單日期 2016/12/01 品名 馬達座

性質 2:託外製令 規格

類型 2.正式品號 單位 組 BOM版次 0000 版次 0000

EBO拋轉狀態 不需拋轉

時程與產量

廠內/託外 進階資料 包裝資料 生產資訊 資訊

預計產量 5

已領套數 0

已生產量 0

報廢數量 0

預計開工 2017/05/16 BOM日期 2017/05/16

預計完工 2017/06/13 確認日 2016/12/01

實際開工 / / 確認者 DS 系統管理者

實際完工 / / 審核狀態 N:不執行電子審核

類型	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別	庫別名稱	材料型態	取替代件	被取替代品號	被
2.正	MBCP1034	馬達座(未		5	0	5	組	****		1C	原料倉	1:直接材		MBCP1034	**

瀏覽 單身資料筆數:1 MEC1034 馬達座(未噴漆) 127.0.0.1 - 211

動手做做看！

生產計劃鎖定作業
生產計劃發放作業

案例操作：

再次檢視生產計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放

鼎新電腦生產計畫管理 (MRP/110) (客戶端)

資料(主) 功能(F) 離開(E)

詳細說明 資料瀏覽

製令單別	單別名稱	製令單號	急料	開單日期	列印	採購限制日期	星期	性質	狀態碼
510	廠內製令單	20161201003		2016/12/01	0			1:廠內製令	1:未生產
511	託外製令單	20161201002		2016/12/01	0			2:託外製令	1:未生產
511	託外製令單	20161201003		2016/12/01	0			2:託外製令	1:未生產

時程與產量

類別	廠商/託外	總額資料	包裝資料	生產資料
預計產量	5			
已領套數	0			
已生產量	0			
報廢數量	0			

預計開工: 2017/06/06 ☐ BOM日期: 2017/06/06 ☐
 預計完工: 2017/06/13 ☐ 確認日: 2016/12/01
 實際開工: / / ☐ 確認者: DS 系統管理者
 實際完工: / / ☐ 審核狀態: N:不執行電子審核

類別	材料品號	品名	規格	需領用量	已領用量	未領用量	單位	製程代號	製程名稱	庫別名稱	材料型態	取替代件	檢取替代件
2	正 MBP 1024	主軸前蓋		5	0	5	組	****	1C	原料倉	1:直接材	MBP 1024	
2	正 MBP 1014	主軸箱		5	0	5	組	****	1B	半成品倉	1:直接材	MBP 1014	

瀏覽 單身資料筆數: 2 MBP1024 主軸前蓋 127.0.0.1 - 211

63

鼎新電腦Conductor [DS-System Administrator]

檢視類別 系統+作業別 公司別 成功機械 程式代號

作業清單

- 設備保養管理系統
- 消費稅管理系統(馬來西亞)
- 採購計劃
- *產品遠程加工計畫更新作業
- *客戶商品特價產生作業
- *採購廠商商品調價產生作業
- *加工計畫資料整批更新作業
- *標準成本計算更新作業
- *分期賬款結帳單產生作業
- *訂單變更產生製令採購變更建議
- *工程變更產生製令變更建議作業
- *變更單產生作業
- *結帳單自動結帳作業
- *合約請款自動結帳作業
- *生產計劃維護與鎖定
- *採購計劃維護與鎖定
- *生產計劃發放作業
- *採購計劃發放作業
- *批次需求計畫產生
- *估價單產生BOM作業
- *關鍵零件選展展層批次作業
- *品號批次變更產生作業
- *品號變更單批次產生作業
- *累計前置大數計算更新作業
- *採購批次變更預交日作業
- *製令批次變更預交完工日作業
- *訂單批次變更預交日作業
- *模組用料批次差異比較作業
- *多角貿易訂單拋轉作業
- *多角貿易銷貨單拋轉作業
- *多角貿易訂單拋轉還原作業
- *多角貿易銷貨單拋轉還原作業
- *多角貿易訂單變更單拋轉作業
- *多角貿易銷貨單變更單拋轉還原作業
- *BOM樹狀圖存檔清除作業
- *BOM用量資料建立作業
- *BOM變更單建立作業
- *客戶訂單彈窗作業

作業目的

- 將檢核未發放的採購計畫後，設定為「鎖定」，作為計畫發放的控制依據。
- 重新執行「需求計畫產生」時，不須重新計算的資料可先「鎖定」。



採購計劃維護與鎖定(MECB13)[成功機核]

基本選項 系統選項

選擇計劃批號: ****W20161201

分類方式: 生管採購

類別: 4105 鑄件-主軸箱

選擇採購日期: 起 [31] 迄 [31]

選擇廠商: 區間選擇

選擇採購人員: 區間選擇

選擇計劃人員: 區間選擇

選擇交貨日: 起 [31] 迄 [31]

採購計劃產生

鎖定	品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別	庫別名稱	採購數量	採購日
☒	MECP1024	主軸前蓋		20170605	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	20170313
☒	MECP1014	主軸箱(鑄料)		20170428	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	20170113
☒	MECP1034	馬達座(未噴漆)		20170515	1003	日昇公司	1C	原料倉	3	20170213

4 全選 取消全選 儲存設定

步驟九：採購計劃鎖定

取消 週期性 自訂

4 全選 取消全選 儲存設定

65

➢ 可依採購交期之長短的需求、分號分類方式、類別、採購日等篩選條件，展出計劃內容以便進行維護與鎖定。
例如：主軸箱的零件購料時交期較長，可以指定品號類別為【生管採購】，類別＝鑄件-主軸箱，維護好並鎖定後發放請購/採購單。

採購計劃維護與鎖定(MECB13)[成功機核]

基本選項 系統選項

選擇計劃批號: ****W20161201

分類方式: 生管採購

類別: 4105 鑄件-主軸箱

選擇採購日期: 起 [31] 迄 [31]

選擇廠商: 區間選擇

選擇採購人員: 區間選擇

選擇計劃人員: 區間選擇

選擇交貨日: 起 [31] 迄 [31]

採購計劃產生

鎖定	品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別	庫別名稱	採購數量	採購日
☒	MECP1024	主軸前蓋		20170605	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	20170313
☒	MECP1014	主軸箱(鑄料)		20170428	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	20170113
☒	MECP1034	馬達座(未噴漆)		20170515	1003	日昇公司	1C	原料倉	3	20170213

7 確認 取消 週期性 自訂

6 儲存設定

全選 取消全選

➢ 可針對欄位作欄寬及位置調整，調整後點選【儲存設定】存檔。

66

批次採購計劃維護-依品號 (LRP103) [成功機械]

資料(E) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註:

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
MECP1014	主軸箱(鑄料)		2017/04/28	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組	2017/01/13	NTD	1,100	☒
MECP1024	主軸前蓋		2017/06/05	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組	2017/03/13	NTD	935	☒
MECP1034	馬達座(未噴漆)		2017/05/15	1003	日昇公司	1C	原料倉	3	組	2017/02/13	NTD	700	☒
MECP1044	軸承座(未噴漆)	150x80x177	2017/05/08	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組	2017/01/30	NTD	1,000	☒

➤ 批次採購計劃維護的「鎖定」可以透過：

(1)執行「採購計劃鎖定作業」更新

(2)手動勾選

瀏覽 單身資料筆數: 4 MECP1014 主軸箱(鑄料) 127.0.0.1 - 211 67

最新電腦Conductor [DS-System Administrator]

檢視類別: 系統+作業別 公司別: 成功機械 程式代號:

作業清單

- 設備管理系統
- 消費稅管理系統(馬來西亞)
- 採購計劃維護
 - *產品途程加工計價更新作業
 - *客戶商品特價產生作業
 - *採購廠商商品調價產生作業
 - *加工計價資料整批更新作業
 - *標準成本計算更新作業
 - *分期賬款結帳單產生作業
 - *訂單變更產生製令採購變更建議
 - *工程變更產生製令變更建議作業
 - *變更單產生作業
 - *結帳單自動結帳作業
 - *合約請款自動結帳作業
 - *生產計劃維護與鎖定
 - *採購計劃維護與鎖定
 - *生產計劃發放作業
 - *採購計劃發放作業
 - *批次需求計劃產生
 - *估價單產生BOM作業
 - *關鍵零件選展展層批次作業
 - *品號批次變更產生作業
 - *品號變更單批次產生作業
 - *累計前置天數計算更新作業
 - *採購批次變更預交日作業
 - *製令批次變更預交完工日作業
 - *訂單批次變更預交日作業
 - *模組用料批次差異比較作業
 - *多角貿易訂單拋轉作業
 - *多角貿易銷貨單拋轉作業
 - *多角貿易訂單拋轉還原作業
 - *多角貿易銷貨單拋轉還原作業
 - *多角貿易訂單變更單拋轉作業
 - *多角貿易訂單變更單拋轉還原作業
 - *BOM樹狀圖存檔清除作業
 - *BOM用量資料建立作業
 - *BOM變更單建立作業
 - *客戶訂單建立作業

作業目的

➤ 將採購計劃發放成為「請購單」或「採購單」，作為採買料件的依據。

➤ 未做鎖定的資料後續也可發放。

68

採購計劃發放作業 (MECB15) (成功機械)

基本選項 進階選項 系統選項

步驟十：採購計劃發放

分類方式: 生管採購
類別: 4105 鑄件-主軸箱

選擇廠商
起:
迄:

選擇品號
起:
迄:

選擇採購日
起:
迄:

選擇交貨日
起:
迄:

選擇廠別
選擇庫別

選擇幣別

選擇狀態
☐ 鎖定 ☐ 全部

選擇計劃人員

選擇發放方式
同品號、廠商、交貨日、交貨庫、幣別 合併發放

☒ 考慮最低補量及補貨倍量

選擇計劃批號
起: ****M20161201
迄: ****M20161201

選擇銷售預測代號-序號
☒ 區間選擇
起:
迄:

可依據採購交期之長短的需求、分號分類方式、類別、採購日等篩選條件，展出計劃內容以便進行發放。
 例如：主軸箱的零件購料時交期較長，可以指定品號類別為【生管採購】，類別＝鑄件－主軸箱，維護後發放請購／採購單。

69

採購計劃發放作業 (MECB15) (成功機械)

基本選項 進階選項 系統選項

☒ 發放採購單價為零者

☒ 預交日小於發放日期更改與發放日期相同

☐ 採購單價重新計算

☐ 依發放日期
☐ 依採購計劃之採購日

☒ 依來源單據產生專案代號

輸入單別: 33A

輸入流程代號:

輸入發放日期: 2016/12/01

輸入請購人員:

選擇採購人員方式: 輸入指定採購人員

輸入指定採購人員: 401

選擇品號採購人員

確認
 取消
 週期性
 自訂

70

批次採購計劃維護-依品號(LRP103)[成功維護]

資料(E) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

計劃批號: ****W20161201 廠別: 001 台北廠

備註:

結果

採購品號	品名	規格	交貨日	廠商代號	廠商簡稱	庫別代號	庫別名稱	採購數量	採購單位	採購日	幣別	單價	鎖定
MECP1044	軸承座(未噴漆)	150x80x177	2017/05/08	1003	日昇公司	1C	原料倉	5	組	2017/01/30	NTD	1,000	

> 採購計劃發放後，「批次採購計劃維護」作業裡已發放之品號資料會被清空。
 > 另可於採購管理系統之「請購單」或「採購單」查詢發放後所產生之單據。
 > 後續MECS1034維護後，如果確定要發放，再重複執行「採購計劃維護與鎖定、採購計劃發放作業」即可！

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECP1044 軸承座(未噴漆) 127.0.0.1 - 211 71

採購單建立作業(PUR107)[成功維護]

資料(E) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料維護

採購單別: 33A 國內採購單 單據日期: 2016/12/01 拋轉狀態: N:未拋轉

採購單號: 20161201004 供應商: 1003 採購日期: 2016/12/01

流程代號: 日昇公司 確認者: DS 系統管理者

版次: 0000 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

交易資料一 交易資料二 多角貿易 資料維護

廠別代號: 001 台北廠 列印格式: 1:中文 審核狀態: N:不執行電子審核

採購人員: 401 李採購 運輸方式: 國

交易幣別: NTD 匯率: 1 訂金分批 訂金比率: 0.00%

稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別: 2:應稅外加 營業稅率: 5.00%

備註: 列印 0 傳送次數: 0 單身多稅率

EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯至EBC

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	採購數量	已交數量	採購單價	採購金額	預交日	來源單號
0001	2.LRP	MECP101	主軸箱(鑄料)		1C	5	0	1,100	5,500	2017/04/28	****W20161201
0002	2.LRP	MECP102	主軸前蓋		1C	5	0	935	4,675	2017/06/05	****W20161201
0003	2.LRP	MECP103	馬達座(未噴漆)		1C	3	0	700	2,100	2017/05/15	****W20161201

採購金額: 12,275 稅額: 614 金額合計: 12,889

數量合計: 13

瀏覽 單身資料筆數: 3 MECP1014 主軸箱(鑄料) 127.0.0.1 - 211 72

動手做做看！ 採購計劃鎖定作業 採購計劃發放作業

案例操作：

再次檢視採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放



採購單建立作業(08107)(成功機帳)

資料(E) 功能(F) 離開(G)

詳細欄位 原稿圖樣

採購單別: 33A 國內採購單 單據日期: 2016/12/01 拋轉狀態: 原:未拋轉
採購單號: 20161201004 供應商: 1003 採購日期: 2016/12/01
流程代號: 日昇公司 確認者: DS 系統管理者
版次: 0000 EBO拋轉狀態: 不需拋轉

交易資料一

廠別代號: 001 台北廠 列印格式: 1:中文 審核狀態: 原:不執行電子審核
採購人員: 001 李採購 運輸方式: 1
交易幣別: TWD 匯率: 1 訂金分拆 訂金比率: 0.00%
稅別碼: P05 進項三聯式發票-應稅外加 課稅別: 2:應稅外加 營業稅率: 5.00%
備註: 列印: 0 傳送次數: 0 單身多稅率
EBC確認碼 EBC採購單號 EBC採購版次 匯空EBC

序號	來源	品號	品名	規格	交貨庫別	採購數量	已交數量	採購單價	採購金額	預交日	求單單號
0001	2.LRP	MECP101	主軸箱(精料)	IC	5	0	1,100	5,500	2017/04/28	****W201612C	
0002	2.LRP	MECP102	主軸箱蓋	IC	5	0	935	4,675	2017/06/05	****W201612C	
0003	2.LRP	MECP103	馬達座(未噴漆)	IC	3	0	700	2,100	2017/05/15	****W201612C	

採購金額: 12,275 稅額: 614 金額合計: 12,889
數量合計: 13

瀏覽 單身資料筆數: 3 MECP1014 主軸箱(精料) 127.0.0.1 - 211

73

五、庫存式生產案例



庫存式生產計劃流程

1. 因業務預估半年後CNC車床機會接到訂單，由於CNC機台使用的主軸組相關半成品生產加工時程較長，且它也適用不同CNC車床機型；為避免急單生產不及，經策略會議討論後決議將主軸組先行安排生產5台納入庫存備用。
2. 客戶-環球公司於本月5日向業務人員訂購「MECM4004- KX204 CNC車床」1台,要求5個月後當月20日出貨。
3. 生管單位針對此訂單執行批發需求計劃產生，以確定後續有足夠的庫存出貨。
4. 再次檢視生產及採購計畫，確認內容無需調整後進行鎖定及發放。
5. 當製造部生產完工後，由倉管單位依客戶訂單內容備出貨給客戶。
6. 業務單位須定期檢視銷售預測資料，針對已過期的預測資料作指定結案。
- 7.

74

*銷貨單建立作業(MEC105)(成功編輯)

資料(E) 功能(F) 離開(X)

詳細欄位 資料瀏覽

銷貨單別 230 內銷(核訂) 單據日期 2017/06/25 銷貨日期 2017/06/25 產生分錄-收入
 銷貨單號 20170625001 客戶代號 1001 環球公司 產生分錄-成本
 流程代號 不控管信用額度 拋轉狀態 N:未拋轉
 現銷 EBO拋轉狀態 不需拋轉


交易資料 送貨資料 發票資料 其他資料 前送/派車資料 車碼

部門代號 30 業務部門 幣別 NTD 台幣 審核狀態 N:不執行電子審核
 業務人員 303 匯率 1 確認者 DS
 出貨廠別 001 台北廠 保稅碼 0.依品號預設 系統管理者
 付款條件 2D1 結帳後一星期 備註
 交易條件 1 一般交易 件數 0 傳送次數 0
 列印 0 發票列印 0

序號	品號	品名	規格	庫別	庫別名稱	儲存位置	數量	類型	單價	訂單單別	訂單序號	贈/備品量
0001	MECM4004	KX204 CNC車床	1A	成品倉			11.贈品量		2,400,000.220	20161205003	0001	0

原幣銷貨金額 2,400,000 原幣銷貨稅額 120,000 原幣合計 2,520,000
 本幣銷貨金額 2,400,000 本幣銷貨稅額 120,000 本幣合計 2,520,000
 總數量 1

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECM4004 KX204 CNC車床 127.0.0.1 - 211 75

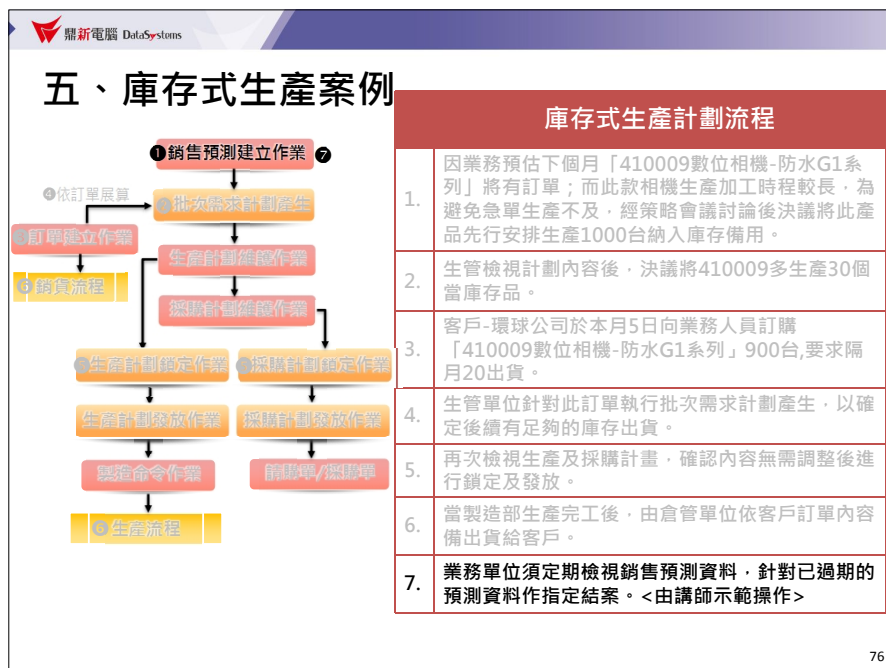

*銷售預測建立作業(MEC110)[成功機模]

資料(F) 功能(E) 離開(X)

詳細開位 資料清單

預測代號 M20161201

客戶代號

部門

業務員

☒ 納入生產計劃

備註

廠別 001 台北廠

通路

型態

地區

國家

路線

其他

序號	品號	品名	規格	日期	預測庫	庫別名稱	預測數量	已受訂量	單位	幣別	單價	預測金額	結束碼	優先順序	鎖定交期
0001	MECY1004	主軸組		2017/06/15	1B	半成品倉	5		1組	NTD	0	0	指定結束	00010	

瀏覽 單身資料筆數: 1 MECY1004 主軸組

127.0.0.1 - 211 77

常見問題Q&A



若一品號庫存單位與採購單位不同,則採購計劃以那個為主?



以品號基本資料的庫存單位為主。



執行批次需求計畫產生時,系統會依母製令之預計完工日往前推算子製令的開工日期嗎?




會,系統推算日期時,是從母製令之需求日往前推算其預計開、完工日,(推算時要記得扣掉檢驗天數),再往前推算子製令的預計開、完工日。

課程回顧

課
程

- 一、何謂庫存式生產
- 二、名解解釋
- 三、批次需求計畫邏輯說明
- 四、庫存式生產流程



79

2017鼎新職能進階管理報表系列課程

運用報表 掌握管理重點與時機

每堂課只需3.5小時，高效學習

透過報表提早進行因應對策、數據管理



▶ 課程費用：1500元 或 使用點數1點 (服務合約的經營管理加值課程點數)

▶ 報名方式：可至 <http://elearning.dsc.com.tw> 或【洽詢專線】02-8911-1688 分機2843 淑萍 分機1025 俐安

80
